

गण्डकी प्रदेश सरकार
ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय
पोखरा, नेपाल



आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रगति पुस्तिका



कार्तिक, २०८२

प्रकाशन: ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश

टेलिफोन नं.: ०६१-४५०७७१, ४५०८३२, ४५०८३३

सूचना अधिकारी: ९८५६०१७२०४

वेबसाइट: <http://moewrws.gandaki.gov.np>

इमेल: moewrws.gandaki@gmail.com

सर्वाधिकार: ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश

प्राक्थान

प्रदेशस्तरको ऊर्जा, विद्युत, सिंचाइ, खानेपानी, जल उत्पन्न प्रकोप (नदी तथा पहिरो) व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान, नीति कानून, मापदण्ड, गुरुयोजना, योजना तथा आयोजना निर्माण, कार्यान्वयन सञ्चालन, मर्मत संभार गरी प्रदेशभित्र जलस्रोत (ऊर्जा, सिंचाइ र खानेपानी) को समुचित व्यवस्थापन गर्नु यस मन्त्रालयको मुख्य कार्य जिम्मेवारी रहेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषदको पहिलो दिन (२०७४ फाल्गुण ४ गते) को निर्णय अनुसार प्रदेशका सबै घर बस्तीमा विद्युतको पहुँच पुर्याउनको लागि “उज्यालो गण्डकी प्रदेश” अभियान र सबै घरमा निजी धारा जडान गर्नका लागि “एक घर एक धारा” कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरी सोहि अनुसार विविध कार्यक्रमहरू निरन्तर रूपमा कार्यान्वयन भईरहेका छन्। खेति योग्य जमिनमा “बाह्र महिना सिंचाइ” सुविधा पुर्याउनको लागि सिंचाइ का सतह, भूमिगत र लिफ्ट तथा नवीनतम प्रविधिमा आधारित सिंचाइ आयोजनाहरू कार्यान्वयन गरिरहेको छ।

यस पुस्तिकामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यस मन्त्रालयको ऊर्जा, जलस्रोत, सिंचाइ तथा खानेपानी क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रदेश सरकारका आयोजना तथा नेपाल सरकारबाट सशर्त तथा विशेष अनुदानका रूपमा कार्यान्वयनका लागि प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका आयोजना र कार्यक्रमहरू, मन्त्रालय आफै र मातहतका कार्यालयहरूबाट कार्यान्वयन भएका विवरणहरू समावेश भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूबाट सञ्चालन भएका क्रियाकलापहरू, तिनको कार्यान्वयन अवस्था, प्रगति तथा उपलब्धिको अवस्था, २०७४ सालमा गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापना भए पश्चात् प्रादेशिक तहबाट हालसम्म भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा हासिल भएका विषय-क्षेत्रगत कुल उपलब्धिको झलक सहित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा देखिएका समस्या र चुनौतीहरू तथा तिनको निराकरणका लागि गरिएको प्रयास लगायतका विषयमा आम नागरिक र सरोकारवालाहरूलाई सुसूचित गर्न तथा वार्षिक प्रगतिको अभिलेखीकरण समेत गर्नको लागि प्रस्तुत वार्षिक प्रगति पुस्तिका प्रकाशन गरिएको छ।

विषयसूची

१. परिचय	६
१.१ मन्त्रालयको पृष्ठभूमि र कार्यक्षेत्र	६
१.२ मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारी	७
२. विद्यमान अवस्था	११
२.१ ऊर्जा	११
२.२ सिंचाइ तथा नदी व्यवस्थापन	१३
२.३ खानेपानी तथा सरसफाइ	१५
३. बजेट विनियोजन र खर्चको विवरण	१८
३.१ आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा मन्त्रालयको स्रोतगत बजेट विनियोजन र खर्चको विवरण	१८
३.२ बजेटको लक्ष्य र खर्चको वार्षिक प्रवृत्ति तुलनात्मक विवरण:	१९
३.३ आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को त्रैमासिक रूपमा कुल खर्चको प्रवृत्ति:	२०
३.४ आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को बजेट उपशीर्षकगत वित्तीय प्रगति:	२२
३.५ आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को कार्यालयगत/क्षेत्रगत/स्रोतगत वित्तीय प्रगति:	२३
३.६ यस मन्त्रालयको आ.व. २०८१/८२ मा प्राप्त विनियोजित बजेट र खर्चको स्रोतगत रूपमा कुल खर्चको प्रगति विवरण तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।	२४
४. आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक कार्यक्रमको प्रगति विवरण	२७
४.१ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयनबाट हासिल भएका मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू:	२७
४.२ बजेट वक्तव्यमा समावेश भएका कार्यक्रमको प्रगति विवरण	२८
४.३ आ.व. २०८१/८२ सम्मको लिफ्टिङ खानेपानी र सिंचाइ आयोजनाहरूमा विद्युत महशुल भुक्तानी अनुदान (रु. हजारमा)	३०
४.४ आ.व. २०८१/८२ मा कार्यान्वयन भएका योजनाबाट सिर्जना भएको रोजगारी व्यक्तिदिन	३०
४.५ दोस्रो पञ्च वर्षीय योजना लक्ष्य र उपलब्धी	३१
४.६ दिगो विकास लक्ष्य र उपलब्धी	३२
५. राजस्व संकलन र बेरुजुको विवरण	३३
५.१ राजस्व संकलनको विवरण (रकम रु. हजारमा)	३३
५.२ बेरुजुको संक्षिप्त विवरण (रु.) :-	३३

६. बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका मुख्य समस्या, चुनौती तथा समाधानका उपायहरू	३४
६.१ मुख्य समस्या र समाधानका लागि मन्त्रालयले गरेका प्रयासहरू	३४
६.२ बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा देखिएका अन्य समस्या तथा चुनौतीहरू ..	३५
६.३ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ऐन/नियम तर्जुमाको विवरण	३८
७. आ.व. २०८१/८२ मा यस मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूबाट गरिएका कार्यक्रमका प्रतिनिधिमुलक जलकहरू:	३९
८. अनुसूचीहरू	५८
८.१ घरेलू सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान	५८
८.२ संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान	५८
८.३ लघु जलविद्युत मर्मत गरिएका आयोजनाहरू.....	६०
८.४ प्रदेश सरकारबाट सिंचाइ क्षेत्रमा आ.व. २०७५/७६ देखि २०८१/८२ सम्म भएको जिल्लागत उपलब्धी विवरण	६१
८.५ प्रदेश सरकारबाट नदी व्यवस्थापन क्षेत्रमा आ.व. २०७५/७६ देखि २०८१/८२ सम्म भएको जिल्लागत उपलब्धी विवरण	६३
९. बहुवर्षीय खरिदको स्रोत सुनिश्चिता /स्रोत सहमति लिइएका आयोजनाहरूको अध्यावधिक विवरण	६५
क. खानेपानी क्षेत्र (रु. हजारमा)	६५
ख. सिंचाइ क्षेत्र (रु. हजारमा).....	८१
१०. सन्दर्भ सामग्री	९९

१. परिचय

१.१ मन्त्रालयको पृष्ठभूमि र कार्यक्षेत्र

गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७४/११/०४ को निर्णयानुसार प्रदेश सरकार, प्रदेश नं. ४ (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ स्वीकृत गरि ऊर्जा, सिंचाइ , नदी नियन्त्रण र खानेपानी तथा सरसफाई कार्य क्षेत्र समेत हेर्ने गरि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको स्थापना भएको थियो। गण्डकी प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८/०२/०५ को निर्णयानुसार गण्डकी प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को अनुसूचीमा हेरफेर भै ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको स्थापना भएको हो। तत्पश्चात गण्डकी प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७९/१०/०९ को निर्णयानुसार गण्डकी प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को अनुसूचीमा हेरफेर भै कृषि, ऊर्जा, सिंचाइ र खानेपानी क्षेत्र एक आपसमा गाभेर कृषि, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयको स्थापना भएको थियो। गण्डकी प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०/०१/२८ को निर्णयानुसार गण्डकी प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को अनुसूचीमा हेरफेर भै साविक बमोजिम नै मन्त्रालय छुट्टयाई पुनः ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको स्थापना भएको थियो।

प्रदेशस्तरको ऊर्जा, विद्युत, सिंचाइ , खानेपानी, जल उत्पन्न प्रकोप (नदी तथा पहिरो) व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान, नीति कानून, मापदण्ड, गुरुयोजना, योजना तथा आयोजना निर्माण, कार्यान्वयन सञ्चालन, मर्मत संभार गरी प्रदेशभित्र जलस्रोत (ऊर्जा, सिंचाइ र खानेपानी) को समुचित व्यवस्थापन गर्नु यस मन्त्रालयको मुख्य कार्य जिम्मेवारी रहेको छ।

आ.व. २०८१/८२ मा गण्डकी प्रदेशका ११ वटा जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको यस मन्त्रालय अन्तर्गत निम्नानुसारका १६ वटा कार्यालयहरू रहेका थिए:

क्र.सं.	कार्यालय	कार्यक्षेत्र	मुख्य कार्यहरू
१	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, स्याङ्जा	कास्की, स्याङ्जा	खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता
२	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, बागलुङ	बागलुङ, पर्वत	खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता
३	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, तनहुँ	तनहुँ, नवलपुर	खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता
४	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, गोरखा	गोरखा, लमजुङ	खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता
५	जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, बागलुङ	बागलुङ	ऊर्जा, सिंचाइ तथा नदी व्यवस्थापन
६	जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन	पर्वत	ऊर्जा, सिंचाइ तथा नदी व्यवस्थापन

क्र.सं.	कार्यालय	कार्यक्षेत्र	मुख्य कार्यहरू
	कार्यालय, पर्वत		
७	जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, कास्की	कास्की	ऊर्जा, सिंचाइ तथा नदी व्यवस्थापन
८	जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, तनहुँ	तनहुँ	ऊर्जा, सिंचाइ तथा नदी व्यवस्थापन
९	जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, स्याङ्गजा	स्याङ्गजा	ऊर्जा, सिंचाइ तथा नदी व्यवस्थापन
१०	जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, लमजुङ	लमजुङ	ऊर्जा, सिंचाइ तथा नदी व्यवस्थापन
११	जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, गोरखा	गोरखा	ऊर्जा, सिंचाइ तथा नदी व्यवस्थापन
१२	जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, नवलपुर	नवलपरासी (ब.सु.पू.)	ऊर्जा, सिंचाइ तथा नदी व्यवस्थापन
१३	भूमिगत जलश्रोत तथा सिंचाई कार्यालय, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)	गण्डकी प्रदेशभर	भूमिगत सिंचाइ
१४	खानेपानी, जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, म्याग्दी	म्याग्दी	ऊर्जा, सिंचाइ, नदी व्यवस्थापन, खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता
१५	खानेपानी, जलश्रोत तथा सिंचाई विकास सब डिभिजन कार्यालय, मुस्ताङ्ग	मुस्ताङ्ग	ऊर्जा, सिंचाइ, नदी व्यवस्थापन, खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता
१६	खानेपानी, जलश्रोत तथा सिंचाई विकास सब डिभिजन कार्यालय, मनाङ्ग	मनाङ्ग	ऊर्जा, सिंचाइ, नदी व्यवस्थापन, खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता

१.२ मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारी

गण्डकी प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ अनुसार यस मन्त्रालयको लागि तोकिएको कार्य जिम्मेवारी निम्न अनुसार रहेका छन्:-

१. प्रदेशस्तरको ऊर्जा विद्युत, सिंचाइ, खानेपानी, जल उत्पन्न प्रकोप (नदी तथा पहिरो) व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान, नीति कानून, मापदण्ड गुरुयोजना योजना तथा आयोजना निर्माण, कार्यान्वयन सञ्चालन, मर्मत संभार समन्वय र नियमन
२. प्रदेशस्तरमा ऊर्जा, विद्युत, सिंचाइ तथा खानेपानी सम्बन्धी सेवाको गुणस्तर र सेवा शुल्कको आधार निर्धारण र नियमन
३. ऊर्जा, विद्युत सिंचाइ सेवा विस्तारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र लगानी प्रवर्द्धन सम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड निर्धारण र नियमन

४. राष्ट्रिय जलश्रोत नीति र संघीय योजना वमोजिम प्रदेशका नदी तथा सीमा नदीका जलउपयोग सम्बन्धी आयोजनाको पहिचान, निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन
५. प्रदेशभित्रको जलश्रोत उपयोग तथा नदी संरक्षण सम्बन्धी योजना तथा गुरुयोजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मुल्याङ्कन
६. प्रदेशभित्रको जलश्रोत उपयोग हुने आयोजनाहरूको अध्ययन, सर्वेक्षण, तयारी, कार्यान्वयन, अनुगमन र सञ्चालनमा समन्वय
७. प्रदेशस्तरमा जलाधार संरक्षण तथा जलउपयोग नीतिको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, प्रविधि विकास र व्यवस्थापन
८. मौसम र जलमापन सञ्चार सञ्जाल व्यवस्थापन
९. जलगुण तथा वायुगुण सम्बन्धी प्रयोगशाला व्यवस्थापन
१०. प्रदेशस्तरको खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धी प्रदेशिक नीति कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा र कार्यान्वयन, सेवाको शुल्क निर्धारण, योजना, आयोजना कार्यान्वयन तथा सञ्चालन, संभार र नियमन
११. खानेपानी तथा सरसफाई सेवा विस्तारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड तर्जुमा कार्यान्वयन र नियमन
१२. सर्वसाधारणलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्धता र खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छतामा पिछडिएको वर्गको पहुँच सुनिश्चितता
१३. खानेपानी गुणस्तर अनुगमन तथा लेखाजोखाको ढाँचा निर्माण एवं गुणस्तरको मापदण्ड निर्धारण र कार्यान्वयन


मन्त्रालयको सँगठन स्वरूप र दरबन्दी तेरिजः



प्रमुख सचिव

अनुसूची २.३

ऊर्जा, जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय

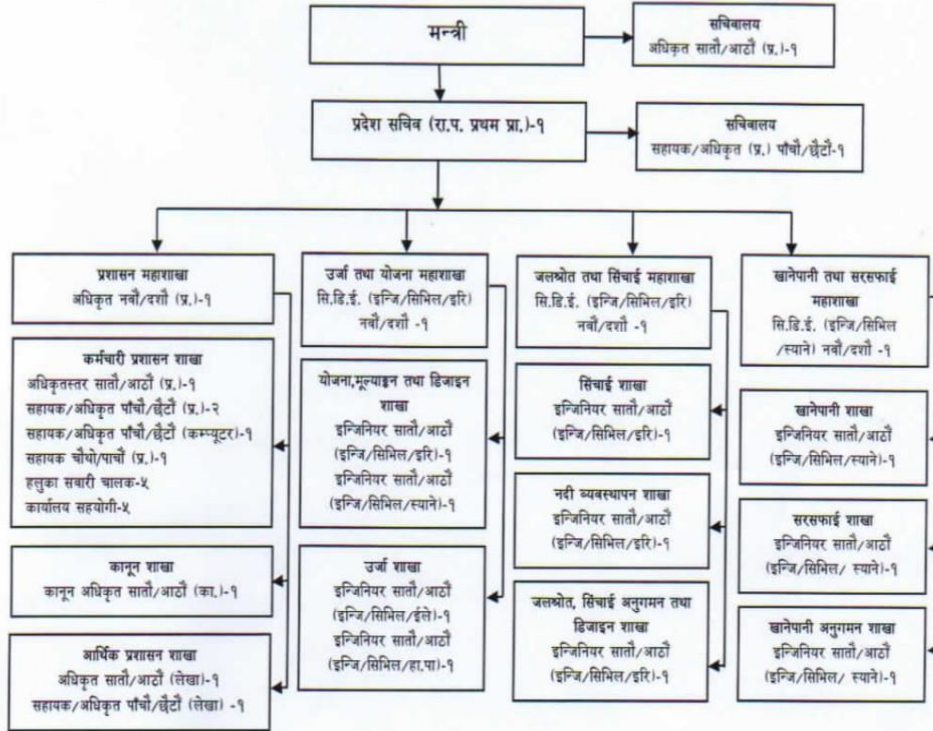

मन्त्रालयको दरबन्दी तेरिजः

क्र.स.	पद	सेवा	समूह	उप समूह	श्रेणी/तह	प्रस्तावित दरबन्दी	कैफियत
१	सचिव	इन्जिनियरिङ्ग			रा.प.प्र. प्रा.	१	
२	उप-सचिव	प्रशासन	सामान्य प्रशासन		नवौं/दशौं	१	
३	सि.डि.ई.	इन्जिनियरिङ्ग	सिभिल	इरिगेशन	नवौं/दशौं	२	
४	सि.डि.ई.	इन्जिनियरिङ्ग	सिभिल	स्यानिटरी	नवौं/दशौं	१	
५	अधिकृत	प्रशासन	प्रशासन		सातौं/आठौं	२	
६	लेखा अधिकृत	प्रशासन (लेखा)	प्रशासन (लेखा)		सातौं/आठौं	१	
७	कानून अधिकृत	न्याय	कानून		सातौं/आठौं	१	
८	इन्जिनियर	इन्जिनियरिङ्ग	सिभिल	इरिगेशन	सातौं/आठौं	४	
९	इन्जिनियर	इन्जिनियरिङ्ग	सिभिल	स्यानिटरी	सातौं/आठौं	४	
१०	इन्जिनियर	इन्जिनियरिङ्ग	सिभिल	इलेक्ट्रिकल	सातौं/आठौं	१	
११	इन्जिनियर	इन्जिनियरिङ्ग	सिभिल	हाइड्रोपावर	सातौं/आठौं	१	
१२	सहायक/अधिकृत	प्रशासन	सामान्य प्रशासन	-	पाँचौं/छैटौं	३	
१३	सहायक/अधिकृत	प्रशासन	लेखा	-	पाँचौं/छैटौं	१	
१४	कम्प्युटर अपरेटर/अधिकृत	विविध	विविध		पाँचौं/छैटौं	१	
१५	सहायक	प्रशासन	सामान्य प्रशासन		चौथो/पाचौं	१	
१६	ह.स.चा.			-	श्रेणीविहिन	५	
१७	का.स.	प्रशासन	सामान्य प्रशासन	-	श्रेणीविहिन	५	
	जम्मा					३५	

२. विद्यमान अवस्था

२.१ ऊर्जा

प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको उज्यालो गण्डकी प्रदेश अभियान सम्पन्न गर्नका लागि तीनवटा नीतिगत व्यवस्थाका आधारमा ऊर्जा सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू संचालित छन्।

१. दुई वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रसारण लाईन पुर्‍याउन सकिने तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नियमित कार्यक्रमले समेट्न नसकेका सबै स्थानमा गण्डकी प्रदेश सरकारको थप लगानीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मार्फत् कार्यान्वयन हुने गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाईन विस्तार गर्ने;
२. दुई वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रसारण पुर्‍याउन नसकिने दुर्गम स्थानमा साविकका लघु जलविद्युत् आयोजनाको मर्मत-सम्भार गरी विद्युत नियमित गर्ने,
३. तत्काल विद्युत् सुविधाको पहुँचमा ल्याउन नसकिने देखिएका मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी, बागलुङ र गोरखा जिल्लाका अति दुर्गम भेगमा रहेका करिब १६०० घरधुरीमा सहूलियतपूर्ण अनुदानमा घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान गर्ने।

यस प्रदेशमा हाल राष्ट्रिय स्तरमा संचालित संघीय सरकार र निजी क्षेत्रका गरी ५८ वटा जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन्। प्रदेश भित्र रहेका जलविद्युत आयोजनाबाट कूल ९९८.०८२ मेगावाट विद्युत उत्पादन भैरहेको छ। (स्रोत: विद्युत विकास विभाग)। प्रदेशमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन, लघु जलविद्युत र घरेलु सौर्य ऊर्जाबाट कुल ९९.८० प्रतिशत घरधुरीमा बत्ती बाल्नको लागि विद्युतको पहुँच पुगेको छ।

आ.व. २०७५/७६ देखि २०७८/७९ सम्म सञ्चालित स्थानीय तहको साझेदारीमा जीर्ण काठेपोलहरू प्रतिस्थापन कार्यक्रमबाट प्रदेश सरकारको लगानीमा ३०,४८१ वटा स्टील ट्युबुलर पोलले प्रतिस्थापन गरिएको छ। हालसम्ममा ९४ वटा लघु जलविद्युत आयोजनाहरूको मर्मत सम्भार गरि ३,५०६ किलोवाट विद्युत नियमित गरिएको छ। दुईवटा लघु जलविद्युत आयोजना (पुतपुते खोला दोस्रो लघु जलविद्युत् आयोजना, स्याङ्जा- ९८ किलोवाट र युम्ले खोला लघु जलविद्युत् आयोजना, मनाङ्ग- ६० किलोवाट) लाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान गरिएको छ। संस्थागत सौर्य प्रणालीबाट विभिन्न सरकारी कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सामुदायिक विद्यालय तथा अध्ययन संस्थामा गरि हालसम्म २३७ किलोवाटपिक सोलार जडान गरिएको छ भने, गोरखा जिल्लाको पालुङटार न. पा.-५, गोरखा न.पा.-१०, छेवेटार, नवलपरासी ब.शु.पू., देवचुली-०१ र देवचुली न.पा. १४ मा गरि २६९ थान स्मार्ट सडकबत्ती जडान गरिएको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको लगानीमा आ.व. २०७६/७७ देखि नेपाल विद्युत प्राधिकरण, गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय, पोखराबाट कार्यान्वयन भैरहेको विद्युत विस्तार कार्यको हालसम्म उपलब्धि विवरणः

जिल्ला	H.T. लाइन विस्तार कि.मि.	L.T. लाइन विस्तार कि.मि.	Transformer जडान संख्या	लाभान्वित घरधुरी संख्या
गोरखा	५२.३	४५.८	८	५१६
नवलपुर	१४०.०	२१३.८	१४	१९९५
लम्जुङ्ग	१३.०६	१६	३	७८६
कास्की	०	०.३५	०	१
बागलुङ्ग	२४.२३	८०.९	२३	१६९१
म्याग्दी	९३	१६१	९	७६६
मुस्ताङ्ग	२३	९.१	९	२८७
मनाङ्ग	५.१७	०	२	४५०
जम्मा	३५०.७६	५२६.९५	६८.००	६४९२

ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरूबाट आ.व. २०७५/७६ देखि हालसम्म सम्पन्न भएका ऊर्जा सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमको जिल्लागत उपलब्धिहरूः

जिल्ला	घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान		संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान		लघु जलविद्युत मर्मत		काठेपोल प्रतिस्थापन	सौर्य सडक बत्ती	स्मार्ट सडक बत्ती	लघु जलविद्युत ग्रिड कनेक्शन		विद्युतीय चुल्हो
	संख्या	किलोवाट (kw)	संख्या	किलोवाट (kw)	संख्या	किलोवाट (kw)	स्टिल पोल् (वटा)	वटा	थान	वटा	कि.वा.	वटा
गोरखा	४६०	२३	३	१५	५	१४५	७२२०	६	१९५	०	०	५३
नवलपुर	०	०	१	२	२	१४	२००	०	७४	०	०	०
लम्जुङ्ग	०	०	०	०	१३	२१५	३५०४	०	०	०	०	०
तनहुँ	०	०	०	०	०	०	३६००	०	०	०	०	०
स्याङ्गजा	०	०	१	१५	२	८६	५४८७	१८	०	१	९८	०
कास्की	०	०	६	१४१	०	०	९००	२	०	०	०	०
बागलुङ्ग	३८४	१९२	०	०	५५	२५६८	३०२५	०	०	०	०	०
पर्वत	०	०	०	०	२	४२	४२२७	०	०	०	०	०
म्याग्दी	२२०	११	०	०	२	६४	१८३३	०	०	०	०	०
मुस्ताङ्ग	४१५	२१	२	३६	७	१७५	२४५	०	०	०	०	०
मनाङ्ग	१२५	६	२	२८	६	१९७	२५०	०	०	१	६०	०
जम्मा	१६०४	२५३	१५	२३७	९४	३५०६	३०४८१	२६	२६९	२	१५८	५३

२.२ सिंचाइ तथा नदी व्यवस्थापन

जलस्रोतको दिगो उपयोग गर्दै कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न एवम् सिंचाइ प्रणालीको निर्माण तथा जल नदी तथा उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सिंचाइ ऐन तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा रहेको छ। सिंचाइ गुरुयोजना, २०१९ अनुसार गण्डकी प्रदेशको खेति योग्य जमिन, सिंचाइ योग्य जमिन तथा सिंचित क्षेत्रफल निम्न रहेको छ।

क्र.सं.	विवरण	इकाई	परिमाण	कैफियत
१	खेति योग्य जमिन	हेक्टर	३,५१,५९७	
२	सिंचाइ योग्य जमिन	हेक्टर	२,७२,६३०	खेति योग्य जमिनको जम्मा ७७.५४ प्रतिशत
३	सिंचाइ योग्य जमिन मध्ये सतह सिंचाइ को सम्भावना रहेको २५ डिग्रीसम्म भिरालो जमिन	हेक्टर	७४,१९४	
४	२५ डिग्री देखि ६० डिग्रीसम्म भिरालो रहेको जमिन	हेक्टर	१,६०,७९१	
५	पम्प सिंचाइ को सम्भावना रहेको जमिन	हेक्टर	३७,६४५	

आ.व. २०८१/८२ मा विस्तार भएको जम्मा ८१७ हेक्टर समेत गरी प्रदेश सरकारबाट हालसम्म आधुनिक सिंचाइ को पूर्वाधार विस्तार भएको जमिन ७,६५२ हेक्टर पुगेको छ।

नमूना कृषि गणना, २०७८ ले दिएको तथ्यांक अनुसार प्रदेशभित्र बाह्रै महिना सिंचाइ हुने जमिन ३१,८४१ (११.६७ %) हेक्टर रहेको छ र त्यस पछि २,०४३ हेक्टर थप भई हालसम्म ३३,८८४ हेक्टर पुगेको छ। जसमध्ये प्रायजसो सतह सिंचाइमा आधारित परम्परागत कृषक कुलोको स्तरोन्नति तथा भूमिगत, लिफ्ट र नवीनतम प्रविधिमा आधारित नयाँ सिंचाइ आयोजनाहरू रहेका छन्। बाढी, नदी कटान, डुबान र पहिरोबाट जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका बस्ती, खेतीयोग्य जमिन, भौतिक संरचना, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणको लागि तटबन्ध निर्माण, नदी तथा पहिरो व्यावस्थापन कार्यहरू सञ्चालन भैरहेको छ। प्रदेश सरकारको पहलमा यस प्रदेशमा आ.व. २०८१/८२ मा थप भएको जम्मा १४.२२ कि.मि. समेत गरी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०८१/८२ सम्ममा कुल १३७.९७ किलोमिटर तटबन्धन निर्माण र ३४०३.७५ हेक्टर क्षेत्रमा जग्गा उकासको कार्य भएको छ।

**प्रदेशको कूल क्षेत्रफल सिंचाइ योग्य जमिन र आधुनिक सिंचाइ पूर्वाधार पुगेको जिल्लागत विवरण
(हेक्टरमा)**

नमूना कृषि गणना २०७८ को नतिजा								
जिल्ला	खेती भईरहेको क्षेत्रफल	सतह र जलाशय	पम्पिंग	ट्यूबेल	अन्य	मिश्रित	जम्मा	बाह्रै महिना सिंचित
गोरखा	२६,०९४.४	३,८९४.६७	१,१८२.६	५५.८	१,८३६.४	१६३.६	७,१३३.१	३,४५५.७
मनाङ	४८८.८	८१.३८	९.१	-	०.३	०.०	९०.९	७१.५
मुस्ताङ	१,१८२.५	७२९.०४	१३९.९	-	१६.६	-	८८५.५	८३८.६
म्याग्दी	८,९५३.३	१,८२२.८२	११३.६	-	३००.०	१७.०	२,२५३.३	१,१३२.१
कास्की	१९,१६३.८	६,३३२.१९	४५७.०	१७.१	३,११०.३	३९९.८	१०,३१६.४	४,३१२.८
लमजुङ	११,०८३.२	४,०५८.९४	४४३.०	१४.८	८९३.८	११२.९	५,५२३.५	२,८८०.०
तनहुँ	२६,०९९.६	६,६००.४५	२९३.४	३५.६	४७१.६	२९१.६	७,६९२.७	३,६२९.३
नवलपुर	२१,०८९.६	७,९०९.९४	१,८४३.६	२,४२४.५	१,०८७.७	४६५.१	१३,७३०.८	७,३९५.९
स्याङ्जा	२४,४५६.६	५,२३४.३८	५९४.३	६८.६	७४६.८	७२.९	६,७१७.०	३,८९८.५
पर्वत	९,५५१.८	३,५८८.५१	३२५.५	७५.७	४८३.४	७५.७	४,५४८.८	१,९८१.९
बागलुङ	२५,६०९.२	२,६८४.६७	५७३.२	८.३	२२२.९	२०.१	३,५०९.२	२,२४५.२
जम्मा	१७३,७७२.९७	४२,९३६.९९	५,९७५.२	२,७००.४	९,१६९.९	१,६१८.७	६२,४०१.२	३१,८४१.५

कुल क्षेत्रफल, खेति योग्य जमिन र प्रदेश सरकारबाट भएको सिंचाइ पूर्वाधार विस्तार विवरण:

क्र.सं.	जिल्ला	कूल क्षेत्रफल (हेक्टर)	खेति योग्य जमीन (हेक्टर)	प्रदेश सरकारबाट आधुनिक सिंचाइ पूर्वाधार विस्तार भएको क्षेत्रफल (हेक्टर)	कैफियत
१	मनाङ	३२,०६१.००	२,१५३.००	५९९.००	
२	मुस्ताङ	३५६,३२१.००	३,६४०.००	५५०.००	
३	म्याग्दी	२२८,४७८.००	३०,८५६.००	२०४.००	
४	बागलुङ	१८३,५७४.००	४६,१४८.००	३४४.००	
५	पर्वत	५४,१५५.००	२८,५९२.००	४४९.००	
६	कास्की	२०८,४३८.००	६८,९६७.००	२२६.००	
७	स्याङ्जा	१०३,७४८.००	७२,७३१.००	२०३.००	
८	नवलपुर	१४२,५८२.००	५१,९१५.००	१,४९२.२५	
९	तनहुँ	१५७,१८४.००	६५,०६१.००	३३४.७५	
१०	लमजुङ	१६६,२४०.००	६१,८१९.००	३१७.००	
११	गोरखा	३६४,५८७.००	५५,६९६.००	७१८.००	
१२	भूमिगत			२,२१५.००	

	जम्मा	२,१९७,३६८.००	४८७,५७८.००	७,६५२.००	
--	-------	--------------	------------	----------	--

२.३ खानेपानी तथा सरसफाइ

प्रदेशभर स्वच्छ खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउन र ढल तथा फोहोरपानीको व्यवस्थापन गरी वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्न एवम् सोको प्रभावकारी निगरानी गर्न प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाई ऐन, तत्सम्बन्धी नियमावली, कार्यविधि तथा मापदण्ड जारी भई कार्यान्वयनमा रहेका छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा संचालित राष्ट्रिय खानेपानी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (NWASH-MIS) को तथ्यांक बमोजिम प्रदेशमा खानेपानी सुविधा उपलब्ध जनसंख्या ९२.९० प्रतिशत रहेको देखिन्छ। प्रदेश सरकारबाट आ.व. २०८१/८२ मा थप १५,२४५ निजी धारा जडान सहित हालसम्म प्रदेश सरकार आफैले जडान भएका निजी धारा संख्या १,६३,४७० रहेको छ। यस बाहेक स्थानीय पालिका र संघीय सरकारबाट समेत निजी धारा जडानका कार्यहरू भईरहेका छन्। यसैगरि, सुधारिएको सरसफाई सुविधा उपलब्ध घरधुरी संख्या आ.व. २०८१/८२ सम्ममा ९० प्रतिशत र कुनै न कुनै प्रकारको शौचालय प्रयोग गर्ने घरधुरी संख्या ९९ प्रतिशत पुगेको अनुमान छ।

खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको एकीकृत र अध्यावधिक तथ्यांक

- यस प्रदेशको विद्यमान खानेपानी सुविधाको अवस्था र यसको क्षेत्रगत तथ्याङ्कको विषयमा सार्वजनिक चासो र सरोकार रहदै आएको छ। खानेपानी क्षेत्र संविधानको अनुसूचि बमोजिम तीनै तहको कार्यक्षेत्रमा पर्ने साझा अधिकारको विषय भएको र यस क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै वटै सरकारले आआफ्नै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आइरहेका छन्। तसर्थ, गण्डकी प्रदेश भित्र तीनै तहका सरकारका उपलब्धीलाई समावेश गरेर एउटा एकीकृत तथ्याङ्क आवश्यक पर्ने देखिएको हुनाले गण्डकी प्रदेश सरकारले संघ सरकारबाट संचालनमा ल्याएको राष्ट्रिय खानेपानी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (NWASH-MIS) मा तीनै तहका सरकारको समन्वय, सहकार्य र साझेदारीमा तथ्याङ्क व्यवस्थापनको कार्य गरिरहेको छ। स्थानीय तहहरू मार्फत तथ्याङ्क संकलन गरेर वास प्लान तयारीको कार्य गण्डकीकै मैलिक मोडेलमा भैरहेको छ। यसको उद्देश्य संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा आयोजनाको स्थलगत अवस्था र आवश्यकता पत्ता लगाउने, जरूरी आयोजनाको पहिचान गरी प्रारम्भिक लागत अनुमान तयार गर्ने, कार्यान्वयनको प्राथमिकता निर्धारण स्थानीय कार्यपालिकाको बैठकबाट गर्ने र तहगत लागत साझेदारीमा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य रहेको छ।
- आ.व. २०८१/८२ मा प्रदेशका ३,६२४ वटा खानेपानी प्रणालीको विवरण योजना-योजनाका प्रत्येक संरचना तथा १३,२३,०८२ जनसङ्ख्याको विवरण घर-घरमा गएर संकलन गरी त्यसलाई भू-सूचना सहितको नक्सा लगायतका विवरण डिजिटल प्रणालीमा प्रविष्ट भैसकेको छ भने बाँकी कार्य आ.व. २०८२/८३ को अन्त्यसम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी स्थानीयस्तरमा संकलन कार्य भैरहेको छ।

- रास्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार प्रदेशको जम्मा घरधुरी संख्या ६,६२,४८० र जनसंख्या २४,६६,४२७ रहेको छ ।
- NWASH-MIS मा सूचीकृत आ.व. २०८१/८२ को अन्त्यसम्मको यस प्रणालीमा आवद् घरधुरी र जनसंख्या सहितको एकीकृत र अध्यावधिक विवरण:
 - जनसंख्या : १३,२३,०८२ जना (५३.६४ %)
 - घरधुरी संख्या : २,६२,५०५ वटा (३९.६२ %)
 - खानेपानी प्रणाली : ३६२४ वटा
 - पालिका संख्या: ७८ वटा
 - विद्यालय संख्या; २८९७ वटा
 - निजी धारा संख्या; २,१५,२२२ गोटा
- पालिकागत विवरण
 - जम्मा पालिका संख्या : ८५ वटा
 - तथ्यांक संकलनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरि तिनै तहबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएका पालिका संख्या : ४३+३८ = ८१ वटा
 - तथ्यांक संकलन सम्पन्न भएका पालिका संख्या : ३० वटा
 - तथ्यांक संकलन भईरहेका पालिका संख्या : ४९ वटा
 - अन्य विकास साझेदारबाट तथ्यांक संकलन भएका/हुँदै गरेका पालिका संख्या : ४ वटा
 - यस प्रणालीमा आवद् हुन बाँकी रहेका पालिका संख्या : २ वटा
- भावी खानेपानी आयोजनाको प्राथमिकता क्रम निर्धारण
 - प्राथमिकता तोक्ने कार्य सम्पन्न गरेका : १७ वटा पालिका
 - प्राथमिकता तोक्ने कार्य भईरहेका : २९ वटा पालिका
 - प्राथमिकता तोक्न बाँकी पालिका : १७ वटा पालिका
 - प्राथमिकता सम्बन्धी कार्य सुरु नभएका पालिका : २२ वटा
- वास प्लान तयारी सम्बन्धी विवरण
 - वास प्लान तयार भैसकेका पालिका : १७ वटा
 - वास प्लान तयारीको चरणमा रहेका पालिका : १७ वटा
- हाल संचालित खानेपानी प्रणालीहरूको सेवा स्थिति सम्बन्धी अध्यावधिक (Real Time) विवरण :
 - पर्याप्त रूपमा धारामा पानी आउने खानेपानी प्रणाली : ४१.६ % मात्र
 - पिउने पानी र भान्छाको लागि धारामा पर्याप्त पानी भएका प्रणाली : ३६.७ %
 - पिउनको लागि मात्र धारामा पानी पर्याप्त भएका प्रणाली : १४.५ %
 - धारामा पानी आउने तर पिउनको लागि पनि पर्याप्त नभएका प्रणाली : ४.७ %
 - धारामा कति पनि पानी नआउने खानेपानी प्रणाली : २.३ %

- तथ्यांक प्राप्त नभएको खानेपानी प्रणाली : ०.२० %
- जम्मा : १०० %
- यस कार्यक्रमका सम्बन्धमा, मिति २०८१/११/२१ गते प्रदेश सभाका सबै माननीय ज्यूहरुलाई एक दिनको अभिमुखिकरण कार्यशाला गोष्ठी समेत सञ्चालन गरि जानकारी गरिएको थियो।

गण्डकी प्रदेश सरकारबाट आ.व. २०८१/८२ सम्ममा जडान भएका निजी धारा जडान सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	जिल्ला/आ.व.	२०७५/०७६	२०७६/७७	२०७७/७८	२०७८/७९	२०७९/८०	२०८०/८१	२०८१/८२	जम्मा
१	गोरखा	२८७९	९१२१	१००१५	३७०३	४७३६	२७६१	१६५८	३४८७३
२	लमजुङ	२०२	१४३९	२९४५	१२७८५	१२०२	५४७	६७८	१९७९८
३	मनाङ	०	२६०	२४२	३८९	९६	१५४	६०	१२०१
४	बाग्लुङ	८३२	१९०९	४९१७	४२०१	१२९४	१६८८	२१८६	१७०२७
५	पर्वत	४६५१	१७३९	४५६८	३२९९	५५८	१४८९	१८९२	१८१९६
६	म्याग्दि	८७६	४३०	२४८४	१८४०	१३६	७२७	१२८३	७७७६
७	मुस्ताङ	२३२	१०८	३८२	१०७३		१२५	३८	१९५८
८	स्याङ्गजा	३०७०	२४६०	२२३०	२७०	४६०७	२३१७	१५८६	१६५४०
९	कास्की	१३५६	१७९२	२१६५	४१२९	२०९७	२००४	१६७५	१५२१८
१०	तनहुँ	१९०४	२३५४	४३१७	२२९७	२१२८	२०००	२५५७	१७५५७
११	नवलपुर	१०७५	१०६२	३७१३	२८८५	२०१७	९४२	१६३२	१३३२६
	जम्मा	१७०७७	२२६७४	३७९७८	३६८७१	१८८७१	१४७५४	१५२४५	१६३४७०

३. बजेट विनियोजन र खर्चको विवरण

३.१ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मन्त्रालयको स्रोतगत बजेट विनियोजन र खर्चको विवरण

यस मन्त्रालयलाई आ.व. २०८१/८२ मा कुल रु. ४ अर्ब ३० करोड १४ लाख ८९ हजार (संशोधन सहित) को बजेट विनियोजन भएको थियो। चालु तर्फ रु. ३४ करोड ७६ लाख ८९ हजार प्राप्त भएकोमा त्यसको ७५.७२% हुन आउने रु. २६ करोड ३२ लाख ७१ हजार खर्च भएको छ। त्यसैगरी, पुँजीगत तर्फ रु. ३ अर्ब ९५ करोड ३४ लाख प्राप्त भएकोमा त्यसको ९१.१७ % हुन आउने रु. ३ अर्ब ६० करोड ४८ लाख ४० हजार खर्च भएको छ। जसमध्ये प्रदेश सरकारको ३ अरब २८ करोड ६१ लाख, संघ सशर्त अनुदान २४ करोड ८२ लाख र संघ विशेष अनुदान तर्फ ४१ करोड ९५ लाख बजेट प्राप्त भएको थियो। चालु र पुँजीगत गरि कूल विनियोजनको ८९.९०% वित्तीय प्रगति हासिल भई रु. ३ अरब ८६ करोड ८१ लाख १२ हजार खर्च भएको छ, जुन प्रदेश मन्त्रालयगत खर्च प्रतिशतमा सबैभन्दा बढी रहेको देखिन्छ। आ.व. २०८१/८२ मा यस मन्त्रालयलाई प्राप्त बजेट र खर्चको विस्तृत विवरण तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।

(रु.हजारमा)

विवरण	चालु तर्फ				पुँजीगत तर्फ					कुल जम्मा
	प्रदेश सरकार	विशेष अनुदान	संघ सशर्त अनुदान	जम्मा	प्रदेश सरकार	संघ सशर्त अनुदान	संघ विशेष अनुदान	संघ समपूरक अनुदान	जम्मा	
सुरु विनियोजन	३४७६८९.००	-	-	३४७६८९.००	२९९००००.००	२४८२००.००	४३९५००.००	-	३६७७७००.००	४०२५३८९.००
थप(+) घट(-)	-	-	-	-	२९६१००.००(+)	-	२००००.०० (-)	-	२७६१००.०० (+)	२७६१००.०० (+)
खुद बजेट	३४७६८९.००	-	-	३४७६८९.००	३२८६१००.००	२४८२००.००	४१९५००.००	-	३९५३८००.००	४३०१४८९.००
खर्च	२६३२७१.१६	-	-	२६३२७१.१६	३०८५००४.१७	२१४८२२.०१	३०५०१४.१७	-	३६०४८४०.३५	३८६८११२.००
खुद बजेटका आधारमा खर्च (%)	७५.७२	-	-	७५.७२	९३.८८	८६.५५	७२.७१	-	९१.१७	८९.९२


३.२ बजेटको लक्ष्य र खर्चको वार्षिक प्रवृत्ति तुलनात्मक विवरण:

यस मन्त्रालयलाई आ.व. २०७५/७६ देखि आ.व. २०८१/८२ सम्ममा प्राप्त विनियोजित बजेट र खर्चको वार्षिक प्रवृत्ति विवरण तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ (रु.हजारमा)

आर्थिक वर्ष	आर्थिक वर्ष २०७५/७६			आर्थिक वर्ष २०७६/७७			आर्थिक वर्ष २०७७/७८		
खर्चको प्रकार	विनियोजन	खर्च	खर्च प्रतिशत	विनियोजन	खर्च	खर्च प्रतिशत	विनियोजन	खर्च	खर्च प्रतिशत
चालु				१४५०३४	१२१४९१	८३.७६	२६५२१५	१८४६९३	६९.६४
पूँजीगत	४८९१९३१	३९५४१४६	८०.८३	६३८४३६७	५२१८४५४	८१.७३	७७५३९१४	६००४२९६	७७.४४
जम्मा	४८९१९३१	३९५४१४६	८०.८३	६५२९४०१	५३३९९४५	८१.७८	८०१९१२९	६१८८९८९	७७.१८

आर्थिक वर्ष	आर्थिक वर्ष २०७८/७९			आर्थिक वर्ष २०७९/८०			आर्थिक वर्ष २०८०/८१		
खर्चको प्रकार	विनियोजन	खर्च	खर्च प्रतिशत	विनियोजन	खर्च	खर्च प्रतिशत	विनियोजन	खर्च	खर्च प्रतिशत
चालु	२६९०२२	२०१८८६	७५.०४	३०४५०३	२३४३२९	७६.९५	३५१८५५	२४५६३४	६९.८१
पूँजीगत	५३८८९०९	४८७०४९६	९०.३८	५६५२६५५	४८२७००५	८५.३९	४६६५२००	४२१७५८३	९०.४१
जम्मा	५६५७९३१	५०७२३८२	८९.६५	५९५७९५८	५०६१३३४	८४.९६	५०१७०५५	४४६३२१७	८८.९६

आर्थिक वर्ष	आर्थिक वर्ष २०८१/८२		
खर्चको प्रकार	विनियोजन	खर्च	खर्च प्रतिशत
चालु	३४७६८९.००	२६३२७१.००	७५.७२
पूँजीगत	३९५३८००.००	३६०४८४१.००	९१.१७
जम्मा	४३०१४८९.००	३८६८११२.००	८९.९२

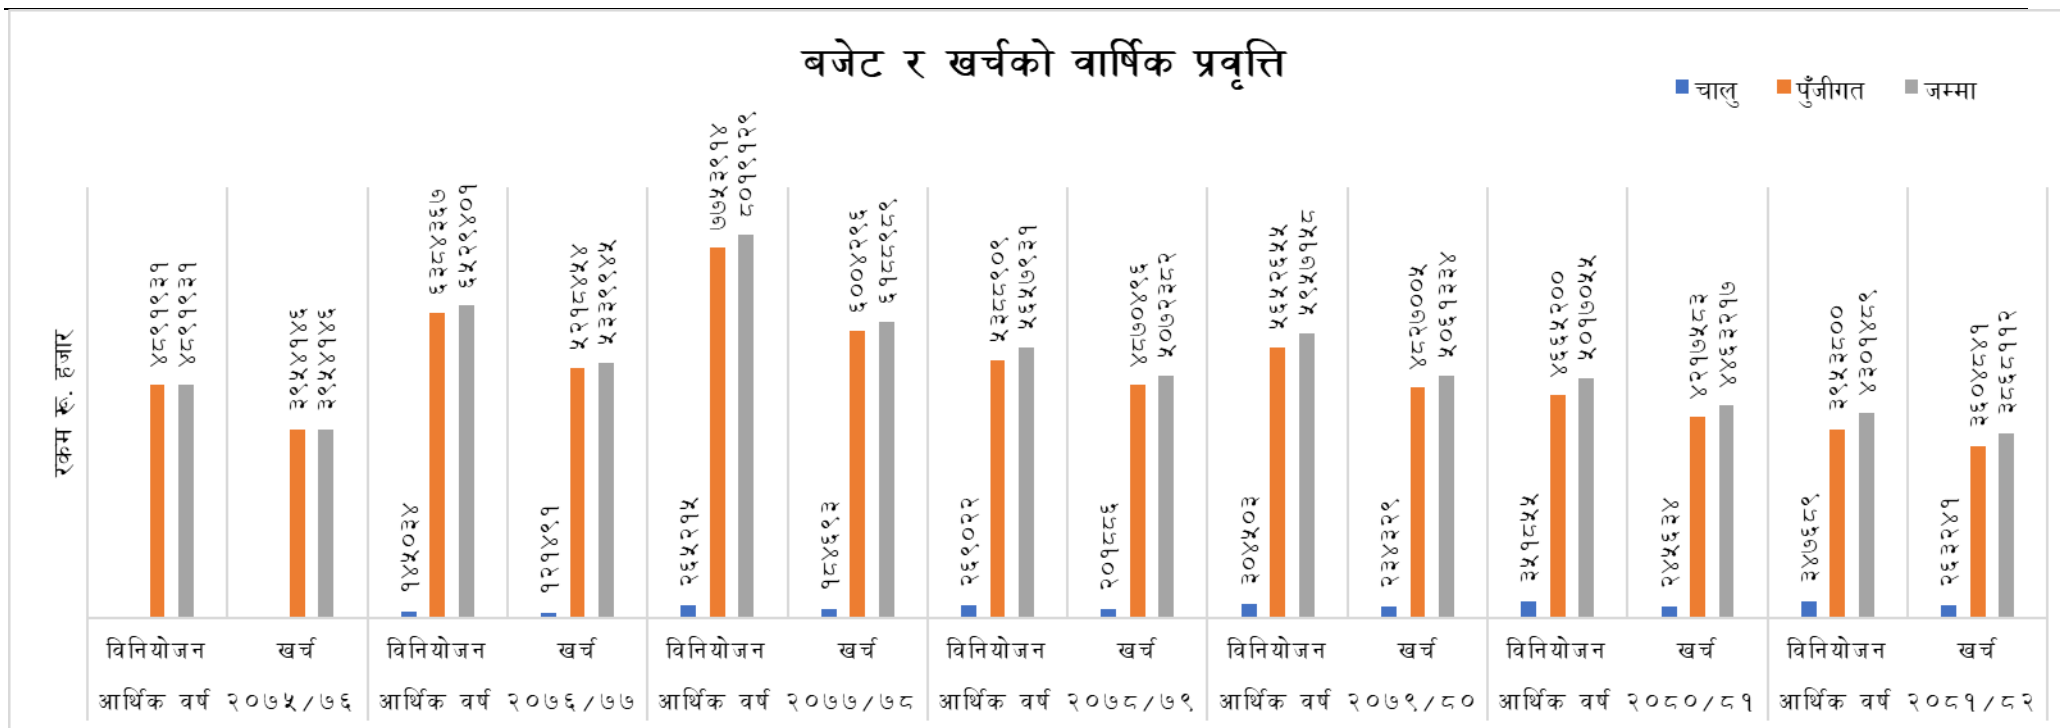


३.३ आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को त्रैमासिक रूपमा कुल खर्चको प्रवृत्ति:

यस मन्त्रालयको आ.व. २०८१/८२ मा प्राप्त विनियोजित बजेट र खर्चको त्रैमासिक रूपमा कुल खर्चको प्रवृत्ति विवरण तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ। (रु. हजारमा)

खर्चको प्रकार	वार्षिक विनियोजन	पहिलो त्रैमासिक				दोस्रो त्रैमासिक			
		त्रैमासिक विनियोजन	त्रैमासिक खर्च	त्रै. खर्च प्रतिशत	वार्षिकको तुलनामा खर्च प्रतिशत	त्रैमासिक विनियोजन	खर्च	त्रै. खर्च प्रतिशत	वार्षिकको तुलनामा खर्च प्रतिशत
चालु	३४७६८९	८८८९६.४९	५२७३४.५३	५९.३७	९५.९७	९७०००.४९	५९०३४.८५	५२.६९	९४.६८
पुँजीगत	३९५३८००	९०४८४६३	५७९९९३.७९	५५.२४	९४.६५	९९४२९८.००	३५६५८३.४७	३९.००	९.०२
जम्मा	४३०९४८९	९९३७२७९	६३९९२८.००	५५.५६	९४.६९	१०९९२९८.४९	४०७६९८.३२	४०.३९	९.४८

खर्चको प्रकार	वार्षिक विनियोजन	तेस्रो त्रैमासिक				चौथो त्रैमासिक			
		त्रैमासिक विनियोजन	त्रैमासिक खर्च	त्रै. खर्च प्रतिशत	वार्षिकको तुलनामा खर्च प्रतिशत	त्रैमासिक विनियोजन	त्रैमासिक खर्च	त्रै. खर्च प्रतिशत	वार्षिकको तुलनामा खर्च प्रतिशत
चालु	३४७६८९	७५४९८.४९	६५६४९.३४	८६.९४	१८.८८	८६३७३.५३	९३८६०	१०८.६७	२७.००
पूँजीगत	३९५३८००	८३३६३८	८२२८३६.८१	९८.७०	२०.८१	११५७४०१	१८४६२२७.०१	१५९.५१	४६.७०
जम्मा	४३०१४८९	९०९१३६.४९	८८८४७८.१५	९७.७३	२०.६६	१२४३७७४.५३	१९४००८७.०१	१५५.९८	४५.१०

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को त्रैमासिक रूपमा कुल खर्चको प्रवृत्ति

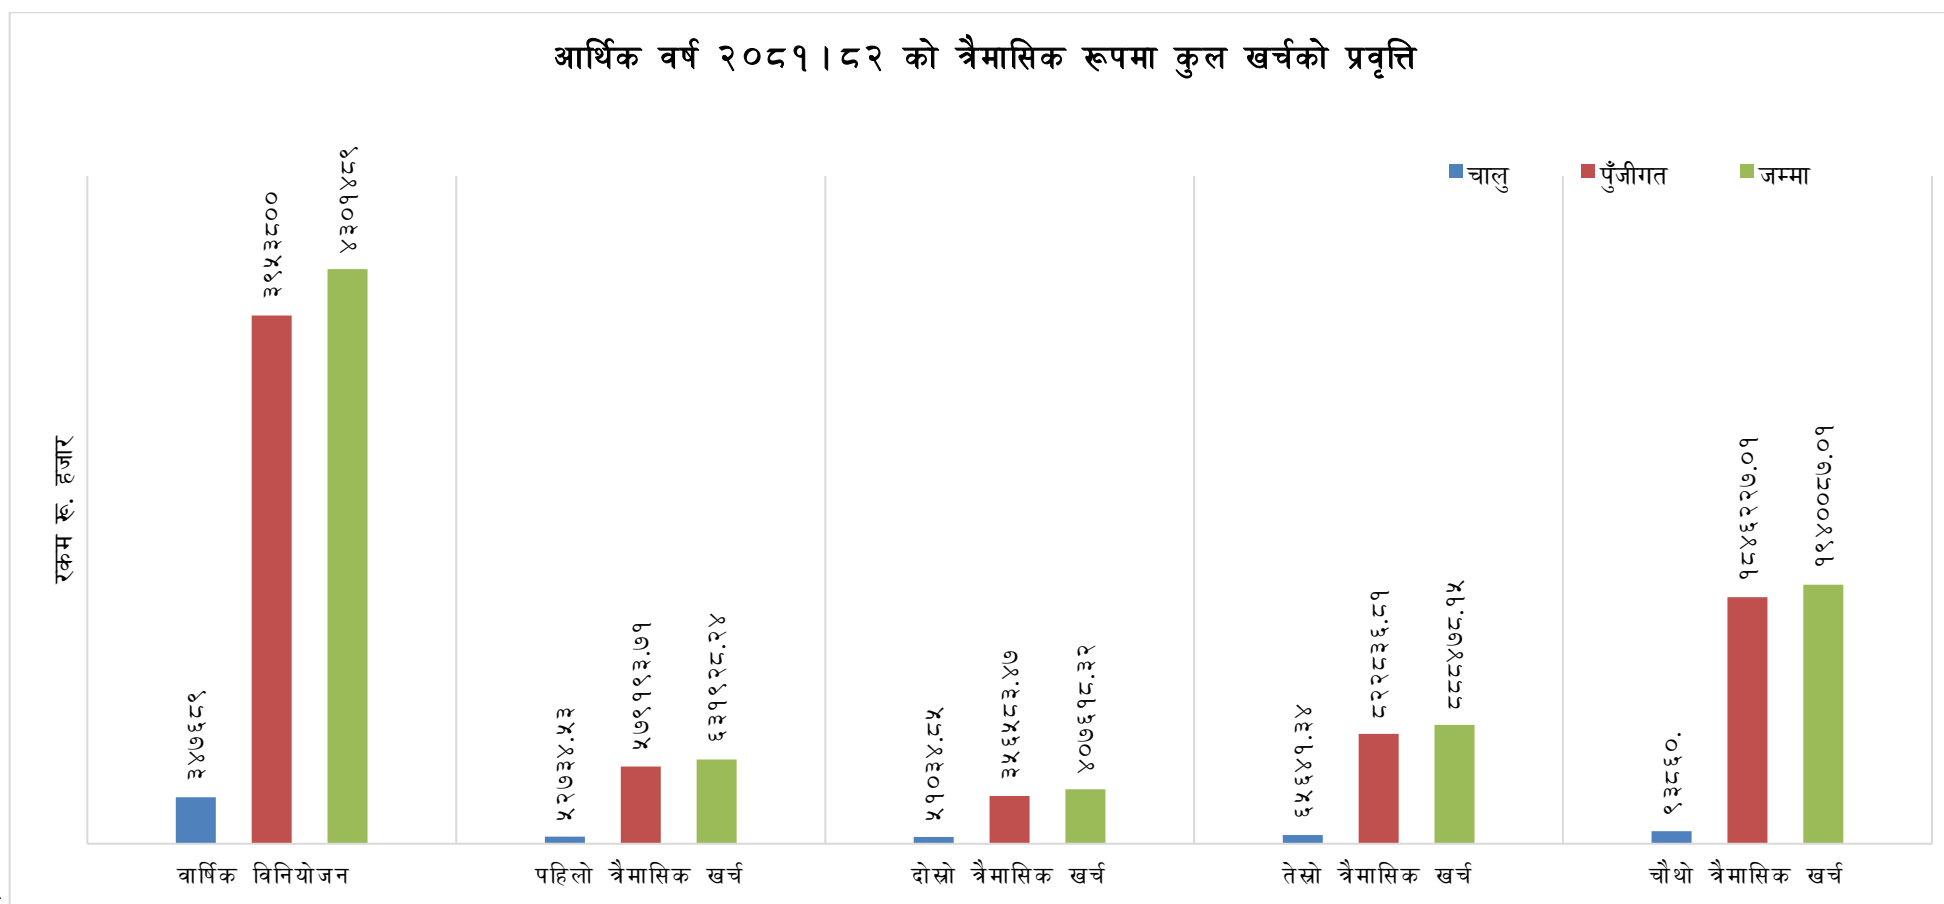

३.४ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट उपशीर्षकगत वित्तीय प्रगति:

यस मन्त्रालयको आ.व. २०८१/८२ मा प्राप्त विनियोजित बजेट र खर्चको बजेट उपशीर्षकगत रूपमा कुल खर्चको प्रगति विवरण तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ। (रु. हजारमा)

क्र.स.	बजेट कोड	बजेट उपशीर्षक	बजेट			खर्च			खर्च प्रतिशत		
			चालु	पूँजीगत	जम्मा	चालु	पूँजीगत	जम्मा	चालु	पूँजीगत	जम्मा
१	३४००१००१	उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय	५४४४२	६३०००	११७४४२	३७२०१	५३५१९	९०७२०	६८.३३	८४.९५	७७.२५
२	३४००३००१	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालयहरु	११२९५०	१३७७७९६	१४९०७४६	९००१६	१२३३१४०	१३२३१५६	७९.७	८९.५	८८.७६
३	३४००३००२	जलस्रोत, सिंचाई तथा खानेपानी कार्यालयहरु	४१७७६	३८३३०४	४२५०८०	३०१८५	३२८४३२	३५८६१७	७२.२५	८५.६८	८४.३६
४	३४००३००३	भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाइ कार्यालयहरु	१६२००	१८९७००	२०५९००	९१९५	१५९१८८	१६८३८३	५६.७६	८३.९२	८१.७८
५	३४००४००१	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयहरु	१२२३२१	१६९१८००	१८१४१२१	९६६६४	१६१५४५६	१७१२१२०	७९.०३	९५.४९	९४.३८
६	३४०९११२३	मर्मत संभार आयोजनाहरु(संघ शसर्त अनुदान)	०	१०००००	१०००००	०	७२८२५	७२८२५		७२.८३	७२.८३
७	३४०९११२८	जलवायु अनुकूलित वृहत खानेपानी आयोजना(संघ शसर्त अनुदान)	०	११९४००	११९४००	०	११५०५७	११५०५७		९६.३६	९६.३६
८	३४०९११२९	ढल निर्माण तथा प्रशोधन कार्यक्रम(संघ शसर्त अनुदान)	०	४००	४००	०	४००	४००		१००	१००
९	३४०९११३२	खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम(संघ शसर्त अनुदान)	०	२८४००	२८४००	०	२६५४१	२६५४१		९३.४५	९३.४५
कुल जम्मा			३४७६८९	३९५३८००	४३०१४८९	२६३२६१	३६०४५५८	३८६७८१९	७५.७२	९१.१७	८९.९२

३.५ आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को कार्यालयगत/क्षेत्रगत/स्रोतगत वित्तीय प्रगति:

यस मन्त्रालयको आ.व. २०८१/८२ मा प्राप्त विनियोजित बजेट र खर्चको क्षेत्रगत रूपमा कुल खर्चको प्रगति विवरण तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ। (रु. हजारमा)

क्र.सं.	विनियोजन					खर्च				खर्च %
	क्षेत्र/खर्च शीर्षक	प्रदेश तर्फ	संघ सशर्त अनुदान	विशेष अनुदान	जम्मा	प्रदेश तर्फ	संघ सशर्त अनुदान	विशेष अनुदान	जम्मा	
१	खानेपानी/३११५६	१६८९०१७	१४८२००	११००००	१९४७२१७	१६३२१९७.८९	१४१९९७.६३	८२८४१.१	१८५७०३६.६२	९५.३७
२	सिंचाइ /३११५५	१०७३६१७	११०८३५	-	११८४४५२	९८३४७५.४७	७१२१०.४९	-	१०५४६८५.९६	८९.०४
३	नदी नियन्त्रण/तटबन्धन/३११५४	४००११९	-	३०९५००	७०९६१९	३८५२५१.१९	-	२२२१७३.३	६०७४२४.४९	८५.६
४	ऊर्जा/३११५३	७२५३५	-	-	७२५३५	५६८९६.८३	-	-	५६८९६.८३	७८.४४
५	अन्य	३९९७७	-	-	३९९७७	२८७९७.५२	-	-	२८७९७.५२	७२.०४
	जम्मा	३२७५२६५	२५९०३५.	४१९५००	३९५३८००	३०८६६१८.९	२१३२०८.१२	३०५०१४.४	३६०४८४१.४२	९१.१७

३.६ यस मन्त्रालयको आ.व. २०८१/८२ मा प्राप्त विनियोजित बजेट र खर्चको स्रोतगत रूपमा कुल खर्चको प्रगति विवरण तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।

(रु. हजारमा)

क्र. स.	कार्यालय	विनियोजित बजेट र खर्चको विवरण										
		चालु तर्फ		प्रदेश पुँजीगत		संघ सशर्त अनुदान		संघ विशेष अनुदान		जम्मा		
		विनियोजन	खर्च	विनियोजन	खर्च	विनियोजन	खर्च	विनियोजन	खर्च	जम्मा विनियोजन	जम्मा खर्च	खर्च %
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११=३+५+७+९	१२=४+६+८+१०	१३=१२/११ %
१	ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय	५४४४२	३७२०१.००	६३०००	५३५५०.००	०	०.००	०	०.००	११७४४२	९०७५१.००	७७.२७%
२	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, गोरखा	१३८००	११५५२.००	१४९७००	१३५७८६.००	०	०.००	०	०.००	१६३५००	१४७३३८.००	९०.११%
३	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, लमजुङ	१३५००	९०२३.२३	९८६४५	८६३१४.१९	३०४०	१५९२.५०	०	०.००	११५१८५	९६९२९.९२	८४.१५%
४	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, तनहुँ	१४५००	११८२७.८३	१४७२००	१४०९२०.३०	०	०.००	५००००	४८७९०.७०	२११७००	२०१५३८.८४	९५.२०%
५	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, कास्की	१६५००	१३८२५.००	२०६०३९	१९९५७४.००	३६५१०	१७६१८.००	६००००	२०९४०.००	३१९०४९	२५१९५७.००	७८.९७%

क्र. स.	कार्यालय	विनियोजित बजेट र खर्चको विवरण										
		चालु तर्फ		प्रदेश पुँजीगत		संघ सशर्त अनुदान		संघ विशेष अनुदान		जम्मा		
		विनियोजन	खर्च	विनियोजन	खर्च	विनियोजन	खर्च	विनियोजन	खर्च	जम्मा विनियोजन	जम्मा खर्च	खर्च %
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११=३+५+७+९	१२=४+६+८+१०	१३=१२/११ %
६	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, पर्वत	१२९००	११३४९.७५	९९३३८	९१८०९.४८	०	०.००	०	०.००	११२२३८	१०३१५९.२३	९१.९१%
७	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, स्याङ्गजा	१३७००	११३०५.८५	१५७७३०	१३९४७७.५०	५७२६०	५०६२६.३४	६५०००	६४९८२.२२	२९३६९०	२६६३९१.९०	९०.७१%
८	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, बागलुङ	१३९५०	९३३३.६८	११७९००	१०२४३८.९०	१४२५	१३६९.६२	०	०.००	१३३२७५	११३१४२.२०	८४.८९ %
९	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, नवलपुर	१४१००	११८०७.८२	१८१२४४	१७८६७८.३२	१७६५	१६१९.००	४५०००	२३४७५.२६	२४२१०९	२१५५८०.४०	८९.०४ %
१०	खानेपानी, जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास सब-डिभिजन कार्यालय, मनाङ	१२५००	८५१२.११	८६८९६	८३३६८.५४	०	०.००	०	०.००	९९३९६	९१८८०.६५	९२.४४%
११	खानेपानी, जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास सब-डिभिजन कार्यालय, मुस्ताङ	१३९९९	९००७.७६	७२१००	५३६६२.५२	१५००	१३०५.०२	८९५००	६३९८४.४३	१७७०९९	१२७९५९.७४	७२.२५%

क्र. स.	कार्यालय	विनियोजित बजेट र खर्चको विवरण										
		चालु तर्फ		प्रदेश पुँजीगत		संघ सशर्त अनुदान		संघ विशेष अनुदान		जम्मा		
		विनियोजन	खर्च	विनियोजन	खर्च	विनियोजन	खर्च	विनियोजन	खर्च	जम्मा विनियोजन	जम्मा खर्च	खर्च %
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११=३+५+७+९	१२=४+६+८+१०	१३=१२/११ %
१२	खानेपानी, जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, म्याग्दी	१५०५०	१२६६५.१३	१२८३०८	१२१०९६.०३	५१००	४३९५.७५	६५००	६५००.००	१५४९५८	१४४६५६.९१	९३.३५%
१३	भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाइ कार्यालय, नवलपुर	१६२००	९१९५.००	१८९७००	१५९१८८.००	०	०.००	०	०.००	२०५९००	१६८३८३.००	८१.७८%
१४	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, गोरखा	३५०००	२६५५५.००	५२२०००	५२००९६.३९	२०३००	२०१३६.४५	२७५००	२७४६०.५६	६०४८००	५९४२४८.३९	९८.२६%
१५	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, तनहुँ	३१७८३	२६९६८.००	३५८०००	३३६६०८.४०	२८०००	२६३४७.००	४४२००	३१७३८.००	४६१९८३	४२१६६१.४०	९१.२७%
१६	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, स्याङ्गजा	३५०४६	२९०२६.००	३७२९००	३५६९९५.००	५०९००	४८५४८.००	१४८००	४४४०.००	४७३६४६	४३९००९.००	९२.६९%
१७	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, बागलुङ	२०७१९	१४११६.००	३३५४००	३२५४४०.६१	४२४००	४१२६४.३४	१७०००	१२७०३.००	४१५५१९	३९३५२४.३८	९४.७१%
जम्मा		३४७६८९	२६३२७१.१६	३२८६१००	३०८५००४.१७	२४८२००	२१४८२२.०१	४१९५००	३०५०१४.१७	४३०१४८९	३८६८१११.५१	८९.९२%

४. आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक कार्यक्रमको प्रगति विवरण

४.१ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयनबाट हासिल भएका मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू:

यस मन्त्रालयको आ.व. २०८१/८२ मा प्राप्त विनियोजित बजेट र खर्चबाट तथा प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित कार्यक्रमबाट हासिल भएका विषय क्षेत्रगत उपलब्धि सम्बन्धी विवरण तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।

क्र. सं.	मुख्य विषय क्षेत्र	सहायक विषय क्षेत्र	एकाई	परिमाणात्मक लक्ष्य	प्रगति	विषय क्षेत्रगत उपलब्धि (वार्षिक र प्रदेश सरकारको स्थापना भएपछिको जम्मा)
४.१.१	ऊर्जा विकास	विद्युतमा पहुँच घरधुरी	प्रतिशत	१००	९९.८०	- हालसम्म विद्युत विस्तार, लघु जलविद्युत मर्मत तथा घरेलु सोलार मार्फत विद्युतमा पहुँच घरधुरी ९९.८० प्रतिशत पुगेको। - आ.व. २०८१/८२ मा थप २ वटा लघु जलविद्युत आयोजना (रुद्रताल लघु जलविद्युत आयोजना, बागलुङ्ग, र फु लघु जलविद्युत आयोजना, मनाङ्ग- ७३ किलोवाट) मर्मत गरि हालसम्म ९४ वटा लघु जलविद्युत आयोजना मर्मत मार्फत ३,५०६ किलोवाट विद्युत नियमित भएको छ। - आ.व. २०८१/८२ मा थप १ वटा १२ किलोवाट पिक क्षमताको संस्थागत सोलार (प्रकाश ज्योती मा.वि.-नासो-५, थोचे, मनाङ्ग) जडान गरि हालसम्म २३४ किलोवाट पिक क्षमताको संस्थागत सोलार जडान सम्पन्न गरिएको छ। - आ.व. २०८१/८२ मा युम्लेखोला लघु जलविद्युत आयोजना, ६० कि.वा., मनाङलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान गरिएको छ। - गोरखाको घ्याचोक स्वास्थ्य चौकी, अजिरकोट गा.पा. र म्याग्दीको ताकम स्वास्थ्य चौकी, धौलागिरि गा.पा. गरी २ वटा वर्थिंग सेन्टरमा ८/८ कि.वा. सौर्य उर्जा प्रविधि जडान गरी नवजात शिशु राख्ने कोठा न्यानो पारिएको।
४.१.२	सिँचाइ संरचना निर्माण	सिँचित क्षेत्र विस्तार, कृषक कुलो सुधार,	हेक्टर	५००	८१७	आ.व. २०८१/८२ मा सतह, लिफ्ट र नयाँ प्रविधि, भूमिगत सिँचाइ गरी ८१७ हेक्टर थप भइ प्रदेश सरकारबाट जम्मा ७,६५२ हेक्टर कमाण्ड क्षेत्रमा सिँचित क्षेत्रफल विस्तार भएको छ। कृषक कुलो सुधारबाट थप २३७२ हे. गरि जम्मा ६,१५४ हेक्टर तथा पुनर्स्थापना र सुधारबाट

		पुनर्स्थापना, मर्मत				थप ३,१८१ हेक्टर गरी जम्मा २४,३६० हेक्टर जमिनमा भरपर्दो सिंचाइ सुविधा पुगेको छ।
४.१.३	तटबन्धन निर्माण	नदी किनार बस्ती संरक्षण, जग्गा उकास	किलो मिटर	१६.६६	१४.२२	आ.व. २०८१/८२ मा १४.२२ कि.मि. तटबन्ध निर्माण भै ५७.९० हे. जग्गा उकास भएको छ। हालसम्म प्रदेश सरकारबाट तटबन्ध निर्माण १३७.९७ किलोमिटर र जग्गा उकास ३,४०४ हेक्टर पुगेको छ।
४.१.४	खानेपानी संरचना निर्माण	आधारभूत स्तरको खानेपानी सुविधामा पहुँच	वटा	३९,८००	१५,२४५	- प्रदेश खानेपानी नियमावलीको गण्डकी प्रदेश सरकारबाट पारित भएको गरिएको छ। - आ.व. २०८१/८२ मा १५,२४५ नयाँ निजी धारा जडान भएको छ। प्रदेश सरकारबाट हालसम्ममा जडान भएका निजी धारा संख्या: १ लाख ६३ हजार ४ सय ७० पुगेको छ। (NWASH-MIS) को तथ्यांक बमोजिम आधारभूतस्तरको खानेपानी सुविधाबाट लाभान्वित जनासंख्या: ९२.९० % पुगेको। हालसम्म प्रदेश सरकार र अन्य निकायबाट गरी करिब ६५ % घरधुरीमा निजी धारा जडान भएको अनुमान गरिएको। (NWASH-MIS) तथ्यांक संकलनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरि तिनै तहबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएका पालिका संख्या ८१ वटा, तथ्यांक संकलन सम्पन्न भएका पालिका संख्या ३० वटा, तथ्यांक संकलन भईरहेका पालिका संख्या ४९ वटा, अन्य विकास साझेदारबाट तथ्यांक संकलन भएका/हुँदै गरेका पालिका संख्या ४ वटा र यस प्रणालीमा आवद्ध हुन बाँकी रहेका पालिका संख्या २ वटा रहेको।

४.२ बजेट वक्तव्यमा समावेश भएका कार्यक्रमको प्रगति विवरण

क्र. सं.	बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको व्यहोरा	कार्यक्रमको नाम	विनियोजन (रु. हजारमा)	खर्च (रु. हजारमा)	वित्तीय प्रगति %	भौतिक प्रगति/ परिमाणात्मक उपलब्धि
१	११०	प्रदेशभित्र आधारभूत विद्युत सुविधामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चितताका लागि उज्यालो गण्डकी प्रदेश अभियानका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन २०८१/८२ मा नै उज्यालो गण्डकी प्रदेश घोषणा गरिनेछ।	विद्युत विस्तार/सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान/लघु तथा साना जलविद्युत आयोजना	७२५३५	५६८९६.८३	७८.४४	माथि उल्लेखित क्रम संख्या ४.१.१ बमोजिम


क्र. सं.	बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको व्यहोरा	कार्यक्रमको नाम	विनियोजन (रु. हजारमा)	खर्च (रु. हजारमा)	वित्तीय प्रगति %	भौतिक प्रगति/ परिमाणात्मक उपलब्धि
			मर्मत				
२	११४	प्रदेशभित्रको सिचाइयोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिंचाइ सुविधा पुर्याई कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनका लागि सतही, भूमिगत, लिफ्टिङ र पाइप प्रणालीमा आधारित सिंचाइ कार्यक्रम सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाएको छु। भूमिगत सिंचाइ कार्यालय, कास्कीको स्थानान्तरण गरी सो सम्बन्धी बढी लाभग्राही जनसंख्या भएको नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वबाट सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।	सिंचाइ योजना निर्माण कार्यक्रम	११८४४५२	१०५४६८५.५४	८९.०४	माथि उल्लेखित क्रम संख्या ४.१.२ बमोजिम
३	११५	प्रदेशभित्रका जोखिमयुक्त नदी किनारका बस्ती, भौतिक संरचना, खेतीयोग्य जमिन र सांस्कृतिक सम्पदा लगायतको संरक्षण गर्ने तथा जग्गा उकास कार्यका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।	नदी नियन्त्रण कार्यक्रम	७०९६१९	६०७४२४.४९	८५.६०	माथि उल्लेखित क्रम संख्या ४.१.३ बमोजिम
४	११२	एक घर एक धारा कार्यक्रम मार्फत प्रदेशका सबै घरधुरीमा निजी धारा जडान गर्ने कार्यका लागि अति आवश्यक स्थानमा मात्र नयाँ योजना समावेश गर्ने बाहेक पुराना खानेपानी योजनालाई सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छु। सञ्चालित खानेपानी आयोजनाको निरन्तरता र नयाँ आयोजनाको निर्माणबाट सतरी प्रतिशत घरधुरीसम्म निजी धारा पुर्याउनका लागि ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु।	खानेपानी संरचना निर्माण	१९४७२१७	१८५७०३६.६२	९५.३७	माथि उल्लेखित क्रम संख्या ४.१.४ बमोजिम

४.३ आ.व. २०८१/८२ सम्मको लिफ्टिङ खानेपानी र सिंचाइ आयोजनाहरूमा विद्युत महशुल भुक्तानी अनुदान (रु. हजारमा)

क्र. सं.	आर्थिक वर्ष	खानेपानी तर्फ		सिंचाइ तर्फ		कुल जम्मा	
		अनुदान रकम	योजना संख्या		योजना संख्या	अनुदान रकम	योजना संख्या
१	२०८१/८२	४०७६६.८३	४०७	७८१.५७	४७	४१५४८.४०	४५४
२	२०८०/८१	४०९४६.८९	३४६	२२००.००	-	४३१४६.८९	३४६
३	२०७९/८०	१८९३४.३८	२७०	-	-	१८९३४.३८	२७०
	कुल जम्मा	१००६४८.१०	१०२३	२९८१.५७	४७	१०३६२९.६७	१०७०

४.४ आ.व. २०८१/८२ मा कार्यान्वयन भएका योजनाबाट सिर्जना भएको रोजगारी व्यक्तिदिन

क्र.सं.	क्षेत्र	रोजगारी व्यक्तिदिन (Man-Days)
१	सिंचाइ	४६४३२८
२	नदी नियन्त्रण	२६२२९३
३	खानेपानी	३७८९०१
४	उर्जा	३२८०
	जम्मा	११०८८०२

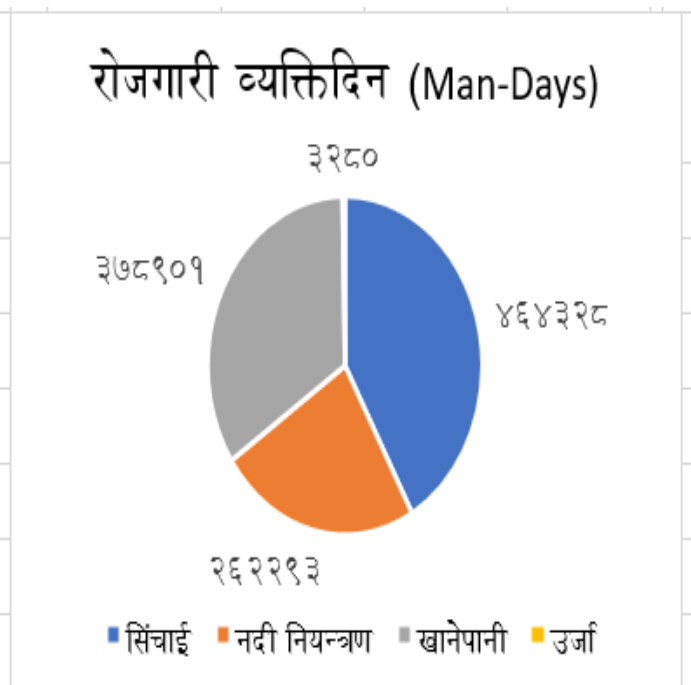

४.५ दोस्रो पञ्च वर्षीय योजना लक्ष्य र उपलब्धी

क्र.सं.	सूचक	इकाई	गण्डकी प्रदेश दोस्रो पञ्च वर्षीय योजनाको लक्ष्य/प्रगति		
			आ.व. २०८१/८२ सम्मको उपलब्धि	आ.व. २०८३/८४ सम्मको लक्ष्य	आ.व. २०८५/८६ सम्मको लक्ष्य
१	जलस्रोत तथा ऊर्जा				
१.१	विद्युत उत्पादन (जडित क्षमता)	मेगावाट	९९८ *	१६००	२५००
१.२	विद्युतमा पहुँच पुगेको जनसंख्या	प्रतिशत	९९.८० *	१००	१००
१.३	प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत	किलोवाट घण्टा	३०० *	३००	५००
१.४	संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रणालीबाट विद्युत उत्पादन	किलोवाट घण्टा	२३४	२५०	३००
२	खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता				
२.१	आधारभूतस्तरको खानेपानी सुविधा प्राप्त जनसंख्या	प्रतिशत	९२.९० #	९८	१००
२.२	मध्यम र उच्चस्तरको खानेपानी सुविधा प्राप्त जनसंख्या	प्रतिशत	१९	६५	९०
२.३	निजी धारा जडान भएका घरधुरी	प्रतिशत	६५	८४	९५
२.४	फलस भएको चर्पी सुविधा उपलब्ध घरधुरी	प्रतिशत	८०	९३	१००
३	सिँचाई तथा तटबन्धन				
३.१	आधुनिक सिँचाई पूर्वाधारबाट सिंचित क्षेत्रफल	हेक्टर	६९,५११ @	६९,०००	७०,०००
३.२	बाह्रैमहिना सिँचाई सुविधा पुगेको क्षेत्र	प्रतिशत/हेक्टर	३३,८८४	३९,०००	४१,०००
३.३	निर्माण भएको तटबन्धनको लम्बाई (प्रदेशबाट)	किलोमिटर	१३७.९७	१५०	२००
३.४	जग्गा उकास कार्य सञ्चालन भएको क्षेत्रफल (प्रदेशबाट)	हेक्टर	३,४०४	४,०००	४,५००

स्रोत: * (नेपाल विद्युत प्राधिकरण)

(NWASH-MIS)

@ (प्रदेश सरकार स्थापना हुनुपूर्व आधुनिक सिँचाई पूर्वाधार विस्तार भएको क्षेत्रफल (६९,८५९ हे.) र प्रदेश सरकारबाट मात्र आ.व. २०७५/७६ देखि २०८१/८२ सम्म आधुनिक सिँचाई पूर्वाधार विस्तार भएको क्षेत्रफल (७,६५ हे.))

४.६ दिगो विकास लक्ष्य र उपलब्धी

क्र.सं.	सूचक	इकाई	राष्ट्रिय				८१/८२ सम्म	गण्डकी प्रदेश			
			२०१५	२०२२	२०२५	२०३०		२०१५	२०२२	२०२५	२०३०
१	ऊर्जा										
१	विद्युतमा पहुँच भएका जनसंख्याको अनुपात	प्रतिशत	७४	८५.७	९०.७	९९	९९.८ *	८२.५	९६	१००	१००
२	प्रतिव्यक्ति ऊर्जा (अन्तिम) उपभोग	किलोवाट घण्टा	८०		१०२७	१५००	३०० *	१९०.		७५०	१७००
३	जलविद्युतको जडित क्षमता	मेगावाट	९९०	५४१७	१०२६०	१५०००	९९८ \$	४४८	८६९	३०००	६०००
२	खानेपानी तथा सरसफाई										
१	सुरक्षित खानेपानीको सुविधा उपलब्ध जनसंख्या	प्रतिशत	१५	५०	६५	९०	१९	५०.४	६५.०	८५	९०
२	आधारभूत खानेपानी सुविधा कभरेज	प्रतिशत	८७	९२.६	९५	९९	९२.९ #	९१.१	९५	१००	१००
३	उन्नत/सुधारिएको सरसफाई सम्बन्धी सुविधा प्रयोग गर्ने परिवार	प्रतिशत	६४.६	७८.७	८५.७	९५	८०	७३.६	८०	८५	९९
४	शौचालय प्रयोग गर्ने जनसंख्याको अनुपात	प्रतिशत	६७.६	८३.८	९०	९८	९३	८१.४	९०	९२	९९
३	जलस्रोत तथा सिंचाइ										
१	१२ है महिना सिंचाइ उपलब्ध कृषि भूमि	प्रतिशत					९.६४	४६	४८	५५	६५

स्रोत: * (नेपाल विद्युत प्राधिकरण)

\$ (विद्युत विकास विभाग)

(NWASH-MIS)

५. राजस्व संकलन र बेरूजुको विवरण

५.१ राजस्व संकलनको विवरण (रकम रु. हजारमा)

क्र. सं.	राजस्व शीर्षक	राजस्व संकलन
१	१४२२९- अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	१२७९.१६
२	१४३१२- प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	६३०७.५१
३	१५१११- बेरूजु	२४५५.०७
४	सरकारी सम्पत्ति विक्रीबाट प्राप्त रकम	१०५.४२
५	१४२१७-नहर तथा कुलो उपयोग वापतको शुल्क	२५.९५
६	१४२६३-जलस्रोत सम्बन्धी अन्य दस्तुर	२१५.
७	१४३१३-धरौटी सदरस्याहा	४८५६.८५
जम्मा		१५२४४.९४

५.२ बेरूजुको संक्षिप्त विवरण (रु.) :-

प्रकार		आ.व. २०८०/८१ सम्मको बाँकी बेरूजु	आ.व. २०८१/८२ मा फछ्यौट भएको	२०८२ साउनमा अ.ल्या. गरिएको बाँकी बेरूजु	कैफियत
लगती बेरूजु	असुल उपर गर्नुपर्ने	२,०७,८२,५२४.००	६,९७,४४,९०.००	१,३८,०८,०३४.००	
	नियमित गर्नुपर्ने	१२,०९,८४,४६२.००	३,८३,३६,५९०.००	८,२६,४७,८७२.००	
	प्रमाण कागजात पेश गर्ने	१२,०८,०४,६२०.००	०	१२,०८,०४,६२०.००	
	पेशकी	४९,८५,९०,९८८.००	२९,२०,०००.००	४९,५६,७०,९८८.००	
जम्मा		७६,११,६२,५९४.००	४,८२,३१,०८०.००	७१,२९,३१,५१४.००	

- कुल बेरूजु मध्ये रु १०,०६,०३,४७७ सङ्घीय सरकार तर्फको बेरूजु रहेको।
- धेरै जसो विद्युत प्राधिकरणलाई दिइएको विद्युत विस्तार र काठेपोल प्रतिस्थापन कार्यको बेरूजु रहेको।
- विद्युत विस्तार र काठेपोल प्रतिस्थापन सम्बन्धी बेरूजुका सम्बन्धमा प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिबाट निर्णय गरी म.ले.प. समक्ष सम्परीक्षणका लागि अनुरोध गरि पठाईएकोमा प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तर दायित्व ऐन, २०७९ को दफा ३९ अनुसार लेखा समितिको प्रतिवेदन प्रदेश सभाबाट स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोले सो प्रक्रिया पूरा नभैसकेकोले बेरूजुको ठुलो अंक सम्परीक्षण हुन नसकेको।
- बाँकी बेरूजु फछ्यौट सम्बन्धमा निर्देशन, तालिम र ताकेता भइ नै रहेको छ।

६. बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका मुख्य समस्या, चुनौती तथा समाधानका उपायहरू

६.१ मुख्य समस्या र समाधानका लागि मन्त्रालयले गरेका प्रयासहरू

क्र. सं.	कार्यक्रम/विषयको विवरण	समस्या तथा चुनौती	समाधानका लागि मन्त्रालयले गरेका प्रयासहरू
१	सिंचाइ/नदी नियन्त्रण/खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्र	- योजना संख्या निरन्तर बढ्दै जानु तर सो अनुरूप बजेट व्यवस्थापन नहुनु। योजना कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरामा अन्यौलता देखिनु। - प्रमुख हस्तक्षेपकारी/रूपान्तरणकारी आयोजना प्राथमिकतामा नपर्नु। - संघबाट हस्तान्तरित आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्नका पर्याप्त बजेटको व्यवस्था नभएकोले झन्डै	- मर्म-सम्भार गर्नुपर्ने खालका र नयाँ सुरू गर्नुपर्ने खालका आयोजनालाई छुट्टाछुट्टै बजेट उप शीर्षक दिएर वार्षिक विकास कार्यक्रममा आयोजना वर्गीकरण गरिएको। - आ.व. २०८१/८२ मा रु ५० लाखसम्ममा सम्पन्न हुनसक्ने सबै खानेपानी, सिंचाइ र भूमिगत सिंचाइका गरी आयोजनालाई आ.व. २०८२/८३ मा सम्पन्न गर्नका लागि ३९६ वटा आयोजनामा स्रोत सहमति प्राप्त भएको। - मर्मत-सम्भार तथा प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाका लागि छुट्टै मापदण्ड बनाइ जति बजेट विनियोजन भएको छ, त्यत्तिको मात्र काम गरिने। - आ.व. २०८२/८३ नयाँ आयोजना सञ्चालन गर्न भन्दा क्रमागत सिंचाइ/खानेपानी आयोजनालाई सम्पन्न गर्न र पुराना सिंचाइ/खानेपानी प्रणालीको मर्मत, सुधार तथा प्रणाली सुदृढीकरण कार्यका लागि प्राथमिकता दिने गरी बजेट निर्माण गरिएको। - वित्तीय स्रोतको अभाव रहेकोले संघका विषयगत मन्त्रालयसँग छलफल र

क्र. सं.	कार्यक्रम/ विषयको विवरण	समस्या तथा चुनौती	समाधानका लागि मन्त्रालयले गरेका प्रयासहरू
		२०० खानेपानी आयोजनाको सम्पन्न हुने कुरामा अन्यौलता रहेको। - स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार तथा क्षमता भित्रका स-साना आयोजना समेत प्रदेश सरकार मातहत कार्यन्वयन हुनु। - संघीयता लागु हुनु भन्दा पहिला वैदेशिक विकास साझेदार संस्थाहरू (Asian Dev. Bank, World Bank) ले प्रदेश स्तरको सिंचाइ र खानेपानी क्षेत्रमा गर्दै आएको सहयोग हाल रोकिएकोले त्यसको निरन्तरताको लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने।	समन्वयको प्रयास गरिएको। - आर्थिक मामिला मन्त्रालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग निरन्तर समन्वय र सम्पर्कमा रहेर समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिएको। - गण्डकी प्रदेश आयोजना बैंक कार्यविधि, २०८१ बमोजिम ऊर्जा, सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रण र खानेपानी आयोजनाको माग फारमको ढाँचा तयार गरिएको। - लिफ्टिङ खानेपानी र सिंचाइ आयोजनाहरूमा विद्युत महशुल भुक्तानी अनुदान वितरण गरिएको।
२	ऊर्जा क्षेत्र	प्रदेशको ऊर्जा सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था र ऊर्जा हेर्ने छुट्टै संरचना र आवश्यक जनशक्ति नभएको।	विद्युत विकास विधयेक प्रदेश सभाबाट पारित भई प्रमाणीकरणको क्रममा रहेको जसमा विद्युत हेर्ने छुट्टै कार्यालयको व्यवस्था रहेको।

६.२ बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा देखिएका अन्य समस्या तथा चुनौतीहरू

क. नीतिगत र कानुनी समस्या तथा चुनौतिहरू

- राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेका स्थानमा लघु जलविद्युत् आयोजनाको सञ्चालन र दिगोपन चुनौती रहेको।
- “संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको वर्गीकरण तथा बाँडफाँट सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६” लाई खारेज गरी संघीय सरकारले जारी गरेको

“आयोजना वर्गीकरणको आधार र मापदण्ड, २०८०” को व्यवस्था बमोजिम प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने सिंचाइ (पहाडमा ५० देखि १०० हेक्टर तथा हिमालमा २५ देखि ५० हेक्टर र तराईमा ५०० देखि ५००० हेक्टर तथा भूमिगत सिंचाइ २५ देखि १०० हेक्टर) मात्र रहेकोमा हाल पहाडी जिल्लाहरूमा कार्यान्वयन भैरहेका अधिकांस सिंचाइ आयोजनाहरू प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र बाहिर परेका छन् ।

- संघीय सरकारले हालै जारी गरेको खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली, २०८१ अनुसार खानेपानीको हकमा (पहाडमा २,००० देखि ५,००० सम्म, हिमालमा ५०० देखि १,००० सम्म र तराईमा ८,००० देखि १५,००० सम्मको जनसंख्यालाई प्रशोधित खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने) रहेकोमा प्रदेश सरकारले हाल कार्यान्वयन गरिरहेका अधिकांश (करिव ६६%) आयोजनाहरू प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर परेको देखिन्छ। त्यसैले, यो नियमावलीलाई पुनरावलोकन र परिमार्जन गरी प्रदेशमैत्री, व्यावहारिक र यथार्थपरक बनाउन जरुरि देखिन्छ।
- नेपालको वर्तमान संविधान बमोजिम साझा अधिकारको सुचिमा रहेका विषयहरू कार्यान्वयन गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायहरूका आयोजनाहरू दोहोरो पर्ने गरेका छन्। संघीयता लागु भएपछि सिंचाइ र खानेपानी क्षेत्रमा खोलिएका संघीय विषयगत कार्यालयहरूबाट कार्यान्वयन भएका स-साना आकारका योजनाहरूबाट एकातिर संघीयतामा अधिकार हस्तान्तरणमा केन्द्र सरकार अझै उदासिन रहेको देखिन्छ भने अर्कोतिर आयोजना दोहोरो पर्न जाने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ।

ख. स्रोतगत समस्या तथा चुनौतिहरू

- कार्यान्वयन गर्नुपर्ने योजना संख्या वर्षे पछि बढ्दै गैरहेको तर सो अनुरूप बजेट विनियोजन बढ्न नसकेकोले गर्दा औसत योजनागत वार्षिक बजेट घट्दै जानु
- ससर्त सहित संघबाट हस्तान्तरित सिंचाइ र खानेपानी तर्फका छुट/अधुरा र समयमा सम्पन्न हुन नसकेका विशेष अनुदानका खानेपानीका योजनामा पनि प्रदेश सरकारको स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आयोजना अधुरो रहनु
- संघीयता लागु हुनु भन्दा पहिला वैदेशिक विकास साझेदार संस्थाहरू (Asian Development Bank, World Bank आदि) ले प्रदेश स्तरको सिंचाइ /खानेपानी क्षेत्रमा गर्दै आएको सहयोग हाल रोकिन जानु
- प्रदेश सरकारबाट खानेपानीको गुणस्तर सुधारको क्षेत्रमा पर्याप्त स्रोत विनियोजन गर्न नसकिएको हुनाले खानेपानीको गुणस्तरको सूचक बढ्न नसक्दा यसको कारण स्वास्थ्य क्षेत्रको सूचकमा पनि सुधार आउन नसकेको पाईनु
- दीगो विकास लक्ष्य २०३० ले निर्धारण गरेको ९०% जनतालाई गुणस्तरीय खानेपानीको सुबिधा पुर्याउने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्नमा स्रोत साधनको निक्कै ठुलो चुनौती रहनु

ग. प्रकृयागत समस्या तथा चुनौतिहरू


- सामुदायिक अवधारणाबाट कार्यान्वयन शुरू गरिएको भएपनि विविध कारणले औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा कुनै व्यक्ति वा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन व्यवस्थापन भैरहेका लघु जलविद्युत आयोजनाहरूको सरकारी स्रोत साधन खर्च गरेर मर्मत सम्भार गर्न समस्या रहेको।
- जलविद्युत आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालनको अधिकार प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेकोमा संघीय विद्युत विधेयक पारित नहुँदा र उर्जा उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रम प्रदेशबाट सुरु गर्न नसकिनु
- न्यून बजेट विनियोजनले सानो सानो आयोजना पनि सम्पन्न हुनमा धेरै वर्ष लाग्ने गरेकोले आयोजना कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरामा धेरै अन्योल रहेको हुनाले समयमै आयोजना सम्पन्न गर्नमा चुनौती रहेको।
- प्रदेश सरकार स्थापना भएपछिका ७ वर्षमा ऊर्जा/खानेपानी/सिंचाइ क्षेत्रमा कूल विनियोजित बजेट, खर्च, कुल आयोजना संख्या र प्रति आयोजन औसत वार्षिक विनियोजनलाई तलको तालिका र चार्टमा प्रस्तुत गरिएको छ।
 - प्रदेश सरकार स्थापना पश्चात ऊर्जा, सिंचाइ र खानेपानी क्षेत्रमा विनियोजित पुँजीगत बजेट आ.व. २०७५/७६ देखि २०७७/७८ सम्म बढेको देखिन्छ।
 - आ.व. २०७७/७९ देखि २०८३/८३ सम्म ऊर्जा, सिंचाइ र खानेपानी क्षेत्रमा विनियोजित पुँजीगत बजेट घट्दो क्रममा रहेको छ।
 - ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको पुँजीगत तर्फ विगत ७ वर्षमा हरेक वर्ष ८० प्रतिशत भन्दा बढी वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ भने गत आ.व. २०८१/८२ मा हालसम्मकै उच्च ९१.१७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ।

बिगत ७ वर्षको बजेट विनियोजन र खर्चको प्रतिशत

आर्थिक वर्ष	कुल पुँजीगत विनियोजन	खर्च रु हजारमा	खर्च %
२०७५/७६	४,८९,१९,३१	३,९५,४१,४६	८०.८३
२०७६/७७	६,३८,४३,६७	५,२१,८४,५४	८१.७३
२०७७/७८	६,७५,३९,१४	६,००,४२,९६	८८.९
२०७८/७९	५,३८,८९,०९	४,८७,०४,९६	९०.४
२०७९/८०	५,६५,२६,५५	४,८२,७०,०४	८५.३९
२०८०/८१	४,६६,५२,००	४,२१७,५८३	९०.४१
२०८१/८२	३,९५,३८,००	३,६०,४८,४०	९१.१७
२०८२/८३	३,५५,४१,००	७ वर्षको औसत वित्तीय	८६.८७ %

- ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको पुँजीगत तर्फ विगत ७ वर्षको वार्षिक बजेट, प्रादेशिक योजना संख्या र औसत वार्षिक बजेटको तुलना गर्दा विनियोजित बजेट घट्दै गएको, आयोजना संख्या बढ्दै गएको हुनाले औसत आयोजना वार्षिक बजेट घट्ने क्रममा रहेको देखिन्छ।

बिगत ७ आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रादेशिक योजना संख्या, कुल वार्षिक बजेट र औसत योजनागत वार्षिक बजेटको तुलनात्मक चार्ट

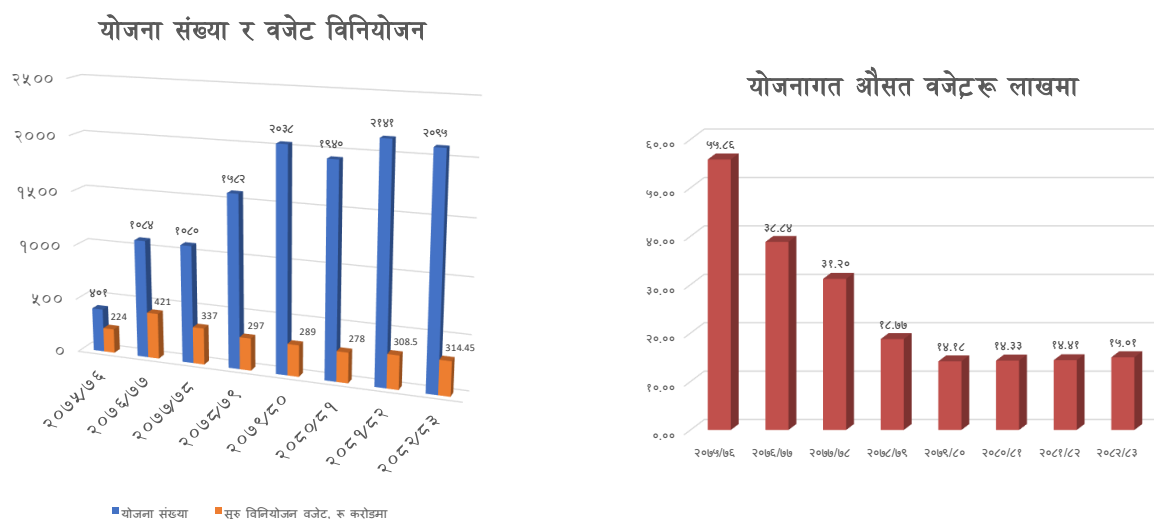

६.३ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ऐन/नियम तर्जुमाको विवरण

क) तर्जुमा भएका ऐन/नियम/कार्यविधि/मापदण्ड/निर्देशिका/मार्गदर्शन आदि

१. गण्डकी प्रदेश सिंचाइ ऐन, २०७८
२. गण्डकी प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ (प्रथम संसोधन २०८१)
३. घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
४. लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनामा विद्युत महशुल अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९
५. लिफ्टिङ सिंचाइ प्रणालीमा विद्युत महशुल अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड, २०८०
६. खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली, २०८२
७. मर्मत संभार तथा प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना कार्यान्वयन मापदण्ड, २०८२

ख) तर्जुमा चरणमा रहेका ऐन/नियम/कार्यविधि/मापदण्ड/निर्देशिका/मार्गदर्शन आदि

१. विद्युत विकास विधायक - प्रदेश सभाबाट पारित भइ प्रमाणित हुने प्रक्रियामा रहेको
२. जलस्रोत विधायक
३. सिंचाइ नियमावली
४. खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (WASH MIS) सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि

७. आ.व. २०८१/८२ मा यस मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूबाट गरिएका कार्यक्रमका प्रतिनिधिमुलक जलकहरू:

युम्लेखोला लघु जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान, मनाङ

जडानको चरण



जडानको चरण



जडान पश्चात



बड्की कुलो सिंचाइ योजना, मध्यविन्दु-३, नवलपरासी (ब.सु.पू.)

निर्माण पूर्व



निर्माणाधीन



निर्माण पश्चात



भर्लाडदी खोला दायाँ सिँचाई कुलो मर्मत योजना, देवचुली न.पा. ५, नवलपुर
निर्माण पूर्व निर्माणाधीन



निर्माण पश्चात



नारेखर ताल जलाशय लिफ्ट सिंचाइ योजना, व्यास-६, तनहुँ,
निर्माण पूर्व निर्माणाधीन



निर्माणाधीन



जिउरेनी धुसेनी पुछार कुलो सिंचाइ योजना, जैमिनी ढ
निर्माण पूर्व निर्माणाधीन निर्माण पश्चात



सौरपानि घुचोक पोखरीलाई जलशाययुक्त बनाई संरक्षण गर्ने, बारपाक सुलिकोट-४, गोरखा,

निर्माण पूर्व



निर्माणाधीन



निर्माण पश्चात



चुचुरे दरौदी दोभान भुसुण्डे खोला तटबन्धन, पा.न.पा.-१, गोरखा
निर्माण पूर्व निर्माण पश्चात



मस्याङ्गदी तालपोखरी बहुउद्देश्य लिफ्टिङ्ग सिचाई आयोजना, पा.न.पा. ६, गोरखा
निर्माणाधीन



गिरुवारी हुप्सेकोट तटबन्ध, नवलपरासी (ब.सु.पू)
निर्माण पूर्व निर्माण पश्चात



आँधिखोला गा.पा. खण्डमा बोल्टर तटबन्ध



वालिङ/भिरकोट न.पा. खण्ड



आँधिखोला ग्यावियन तथा बोल्डर तटबन्ध कार्य, वालिन न.पा./आँधिखोला गा.पा., स्याङ्गजा



राहिघाट कुलो निर्माण, पोखरा-२७, कास्की



एकिकृत बेलादी कुलो सिचाई तथा पिडिखोला तटबन्धन, गल्याङ-६, स्याङ्गजा



रिस्तीखोला नियन्त्रण कार्य, मध्यनेपाल, लमजुङ




कालीगण्डकी नदी नियन्त्रण, मुस्ताङ



आँपचौर दीप ट्युवेल, देवचुली-१६, नवलपुर



पूर्वाखेत दीप ट्युवेल, देवचुली-२, नवलपुर

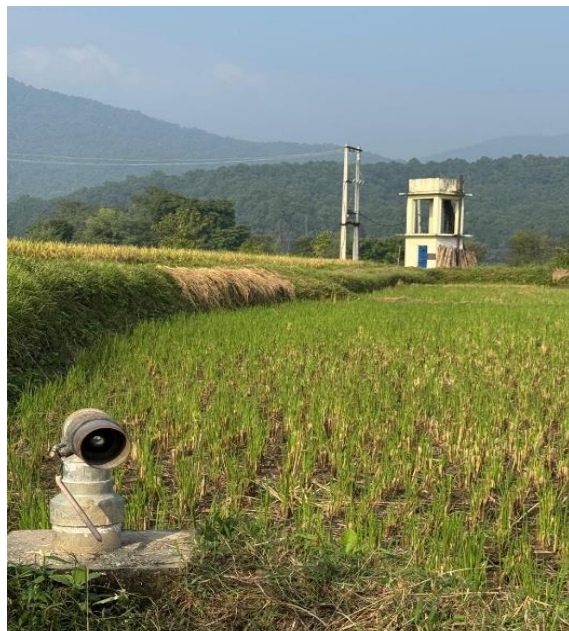

मा. मन्त्री र सचिव ज्यूसहितको टोली फलेवास लिफ्ट सिंचाइ आयोजना, पर्वतको निरीक्षणमा



लौकाहा खानेपानी योजना, नवलपुर

निर्माणाधीन



निर्माण पश्चात



योजना अनुगमनमा माननीय मन्त्रीज्यू, श्रीमान सचिवज्यू, नगरप्रमुखज्यू लगायत



चित्लीखोला वृहत खा.पा.आ. राइनास, लमजुङमा सेडिमेन्ट ट्याङ्क, रफिड फिल्टर सहितको प्रशोधन प्रणाली निर्माण



माननीय मुख्यमन्त्री ज्यूबाट असुराघारी तथा चोरकाटे बजार खानेपानी आयोजना समुद्धघाटन



आपुखोला भोर्ले चिसापानी लिफ्टिङ योजना, रुपा-६, कास्की



रत्नेचौर खानेपानी योजना, बेनी न.पा.-१, म्याग्दीको कालिगण्डकीमा निर्मित सम्पवेल,
निर्माण पूर्व र निर्माण पश्चात



भुँडीखोला सिम्ले सौरिनी लिफ्ट खानेपानी आयोजना, काठेखोला ५, बागलुङ



बेलचौर खा.पा. आ. चापाकोट स्याङ्गजा



आयोजन सम्बन्धी तालिम
झारकोट सिंचाइ योजना, वारागुड मुक्तिक्षेत्र -१



बिष्णु चुला मुहान खानेपानी योजना



द. अनुसूचीहरू

द.१ घरेलू सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान

क्र.स.	जिल्ला	गाउँपालिकाको नाम	वडा नं.	जडानपिक क्षमता/ घरधुरी संख्या		आ.व.
				२० वाट	५० वाट	
१	गोरखा	धार्चे गा.पा.	३,४,५,६,७		१९०	२०७६/७७
२	गोरखा	चुम्नुब्री गा.पा.	३,६,७		२७०	२०७६/७७
३	म्याग्दी	धवलागिरी गा.पा.	४,६		१२०	२०७६/७७
४	मनाङ्ग	नार्पाभूमि गा.पा.	१,२,३,४,५	७५	५०	२०७६/७७
५	मुस्ताङ्ग	वारागुङ्गमुक्तिक्षेत्र गा.पा.	२,४,५	२५	६०	२०७६/७७
६	मुस्ताङ्ग	लोमन्थाङ्ग गा.पा.	१,२,३,४		२३०	२०७६/७७
७	मुस्ताङ्ग	लो-घेकर दामोदरकुण्ड गा.पा.	४,५		१००	२०७६/७७
		जम्मा		१००	१०२०	
१	म्याग्दी	धवलागिरी गा.पा.	४,६		१००	२०७८/७९
१	बागलुङ	ढोरपाटन न.पा.	६		३८४	२०८०/८१
		कूल जम्मा		१००	१५०४	१६०४

द.२ संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान

क्र.स.	जिल्ला	कार्यालयको नाम	क्षमता (कि.वा.)	आ.व.
१	कास्की	मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश	४१.००	२०७६/७७
२	कास्की	भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश	२९.००	२०७६/७७
		जम्मा	७०	
१	गोरखा	फिलिम स्वास्थ्य चौकी, चुनुम्ब्री	६	२०७८/७९

क्र.स.	जिल्ला	कार्यालयको नाम	क्षमता (कि.वा.)	आ.व.
२	गोरखा	श्री ज्ञानमार्ग माध्यमिक विद्यालय, गण्डकी गा. पा.-७	२	२०७८/७९
३	गोरखा	अमरज्योति जनता माध्यमिक विद्यालय, पालुंगटार न. पा-४	२	२०७८/७९
४	गोरखा	मनकामना बहिरा आवासीय माध्यमिक विद्यालय, गोरखा न. पा-९	२	२०७८/७९
५	नवलपुर	श्री कालिका मा.वि., गैडाकोट	२	२०७८/७९
६	कास्की	यातायात व्यवस्था कार्यालय, पोखरा	१६	२०७८/७९
७	कास्की	पश्चिमांचल क्याम्पस, लामाचौर	२०	२०७८/७९
८	कास्की	ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय	५	२०७८/७९
९	मुस्ताङ	लेते स्वास्थ्य चौकी, लेते	१०	२०७८/७९
१०	मुस्ताङ	खानेपानी जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास सब-डिभिजन कार्यालय, जोमसोम	१०	२०७८/७९
११	मुस्ताङ	पुर्बाधार विकास कार्यालय, जोमसोम	१०	२०७८/७९
१२	मुस्ताङ	चरांग स्वास्थ्य चौकी, चरांग	६	२०७८/७९
१३	मनाङ	खानेपानी जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास सब-डिभिजन कार्यालय, चामे, मनाङ	१०	२०७८/७९
१४	मनाङ	लोकप्रिय मा. वि चामे मनाङ	६	२०७८/७९
		जम्मा	१०७	
१	कास्की	ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय	३०	२०७९/८०
		जम्मा	३०	
१	कास्की	ग्रहौ प्राथमिक अस्पताल, वालिङ न.पा.-९	१५	२०८०/८१
२	गोरखा	आहाल भन्ज्याङ मा.वि.	३	२०८०/८१
		जम्मा	१८	
१	मनाङ	प्रकाश ज्योती मा.वि., नासो-५, थोचे	१२	२०८१/८२
		कूल जम्मा	२३७	

८.३ लघु जलविद्युत मर्मत गरिएका आयोजनाहरू

क्र.सं.	जिल्ला	आयोजना संख्या	क्षमता किलोवाट	कैफियत
१	गोरखा	५	१४५	
२	नवलपुर	२	१४	
३	लम्जुङ्ग	१३	२१५	
४	तनहुँ	०	०	
५	स्याङ्गजा	२	८६	
६	कास्की	०	०	
७	बागलुङ्ग	५५	२५६८	
८	पर्वत	२	४२	
९	म्याग्दी	२	६४	
१०	मुस्ताङ्ग	७	१७५	
११	मनाङ्ग	६	१९७	
	जम्मा	९४	३५०६	

८.४ प्रदेश सरकारबाट सिंचाइ क्षेत्रमा आ.व. २०७५/७६ देखि २०८१/८२ सम्म भएको जिल्लागत उपलब्धी विवरण

जिल्ला	२०७५/७६ को उपलब्धी (हेक्टरमा)				२०७६/७७ को उपलब्धी (हेक्टरमा)				२०७७/७८ को उपलब्धी (हेक्टरमा)				२०७८/७९ को उपलब्धी (हेक्टरमा)			
	नयाँ	कृषक कुलो सुधार	पुनर्स्थापना र सुधार	जम्मा	नयाँ	कृषक कुलो सुधार	पुनर्स्थापना र सुधार	जम्मा	नयाँ	कृषक कुलो सुधार	पुनर्स्थापना र सुधार	जम्मा	नयाँ	कृषक कुलो सुधार	पुनर्स्थापना र सुधार	जम्मा
मनाङ्ग	१०२			१०२	१०४		५८	१६२	१००		७	१०७	५०		१००	१५०
मुस्ताङ्ग	५०		१८९	२३९	७४		७४	१४८					२९२		४९	३४१
म्याग्दी					३२	३२	५०	११४	४६	३२	३४	११२	४८	५	८०	१३३
बागलुङ्ग					६५	४०	२८	१३३	१५	७०	१६५	२५०		१३७	२	१३९
पर्वत	५५	६५६	६६५	१३७६	३०	२५६	२२०	५०६	२४९	४६३	९७७	१६८९		३५५		३५५
कास्की			१०३	१०३	६६	५	६०	१३१	३५		२३८	२७३	४५	५१०	६५	६२०
स्याङ्गजा						२२३		२२३	४९	२४५	१८०५	२०९९	६५	३४४	२९३	७०२
नवलपुर	२२४		१५	२३९	२३९		१३६८	१६०७	४५१		७७८	१२२९	३४६		८९२	१२३८
तनहुँ	२२			२२	६	१९१		१९७	१२६	२७	३७६	५२९	५५	१४३	१४२	३४०
लमजुङ्ग			२२०	२२०	२८			२८	९४	१२१	६४	२७९	६५	१०६	४३	२१४
गोरखा	३२			३२	८९		८४	१७३	३७७	०	६५३	१०३०	८७	७१	१३१	२८९
जम्मा	४८५	६५६	११९२	२३३३	७३३	७४७	१९४२	३४२२	१५४२	९५८	५०९७	७५९७	१०५३	१६७१	१७९७	४५२१
भूमिगत	१३६			१३६	२३९		५	२४४	४५१		२८	४७९	३४६		२०	३६६
कूल जम्मा	६२२	६५६	११९२	२४७०	९७२	७४७	१९४७	३६६६	१९९३	९५८	५१२५	८०७६	१३९९	१६७१	१८१७	४८८७

जिल्ला	२०७९/८० को उपलब्धी (हेक्टरमा)				२०८०/८१ को उपलब्धी (हेक्टरमा)				२०८१/८२ को वार्षिक उपलब्धी (हेक्टरमा)				हालसम्मको उपलब्धी (हेक्टरमा)			
	नयाँ	कृषक कुलो सुधार	पुनर्स्थापना र सुधार	जम्मा	नयाँ	कृषक कुलो सुधार	पुनर्स्थापना र सुधार	जम्मा	नयाँ	कृषक कुलो सुधार	पुनर्स्थापना र सुधार	जम्मा	नयाँ	कृषक कुलो सुधार	पुनर्स्थापना र सुधार	जम्मा
मनाङ्ग	११४			११४	५४	३५	३०	११९	७५			७५	५९९	३५	१९५	८२९
मुस्ताङ्ग	१२७	२७	२५	१७९	७	१२५	१	१३३		४७		४७	५५०	१९९	३३८	१०८७
म्याग्दी	५४	५	२९	८८	१४	७५		८९	१०	४०		५०	२०४	१८९	१९३	५८६
बाग्लुङ्ग	४३	१०३	१३३	२७९	१८९	१२८	३३	३५०	३२	३४	१५	८१	३४४	५१२	३७५	१२३१
पर्वत	१७	२५७	३०	३०४	४५	९६	१२८	२६९	५३	९९१		१०४४	४४९	३०७४	२०२०	५५४३
कास्की	४५	४८	१८०	२७३	३५	१८६३		१८९८		४००	१९१०	२३१०	२२६	२८२६	२५५६	५६०८
स्याङ्गजा	८९	८६१	१४१०	२३६०			३४०	३४०		१९४	८१	२७५	२०३	१८६७	३९२९	५९९९
नवलपुर	१६८		१३०१	१४६९	२३	५१	९८३	१०५७	४१	४१४	८१७	१२७२	१४९२	४६५	६१५४	८१११
तनहुँ	९५	५८	१०४	२५७	२७	५०	१५०	२२७	४			४	३३५	४६९	७७२	१५७६
लमजुङ्ग	१०५	९०	७०	२६५	२५	५०	२०	९५		१३८	३३४	४७२	३१७	५०५	७५१	१५७३
गोरखा	३८	६७२	५०	७६०	५०	५००		५५०	४५	११४	२४	१८३	७१८	१३५७	९४२	३०१७
जम्मा	८९५	२१२१	३३३२	६३४८	४६९	२९७३	१६८५	५१२७	२६०	२३७२	३१८१	५८१३	५४३७	११४९७	१८२२५	३५१५९
भूमिगत	२११		६७	२७८	२७५		१५	२९०	५५७			५५७	२२१५		१३५	२३५०
कूल जम्मा	११०६	२१२१	३३९९	६६२६	७४४	२९७३	१७००	५४१७		२३७२	३१८१	६३७०	७६५२	११४९७	१८३६०	३७५१०

८.५ प्रदेश सरकारबाट नदी व्यवस्थापन क्षेत्रमा आ.व. २०७५/७६ देखि २०८१/८२ सम्म भएको जिल्लागत उपलब्धी विवरण

जिल्ला	२०७५/७६ को उपलब्धी			२०७६/७७ को उपलब्धी			२०७७/७८ को उपलब्धी			२०७८/७९ को उपलब्धी		
	तटबन्ध निर्माण (कि.मि.)	जग्गा उकास (हे.)	संरचना निर्माण (वटा)	तटबन्ध निर्माण (कि.मि.)	जग्गा उकास (हे.)	संरचना निर्माण (वटा)	तटबन्ध निर्माण (कि.मि.)	जग्गा उकास (हे.)	संरचना निर्माण (वटा)	तटबन्ध निर्माण (कि.मि.)	जग्गा उकास (हे.)	संरचना निर्माण (वटा)
मनाङ्ग	१.३२	०	०	२.६८	३५	८	२.८६	२४	०	१.४०	२०	०
मुस्ताङ्ग	१.५५	५	१८	२.१४	११	०	०.७८	३५	०	०.३४	६८	०
म्याग्दी	०.९२	०	०	१.५१	२	०	०.३२	१	०	०.७८	०	०
बागलुङ्ग	१.५७	०	०	२.६६	५	०	१.५३	२	४	१.२३	३	०
पर्वत	३.३३	२४	६१	१.२३	२७	७५	०.९८	१५	३	१.०९	२२	४
कास्की	०.००	०	०	२.५६	११६	११	१.८१	१७	३२	१.११	४२	२३
स्याङ्गजा	०.००	०	०	६.१०	०	०	३.३४	५४	४	१.९०	०	०
नवलपुर	३.५४	८	१२९	१.६१	२७	२६	१.४८	३२	४	२.००	०	९
तनहुँ	२.७९	५५	३४	४.१६	३४	१६०	१.०३	१०	१४	१.५९	३०५	३१
लमजुङ्ग	०.७१	१०५	४५	०.८०	४	४१	०.६०	१५	२८	०.८५	४१	२६
गोरखा	३.८७	०	२८	०.९६	४४०	१४	९.०४	१२१६	१६४	२.५८	२००	१३
जम्मा	१९.६०	१९७	३१५	२६.४०	७००	३३५	२३.७६	१४२०	२५३	१४.८६	७०१	१०६

जिल्ला	२०७९/८० को उपलब्धी			२०८०/८१ को उपलब्धी			२०८१/८२ को उपलब्धी			हालसम्मको उपलब्धी		
	तटबन्ध निर्माण (कि.मि.)	जग्गा उकास (हे.)	संरचना निर्माण (वटा)	तटबन्ध निर्माण (कि.मि.)	जग्गा उकास (हे.)	संरचना निर्माण (वटा)	तटबन्ध निर्माण (कि.मि.)	जग्गा उकास (हे.)	संरचना निर्माण (वटा)	तटबन्ध निर्माण (कि.मि.)	जग्गा उकास (हे.)	संरचना निर्माण (वटा)
मनाङ्ग	०.५५	३०		१	२५	०	०.२८	०.००	०.००	९.६४	१३३.५०	८.००
मुस्ताङ्ग	०.९६	३	१	२	६	०	२.५९	१२.८०	०.००	९.९५	१४०.८०	१९.००
म्याग्दी	०.६९			१	७	०	१.५५	३.००	०.००	६.६३	१२.००	०.००
बाग्लुङ्ग	२.८३	११	५	१	०	०	०.५९	०.००	०.००	११.७१	२१.००	९.००
पर्वत	१.८८		३०	०	०	०	०.५२	०.००	०.००	९.०३	८७.५०	१७३.००
कास्की	३.७०	२	२०	२	०	०	१.६२	४.८०	०.००	१२.५९	१८०.९०	८६.००
स्याङ्गजा	३.६०	३७		१	०	०	०.४८		०.००	१६.२१	९०.९०	४.००
नवलपुर	३.९८		७	४	७६	०	२.४७	२.५०	०.००	१८.९०	१४५.८०	१७५.००
तनहुँ	३.४१	२५	८	१	३४	०	१.९८	२७.००	०.००	१६.११	४९०.२५	२४७.००
लमजुङ्ग	०.७१	२३	१५	१	१०	०	०.७४	०.००	०.००	५.०३	१९८.३०	१५५.००
गोरखा	२.३०	२०	१४	२	१९	०	१.४०	७.८०	०.००	२२.२०	१९०२.८०	२३३.००
जम्मा	२४.६२	१५०	१००	१५	१७८	०	१४.२२	५७.९०	०.००	१३७.९७	३४०३.७५	११०९

९. बहुवर्षीय खरिदको स्रोत सुनिश्चिता /स्रोत सहमति लिइएका आयोजनाहरूको अध्यावधिक विवरण

क. खानेपानी क्षेत्र (रु. हजारमा)

क्र. सं.	कार्यक्रम/ आयोजनाको नाम	जिल्ला	स्रोत सुनिश्चित/सहमति रकम	स्रोत सुनिश्चित मिति	सम्झौता मिति	सम्झौता रकम	खर्चको विवरण		हालसम्मको प्रगति %		२०८२/८३ को विनियोजन	बाँकी दायित्व	कैफियत
							२०८१/८२ को खर्च	२०८१/८२ सम्मको कुल खर्च	वित्तीय	भौतिक			
	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, स्याङ्गजा												
	आ.व. २०८१/८२ मा सम्पन्न भएका योजना												
१	कालीखोला खानेपानी आयोजना मर्मत	कास्की	२५००	२०८१-११-२६	२०८१/०८२	३०००	१९००	२९००	६२.६१	६३.६१	०		सम्पन्न
२	भालुखोला लामिछाने गाँउ खानेपानी योजना पोखरा २८ बेगनाश	कास्की	२५००	२०८१-११-२६	२०८१/०८२	५१००	१४०५	५००५	४२.४१	४४.४१	०		सम्पन्न
३	मूर्य खोला खानेपानी आयोजना	कास्की	१८००	२०८१-११-२६	२०८१/०८२	३२००	११९९	३१९९	४३.६७	४६.६७	०		सम्पन्न
	सम्पन्न हुन बाँकी रहेका योजनाहरू												
४	लुकुस्वारा पुल्चोक खा.पा.आ.	कास्की	२०००	२०८१-११-२६	२०८१/०८२	३०००	९५२	१९४२	४२.२२	४५.२२	१०००		सम्पन्न हुने
५	देउतीमूल खोलाको डिल अर्घोवेशी खा.पा आ.	कास्की	२०००	२०८१-११-२६	२०८१/०८२	३९००	९९७	२९९७	४५.४१	५३.४१	९००		सम्पन्न हुने
६	कमरे चण्डी लिफ्टङ्ग खानेपानी योजना, कास्की	कास्की	३०००	२०८१-११-२६	२०८१/०८२	४८००	१५००	३५००	३३.३३	३९.३३	११००	२००	सम्पन्न नहुने
७	गैरी भलाम खानेपानी योजना ,	कास्की	३०००	२०८१-११-२६	२०८१/०८२	३६००	२२९५	३२९५	७०.४१	७७.४१	३००		सम्पन्न हुने
८	तितेपानी सिद्धार्थटोल खानेपानी योजना ,	कास्की	३०००	२०८१-११-२६	२०८१/०८२	२९००	९९८	१९९८	२७.०७	३२.०७	८००	१०२	सम्पन्न नहुने
९	जुम्लेटी खहरे खोला खानेपानी योजना,	कास्की	३०००	२०८१-११-२६	२०८१/०८२	३७००	१९९८	२६१८	५१.०३	५९.०३	१०००		सम्पन्न हुने
१०	माछापुच्छ्रे गा पा ९, प्रम्धु, तक्रो खानेपानी योजना	कास्की	३०००	२०८१-११-२६	२०८१/०८२	१२२००	१४३८	११११४	३१.७९	४०.७९	१०००		सम्पन्न हुने
११	अलैंचेबारी- सानोभीर-समिबगर-लाहाचोक खानेपानी निर्माण,	कास्की	४०००	२०८१-११-२६	२०८१/०८२	५१००	९९९	२५९४	१६.७६	२३.७६	२५००		सम्पन्न हुने

क्र. सं.	कार्यक्रम/ आयोजनाको नाम	जिल्ला	स्रोत सुनिश्चित/सहमति रकम	स्रोत सुनिश्चित मिति	सम्झौता मिति	सम्झौता रकम	खर्चको विवरण		हालसम्मको प्रगति %		२०८२/८३ को विनियोजन	बाँकी दायित्व	कैफियत
१२	कुर गाउँ खानेपानी योजना,	कास्की	३५००	२०८१-११-२६	२०८१/०८२	६०००	२०००	४८६४	३५.१४	३९.१४	१०००	१३६	सम्पन्न नहुने
१३	चैनपुर खानेपानी ट्याङ्की मर्मत पोखरा २३	कास्की	४०००	२०८१-११-२६	२०८१/०८२	१२५००	१४९३	११३८७	२५.३४	३०.३४	१०००	११३	सम्पन्न नहुने
१४	गैहाथोक - भिरकटेरी खानेपानी योजना ,	कास्की	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/०८२	५१००	१९९९	३९९९	४६.५०	५०.५०	१०००	१०१	सम्पन्न नहुने
१५	ठुली पोखरी खानेपानी मर्मत तथा निर्माण योजना,	कास्की	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/०८२	४७००	१९९९	३९९३	४९.१२	५४.१२	१४००	१०७	सम्पन्न नहुने
१६	उपल्लो काउरे खानेपानी योजना	कास्की	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/०८२	९९००	२७९३	७६७३	४२.५९	४७.५९	२१००	१२७	सम्पन्न नहुने
१७	खुपेखोला खा.पा.आ. माछापुच्छ्रे ६ कास्की	कास्की	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/०८२	२३३००	३५००	१९७५६	१८.०६	२२.०६	३३००	२४४	सम्पन्न नहुने
१८	काउरोट खानेपानी योजना	कास्की	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/०८२	८२००	१४९८	४६८१	१४.०८	१८.०८	३४००	११९	सम्पन्न नहुने
१९	गगनगौडा भू.पू. खा.पा.आ. पो.म.न.पा.कास्की	कास्की	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/०८२	२५३००	२५००	२३७३३	५४.४८	५८.४८	१४००	१६७	सम्पन्न नहुने
२०	माथिलो गुढीखोला खा.पा.	स्यांगजा	१२५०	२०८१-११-२६	२०८१/०८२	२५००	१२४६	२२३२	५३.६०	६१.६०	२००		सम्पन्न हुने
२१	कराड्दी मसार लि.खा.पा. कालीगण्डकी २	स्यांगजा	१५००	२०८१-११-२६	२०८१/०८२	४५००	६४४	३८५४	४२.५३	४३.५३	३५०	२९६	सम्पन्न नहुने
२२	मगरे लामडाँडा खा.पा. चापाकोट १	स्यांगजा	१५००	२०८१-११-२६	२०८१/०८२	६०००	१०००	५२९८.५४६	४५.५१	४८.५१	५००	२०१.४५४	सम्पन्न नहुने
२३	जुकेपानी खानेपानी योजना	स्यांगजा	२०००	२०८१-११-२६	२०८१/०८२	६०००	१५१०	५०८०	४२.११	४५.११	८००	१२०	सम्पन्न नहुने
२४	सानो खोल्सा खानेपानी योजना	स्यांगजा	२०००	२०८१-११-२६	२०८१/०८२	२६००	९९१	१९९०	७.६६	११.६६	५००	११०	सम्पन्न नहुने
२५	कादुरी खानेपानी योजना	स्यांगजा	२५००	२०८१-११-२६	२०८१/०८२	३६००	१७९६	२७४८	५६.१८	६२.१८	७००	१५२	सम्पन्न नहुने
२६	बसेनी खानेपानी योजना	स्यांगजा	३०००	२०८१-११-२६	२०८१/०८२	४७००	१०००	२५९९	१९.६३	२५.६३	१९००	२०१	सम्पन्न नहुने
२७	बाटुले वायढुंगा खानेपानी योजना	स्यांगजा	३०००	२०८१-११-२६	२०८१/०८२	१२०००	२४५२	११५१४	३१.९२	३५.९२	३००	१८६	सम्पन्न नहुने
२८	चिसापानी बजार स्कुल टोल खा.पा.आ,	स्यांगजा	२५००	२०८१-११-२६	२०८१/०८२	४५००	१४३८	३४३५	६.७०	७.७०	९००	१६५	सम्पन्न नहुने
२९	ढाक्रेबास भाटखोला खा.पा.आ. फेदीखोला स्याङजा	स्यांगजा	३५००	२०८१-११-२६	२०८१/०८२	४००००	१६००	३६५४४	५८.९५	५९.९५	२१००	१३५६	सम्पन्न नहुने
३०	धराड्दी सान्थुम्का खानेपानी योजना खानेपानी तथा सरसफाई संरचना निर्माण)	स्यांगजा	४०००	२०८१-११-२६	२०८१/०८२	७५००	१७८९	४४८९	२७.६४	२८.६४	२७००	३११	सम्पन्न नहुने

क्र. सं.	कार्यक्रम/ आयोजनाको नाम	जिल्ला	स्रोत सुनिश्चित/सहमति रकम	स्रोत सुनिश्चित मिति	सम्झौता मिति	सम्झौता रकम	खर्चको विवरण		हालसम्मको प्रगति %		२०८२/८३ को विनियोजन	बाँकी दायित्व	कैफियत
३१	डाडास्वौरा लिफ्टड खानेपानी आयोजना	स्यांगजा	३५००	२०८१-११-२६	२०८१/०८२	७६००	९९५	५०६९	२७.५५	३१.५५	२४००	१३१	सम्पन्न नहुने
३२	सुमेखोला डिहीकुना खानेपानी योजना	स्यांगजा	४०००	२०८१-११-२६	२०८१/०८२	४६००	१८४९	३३४९	३४.७५	४०.७५	११००	१५१	सम्पन्न नहुने
३३	पिपलडाँडा खानेपानी आयोजना	स्यांगजा	४०००	२०८१-११-२६	२०८१/०८२	८१००	१०००	५१७५.४३१	२४.३५	३१.३५	२८००	१२४.५६९	सम्पन्न नहुने
३४	खहरे खानेपानी योजना	स्यांगजा	४०००	२०८१-११-२६	२०८१/०८२	७५००	२७४३	४३३४	३६.९८	३८.९८	२९००	२६६	सम्पन्न नहुने
३५	अलैची खा.पा.आ.	स्यांगजा	४०००	२०८१-११-२६	२०८१/०८२	५१००	२०००	३०००	८.४०	१४.४०	१९००	२००	सम्पन्न नहुने
३६	ढावा अर्चलबोट खानेपानी पु.व.न.पा. ७ ठुलाडी	स्यांगजा	४०००	२०८१-११-२६	२०८१/०८२	६०००	१०००	३४९६	१६.४८	१७.४८	२४००	१०४	सम्पन्न नहुने
३७	छिस्ती किपट खा पा आ का	स्यांगजा	३५००	२०८१-११-२६	२०८१/०८२	९३००	९९९	६६०६	९२.१२	९६.५०	२४००	२९४	सम्पन्न नहुने
३८	घोप्ते खिद्रोपाखा खानेपानी योजना विरुवा-४ स्याङ्जा ११.४.१६.१५२८ एकिकृत दारा बेसारडाँडा लिफ्टङ्ग खानेपानी आयोजना विरुवा-२ स्याङ्जा	स्यांगजा	३५००	२०८१-११-२६	२०८१/०८२	४५००	१०००	२०००	६७.५९	७२.६६	२४००	१००	सम्पन्न नहुने
३९	खाल्टे थापाथर तल्लोछहरे खा.पा.आ.	स्यांगजा	४०००	२०८१-११-२६	२०८१/०८२	१२०००	९९९	८६७९	३४.४०	४२.४०	२८००	५२१	सम्पन्न नहुने
४०	चापटारी खा.पा.आ. भिरकोट स्याङ्जा	स्यांगजा	४०००	२०८१-११-२६	२०८१/०८२	१५०००	७३४	१२२०७.४१८	३८.०१	४४.०१	२४००	३९२.५८२	सम्पन्न नहुने
४१	देउदरखोला खा.पा.आ. बालिङ ६ स्याङ्जा	स्यांगजा	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/०८२	१५५००	२०००	१२३००.७२६	४८.०९	५१.०९	२९००	२९९.२७४	सम्पन्न नहुने
४२	विर्घा खा.पा.आ. कालिगणडकी विर्घा ४ स्याङ्जा	स्यांगजा	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/०८२	१०५००	९९३	७०९४	३१.३१	३४.३१	३०००	४०६	सम्पन्न नहुने
४३	पेरेकेटरी सालघार खानेपानी योजना	स्यांगजा	४५००	२०८१-११-२६	२०८१/०८२	६२००	१०००	२५००	२०.५२	२१.५२	३४००	३००	सम्पन्न नहुने
४४	जुगेपानी खानेपानी योजना	स्यांगजा	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/०८२	६८००	१८६४	२८६२	३८.७८	४६.७८	३८००	१३८	सम्पन्न नहुने
४५	पोखरीछाप खा.पा. चापाकोट १	स्यांगजा	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/०८२	१००००	२९९९	५९९२	४४.५५	५१.५५	३९००	१०८	सम्पन्न नहुने
४६	झाक्रेपानी खा.पा. (क) चापाकोट ७	स्यांगजा	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/०८२	१४२००	१६९६	१०१९६	४८.३०	५४.३०	३९००	१०४	सम्पन्न नहुने
४७	लेडि गैरा चराङ्ग खा.पा. भिरकोट ९	स्यांगजा	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/०८२	७५००	१४४७	३९४३	२८.४५	३०.४५	३४००	१५७	सम्पन्न नहुने
४८	बराल गाउँ खानेपानी योजना	स्यांगजा	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/०८२	७०००	२९९९	३९९८	४५.८०	५१.८०	२९००	१०२	सम्पन्न नहुने

क्र. सं.	कार्यक्रम/ आयोजनाको नाम	जिल्ला	स्रोत सुनिश्चित/सहमति रकम	स्रोत सुनिश्चित मिति	सम्झौता मिति	सम्झौता रकम	खर्चको विवरण		हालसम्मको प्रगति %		२०८२/८३ को विनियोजन	बाँकी दायित्व	कैफियत
४९	दुम्सीखोला माथिल्लो चियरे खा.पा.आ.	स्यांगजा	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/०८२	२१२००	१५००	१७७७५.१७४	६७.८४	७७.८४	३३००	१२४.८२६	सम्पन्न नहुने
५०	कुन्चेबारी ठुला काउले मुसुर बारी खानेपानी आयोजना	स्यांगजा	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/०८२	८७००	९७८	४६६९.७२९	१५.१५	१६.१५	३९००	१३०.२७१	सम्पन्न नहुने
५१	भोर्ले लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना	स्यांगजा	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/०८२	७५००	१०००	३४८१	११.१४	२०.१४	३९००	११९	सम्पन्न नहुने
५२	काफलटारी मडुवा पोखराचौर थुम टापु खा.पा.आ	स्यांगजा	४५००	२०८१-११-२६	२०८१/०८२	१६५००	१०००	१३०६१	३०.८२	३५.८२	३४००		सम्पन्न हुने
५३	भुदुङ्ग पिपल पातीखोला कल्लीडाँडा विमिराबोट छापा सेरा खा.पा.आ. आँधीखोला स्याङजा	स्यांगजा	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/०८२	२०५००	१९९९	१६६७८.६८८	३८.६५	४५.६५	३८००	२१.३१२	सम्पन्न नहुने
५४	गल्यांग बजार ढल निर्माण आयोजना गल्यांग ३, तल्लो गल्यांग बजार ढल निकास योजना गल्यांग ३	स्यांगजा	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/०८२	१४५००	१९९३	१०४३२	२४.८०	२८.८०	३९००	१६८	सम्पन्न नहुने
५५	पखेरो गाउँ खा.पा.आ. भिरकोट ८	स्यांगजा	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/०८२	८१००	१०००	४०५८	२२.३८	२७.३८	३९००	१४२	सम्पन्न नहुने
५६	गल्यांग ख.पा.आ. गल्यांग २,३,८	स्यांगजा	४५००	२०८१-११-२६	२०८१/०८२	२१७००	९९४	१८११९	४२.९०	५१.९०	३४००	१८१	सम्पन्न नहुने
५७	तमाखुबारी खा.पा.आ.	स्यांगजा	४५००	२०८१-११-२६	२०८१/०८२	७२००	१०००	३८३४	२१.०६	२५.०६	३२००	१६६	सम्पन्न नहुने
५८	आरखोदी 'क' खा. पा. आ., कालिगण्डकी २	स्याङ्गजा	३५००	२०८१-११-२६	२०८१/०८२	५५००	१०००	३५००	२२.९१	२८.९१	१९००	१००	सम्पन्न नहुने
५९	गिल्लाङ्ग खा. पा. आ., चापाकोट ५	स्याङ्गजा	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/०८२	६८००	२०००	३५००	२७.३४	३१.३४	३२००	१००	सम्पन्न नहुने
६०	फेरेगौतमतोल खा.पा.आ., चापाकोट ६	स्याङ्गजा	४५००	२०८१-११-२६	२०८१/०८२	९०००	१९६१	५७४९	३६.१६	४२.१६	३१५०	१०१	सम्पन्न नहुने
६१	उपल्लो पेखु खा.पा.आ., बालिंग १२	स्याङ्गजा	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/०८२	४१८००	४५५	३८१४९	७६.९३	७९.९३	३५००	१५१	सम्पन्न नहुने
	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय बागलुंग												
६२	मलादी आठबिसे खानेपानी योजना, कु.न.पा-०९, पर्वत	पर्वत	३५८३	२०८२-०१-२६	२०८१/८२	२६२३	१८०४	१८०४.०६	५०.३५	६४.००	७००	११९	सम्पन्न नहुने
६३	पशुपति मावि राम्जा खानेपानी आयोजना मोदी ७,८ र कुश्मा ११ पर्वत	पर्वत	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	४६२५	४१९९	४१९९.२८७	८३.९९	८५.००	४००		सम्पन्न हुने
६४	पार्ककुना खानेपानी आयोजना, पर्वत	पर्वत	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	४५००	३३००	३२९९.६२४	६५.९९	७७.००	१०००	२००	सम्पन्न नहुने

क्र. सं.	कार्यक्रम/ आयोजनाको नाम	जिल्ला	स्रोत सुनिश्चित/सहमति रकम	स्रोत सुनिश्चित मिति	सम्झौता मिति	सम्झौता रकम	खर्चको विवरण		हालसम्मको प्रगति %		२०८२/८३ को विनियोजन	बाँकी दायित्व	कैफियत
६५	भोर्ले खानेपानी आयोजना	पर्वत	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	४६४२	१९९९	१९९९.०३३	३९.९८	५१.००	२४००	२४३	सम्पन्न नहुने
६६	खोल्सीधारा धोलेचौर पम्पिंग खानेपानी योजना	बागलुंग	१९९४	२०८१-११-२६	२०८१/८२	२४९४	१८९७	१८९६.८७३	९५.१३	९५.००	५००		सम्पन्न हुने
६७	गैरी जोत्ने रुम्टा पम्पिंग खानेपानी योजना	बागलुंग	२९८४	२०८१-११-२६	२०८१/८२	२२९९	२२९९	२२९८.५४२	७७.०३	१००.००	०		सम्पन्न हुने
६८	बागलुङ निसीखोला खानेपानी योजना बा न पा १०	बागलुंग	३९७६	२०८१-११-२६	२०८१/८२	३९७६	२८००	२७९९.९३३	७०.४२	८६.००	११००		सम्पन्न हुने
६९	पातले खानेपानी आयोजना तमानखोला गा.पा ६	बागलुंग	३९७९	२०८१-११-२६	२०८१/८२	२०८५	१७७७	१७७७.४०५	४४.६७	७६.००	१७००		सम्पन्न हुने
७०	करुजे पानी कुडहर लिफ्टिंग खानेपानी योजना	बागलुंग	३९९४	२०८१-११-२६	२०८१/८२	३९९४	२६९९	२६९८.६२५	६७.५७	७८.००	१२००		सम्पन्न हुने
७१	ताराखोला खानेपानी आयोजना ताराखोला ४, ५ बागलुङ	बागलुंग	३९८१	२०८१-११-२६	२०८१/८२	२९८८	२६८१	२६८१.३६	६७.३५	१००.००	२००		सम्पन्न हुने
७२	जलजला लिफ्टिंग खानेपानी आयोजना	बागलुंग	३९८२	२०८१-११-२६	२०८१/८२	३९८२	२७९९	२७९९.४४१	७०.३०	८२.००	११००		सम्पन्न हुने
७३	हल्पुखोला खानेपानी आयोजना बागलुङ	बागलुंग	४०९९	२०८१-११-२६	२०८१/८२	३४३१	१७१२	१७१२.३८३	४१.७८	४३.००	१५००	२१९	सम्पन्न नहुने
७४	बुर्तिवाङ २,३ पम्पीङ्ग खा.पा.आ.	बागलुंग	४९८८	२०८१-११-२६	२०८१/८२	४४८८	२६५०	२६४९.९१२	५३.१३	५७.००	१८००		सम्पन्न हुने
७५	लेखानी खानेपानी आयोजना	बागलुंग	४९९५	२०८१-११-२६	२०८१/८२	४७९५	४४९९	४४९८.६५४	९०.०६	९३.००	२००		सम्पन्न हुने
७६	पाण्डवखानी ढुङ्गेला खानेपानी योजना, गलकोट-१०	बागलुङ	४९३६	२०८२-०१-२६	२०८१/८२	४९३६	३०४९	३०४९.००४	६१.७७	८५.००	१७००	१८७	सम्पन्न नहुने
७७	हेमु खण्टेरिबाङ सोरबोट रिभरबोट खापा, ढोरपाटन -१	बागलुङ	४५१६	२०८२-०१-२६	२०८१/८२	३१५	२११	२११.०८९	४.६७	३६.००	१००		सम्पन्न हुने
७८	बर्नेदारा सिरुखर्क खानेपानी योजना, बडिगाड-४	बागलुङ	२३८१	२०८२-०१-२६	२०८१/८२	२३८१	१५९९	१५९८.९६४	६७.१६	९४.००	५००	२८२	सम्पन्न नहुने
७९	छापा दलित बस्ति खानेपानी योजना, काठेखोला-१, बागलुङ	बागलुङ	३९६८	२०८२-०१-२६	२०८१/८२	३९६८	२६४८	२६४७.५	६६.७२	७२.००	१६००		सम्पन्न हुने
८०	धौलागिरी बहुमुखी क्याम्पस, बागलुङमा खानेपानी व्यवस्थापन (बोर्ड प्रणाली) कार्यक्रम, बा.न.पा -२	बागलुङ	४४९०	२०८२-०१-२६	२०८१/८२	४४९०	२१५०	२१४९.९२९	४७.८८	५४.००	१९००	४४०	सम्पन्न नहुने
८१	घुस्मेली खानेपानी योजना,ताराखोला गा.पा -०३, बागलुङ	बागलुङ	४९९७	२०८२-०१-२६	२०८१/८२	३७९७	३६९७	३६९७.१७८	७३.९९	९३.००	१००		सम्पन्न हुने
	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन												

क्र. सं.	कार्यक्रम/ आयोजनाको नाम	जिल्ला	स्रोत सुनिश्चित/सहमति रकम	स्रोत सुनिश्चित मिति	सम्झौता मिति	सम्झौता रकम	खर्चको विवरण		हालसम्मको प्रगति %		२०८२/८३ को विनियोजन	बाँकी दायित्व	कैफियत
	कार्यालय,तनहुँ												
	आ.व. २०८१/८२ मा सम्पन्न भएका योजना												
८२	भैरवस्थान खानेपानी आयोजना, म्याग्दे-०५, तनहुँ	तनहुँ	२५००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	२५००	२३८६	२३८६	९०.००	१००.००	०		सम्पन्न हुने
८३	जलजले खानेपानी आयोजना भानु - २	तनहुँ	३८००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	३२०५	३२०५	१७३०४	८५.००	९५.००	०		सम्पन्न हुने
८४	बगरखोला लिफ्टिङ्ग खानेपानी म्याग्दे ६ सर्वलाड तनहुँ	तनहुँ	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/१२/११	५०००	५०००	८१६५	९५.००	१००.००	०		सम्पन्न हुने
	सम्पन्न हुन बाँकी रहेका योजनाहरू												
८५	राम्चे डिही पातीघारी खानेपानी योजना, व्यास ११ तनहुँ	तनहुँ	३०००	२०८१-११-२६	२०८१/०४/२०	२०००	२०००	३५००	७९.००	८४.००	१०००		सम्पन्न हुने
८६	बोहरा गाउँ कुमाल गाउँ खा.पा.आ.	तनहुँ	३८००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	४७९०	४७८४	१६०५७	६९.००	८५.००	८००		सम्पन्न हुने
८७	चुँदी कुमाल गाउँ खानेपानी आयोजना भानु - ४	तनहुँ	३८००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	२९६०	३७८६	२०१०३	८७.००	९५.००	८००		सम्पन्न हुने
८८	किलचोक खानेपानी योजना, म्याग्दे-३	तनहुँ	३८००	२०८१-११-२६	२०८१/११/२५	२९६०	२९६०	५२९७	७५.००	९५.००	८००		सम्पन्न हुने
८९	देउराली मलायडाँडा खानेपानी योजना, व्यास ६ तनहुँ, देउराली खानेपानी योजना, व्यास ६ तनहुँ	तनहुँ	३८००	२०८१-११-२६	२०८१/०९/०२	४०००	४०००	६०००	८०.००	८५.००	१८००		सम्पन्न हुने
९०	बरभन्ज्याङ्ग खानेपानी योजना, म्याग्दे-७	तनहुँ	३८००	२०८१-११-२६	२०८१/०९/०२	२०००	१९७६	२९७६	६९.००	७५.००	१८००		सम्पन्न हुने
९१	ढिकुरे खोला लिफ्टिङ्ग खानेपानी ७०० घरधुरी भानु १२	तनहुँ	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/०९/१८	४९९९	४९९९	७२९८	६०.००	७०.००	१०००		सम्पन्न हुने
९२	मर्किचोक खानेपानी आयोजना	तनहुँ	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/१२/११	४०००	४०००	९६४२	७०.००	८०.००	१०००		सम्पन्न हुने
९३	मिलनटार रामथुम्की डिप बोरिङ्ग खानेपानी योजना व्यास ११ तनहुँ	तनहुँ	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	४०००	४०००	६०००	७७.००	८५.००	१०००		सम्पन्न हुने
९४	कुवादी खोला बृहत खानेपानी आयोजना	तनहुँ	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	३०००	३०००	४०००	३५.००	५०.००	१०००		सम्पन्न हुने
९५	कुमालटारी-बोटेगाउँ-हिमपानी-बेलटारी लिफ्ट खानेपानी योजना, व्यास न.पा.१०	तनहुँ	५०००	२०८१-११-२६	२०८२/०१/०८	२९६०	२९६०	४१३९	३५.००	५०.००	२०००		सम्पन्न हुने

क्र. सं.	कार्यक्रम/ आयोजनाको नाम	जिल्ला	स्रोत सुनिश्चित/सहमति रकम	स्रोत सुनिश्चित मिति	सम्झौता मिति	सम्झौता रकम	खर्चको विवरण		हालसम्मको प्रगति %		२०८२/८३ को विनियोजन	बाँकी दायित्व	कैफियत
९६	दुबुङ्ग मौरीबास खानेपानी, ऋषिङ्ग -३, तनहुँ	तनहुँ	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	३१००	३०६१	५०६१	७३.००	८०.००	२५००		सम्पन्न हुने
९७	बनकट्टा गाउँ खानेपानी योजना भानु न.पा. १३	तनहुँ	४५००	२०८१-११-२६	२०८१/०८/२	३९९५	३९९५	७४२४	६०.००	६५.००	१०००		सम्पन्न हुने
९८	मयाखु बेशी हेल्थपोष्ट चोक टुहुरेपसल खानेपानी आयोजना भानु ११	तनहुँ	४५००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	४१००	४०१४	८३८७	८३.००	८५.००	१०००		सम्पन्न हुने
९९	पधेरीखोला खानेपानी योजना म्याग्दे-२ निर्मलवस्ती	तनहुँ	४५००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	२५००	२४९६	८४०५	६४.००	७०.००	२०००		सम्पन्न हुने
१००	उदाउने खानेपानी आयोजना, म्याग्दे ७, जौपानी खानेपानी योजना, म्याग्दे ६ र ७	तनहुँ	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	२५००	३४६७	७२६६	६५.००	७०.००	१५००		सम्पन्न हुने
	आ.व. २०८१/८२ मा सम्पन्न भएका योजना												
१०१	डिप बोरिङ २ वटा, गैडाकोट १४, १५	नवलपुर	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	५०००	५०००	१०४००	७७.००	८५.००	०		सम्पन्न हुने
१०२	अमरापुरी खानेपानी आयोजना (सु. वि.) गैडाकोट, नवलपुर	नवलपुर	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	२१६९४	५०००	१५८९६	४७.००	५५.००	०		सम्पन्न हुने
	सम्पन्न हुन बाँकी रहेका योजनाहरू												
१०३	ओडारे लिफ्ट खानेपानी आयोजना,	नवलपुर	३०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	१९९०	१९८०	१९८०	४१.००	४५.००	५००		सम्पन्न हुने
१०४	झ्यालटुङ्ग डाँडा खानेपानी आयोजना, मध्यविन्दु - ३, १४	नवलपुर	४०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	२०००	१९८८	८०३९	४८.००	५५.००	२०००		सम्पन्न हुने
१०५	कावासोती खानेपानी आयोजना (डिग्री कलेज परिसर), कावासोती - ८	नवलपुर	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	२८२२८	१७०५	१४५०५	४५.००	५०.००	३०००		सम्पन्न हुने
१०६	अग्रयौली खानेपानी आयोजना (सु. वि.) कावासोती - १४, १५, १६,	नवलपुर	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	१९७०५	३४६०	१२८०२	२०.००	२०.००	३०००		सम्पन्न हुने
१०७	रुचाङ्ग वृहद खानेपानी योजना बौदीकाली ४	नवलपुर	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	२०००	४९८८	५९८८	८५.००	८५.००	०		सम्पन्न हुने
१०८	जुम्रेटाडी, पोखेटाडी, गुधखोल्सी खा.पा.आ.- बिनयी त्रिवेणी-४, नवलपुर	नवलपुर	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	३३००	३२५३	९३९९	३६.००	४५.००	१५००		सम्पन्न हुने
१०९	कावासोती - १७ खानेपानी आयोजना कावासोती - १७, नवलपुर	नवलपुर	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	३५००	३५००	१०५६३	३३.००	४०.००	१५००		सम्पन्न हुने

क्र. सं.	कार्यक्रम/ आयोजनाको नाम	जिल्ला	स्रोत सुनिश्चित/सहमति रकम	स्रोत सुनिश्चित मिति	सम्झौता मिति	सम्झौता रकम	खर्चको विवरण		हालसम्मको प्रगति %		२०८२/८३ को विनियोजन	बाँकी दायित्व	कैफियत
११०	नवलपरासी (ब.सू.पू.) जिल्ला अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा मध्यम / उच्चस्तरको खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने	नवलपुर	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	३०००	२९०५	८८८०	४९.००	५५.००	२०००		सम्पन्न हुने
१११	बालुवाडां खानेपानी आयोजना कावासोती - १, नवलपुर	नवलपुर	४८००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	३०००	३०००	६४८३	६७.००	७५.००	१८००		सम्पन्न हुने
११२	प्रगतिनगर खानेपानी आयोजना सुधार विस्तार (बोरिंग)	नवलपुर	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	३५००	३५००	३५००	८१.००	८५.००	३०००		सम्पन्न हुने
११३	डेढगाउँ(पश्चिम-भुलाङ-पूर्वथर सिदेटैरी) लिफ्ट खानेपानी आयोजना, बौदिकाली-२, नवलपुर	नवलपुर	४५००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	३५१५	३५१५	१९८५७	७३.००	८०.००	२०००		सम्पन्न हुने
	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, गोरखा												
११४	रहले खानेपानी आयोजना	गोरखा	२०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	१९२०	१६९८	१६९८	८४.९०		१०००		सम्पन्न हुने
११५	पुरानो मुहान संरक्षण	गोरखा	३०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	३०००	२९८७	२९८७	९९.५७		२०००		सम्पन्न हुने
११६	यमगाउँ ढल निकास योजना धार्चे ५	गोरखा	३०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	२८८०	२१९९	२१९९	७३.३०		१०००		सम्पन्न हुने
११७	घिमिरेथोक खानेपानी आयोजना	गोरखा	३०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	३०००	२९९६	२९९६	९९.८७		२०००		सम्पन्न हुने
११८	सिन्धुरखोला खानेपानी योजना	गोरखा	३०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	३०००	२९९४	२९९४	९९.८०		२०००		सम्पन्न हुने
११९	कुखुरेखोला गिछेखोला खानेपानी आयोजना	गोरखा	३०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	३०००	३९९९	३९९९	१३३.३०		२०००		सम्पन्न हुने
१२०	चोरकाटे बजार खानेपानी आयोजना	गोरखा	३०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	३०००	२९९७	२९९७	९९.९०		१०००		सम्पन्न हुने
१२१	विन्धवासिनी खानेपानी दलितबस्ती गोनपा ३ गोरखा	गोरखा	३०००	२०८१-११-२६	२०८०/८१	३०००	२६३१	२६३१	८७.७०		८००		सम्पन्न हुने
१२२	झौक्रीखोला परिडि पहिटा खानेपानी योजना पा.न.पा ७	गोरखा	२७००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	२७००	२६९५	२६९५	९९.८१		१०००		सम्पन्न हुने
१२३	रातामाटे भदुवार गाउँ खानेपानी योजना आरुघाट गा.पा ८ गोरखा	गोरखा	४०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	४०००	३९९१	३९९१	९९.७८		१०००		सम्पन्न हुने
१२४	सारङ्गेखोला डाँडागाउँ खानेपानी आयोजना	गोरखा	४०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	३८४०	२४९७	२४९७	६२.४३		२०००		सम्पन्न हुने
१२५	बगुवाफेद खानेपानी लिफ्टिङ आयोजना भिमसेन ३	गोरखा	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	४८००	३९९५	३९९५	७९.९०		३०००		सम्पन्न हुने

क्र. सं.	कार्यक्रम/ आयोजनाको नाम	जिल्ला	स्रोत सुनिश्चित/सहमति रकम	स्रोत सुनिश्चित मिति	सम्झौता मिति	सम्झौता रकम	खर्चको विवरण		हालसम्मको प्रगति %	२०८२/८३ को विनियोजन	बाँकी दायित्व	कैफियत
१२६	जवाखोला रोटेपिङ बन्धरटोल खानेपानी योजना	गोरखा	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	५०००	४९९९	४९९९	९९.९८	२५००		सम्पन्न हुने
१२७	धारापानी सापकोटा गाउँ खानेपानी आयोजना	गोरखा	४३००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	४१२८	२२९९	२२९९	५३.४७	१५००		सम्पन्न हुने
१२८	ओखले ताराखसे पम्पिङ खानेपानी स्तरोन्नती भिमसेन थापा २ गोरखा	गोरखा	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	४८००	३६८३	३६८३	७३.६६	२०००		सम्पन्न हुने
१२९	चेपेनदि खानेपानी सम्पन्न योजना	गोरखा	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	४८००	१०००	१०००	२०.००	३०००		सम्पन्न हुने
१३०	बज्रेडाँडा भण्डारथोक खानेपानी आयोजना	गोरखा	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	४८००	२९९९	२९९९	५९.९८	२०००		सम्पन्न हुने
१३१	रातमाटे टंकी निर्माण गो.न.पा २	गोरखा	५०००	२०८१-११-२६	२०८०/८१	४८००	३०००	३०००	६०.००	३०००		सम्पन्न हुने
१३२	देउकोट लगाङ्ग खानेपानी आयोजना	गोरखा	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	४८००	२०००	२०००	४०.००	२०००		सम्पन्न हुने
१३३	अमरज्योति जनता मा .वि. खानेपानी	गोरखा	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	४८००	१९९८	१९९८	३९.९६	१५००		सम्पन्न हुने
१३४	जैसीटार खानेपानी आयोजना	गोरखा	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	५०००	५०००	५०००	१००.००	४०००		सम्पन्न हुने
१३५	धारापानी उखुवारी देउराली सेरा खानेपानी योजना	गोरखा	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	५०००	५०००	५०००	१००.००	४०००		सम्पन्न हुने
१३६	सिमल धारा मगर बस्ती लिफ्टिङ्ग खानेपानी योजना, शहिद लखन गा.पा ०७	गोरखा	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	४८००	३०००	३०००	६०.००	२५००		सम्पन्न हुने
१३७	झार गाउँ सिम्ले खानेपानी आयोजना सिरानचोक ७	गोरखा	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	४८००	४८००	४८००	९६.००	३०००		सम्पन्न हुने
१३८	मुसेखोला, दमैडाँडा नयाँबस्ती खानेपानी आयोजना सिरानचोक गाउँपालिका वडा नं ६	गोरखा	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	४८००	११५०	११५०	२३.००	२०००		सम्पन्न हुने
१३९	फलाम गैरि खानेपानी आयोजना	गोरखा	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	५०००	४९९८	४९९८	९९.९६	२५००		सम्पन्न हुने
१४०	लप्सेली गाउँ स्याल डाँडा खानेपानी आयोजना सिरानचोक ६	गोरखा	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	५०००	४९९०	४९९०	९९.८०	३०००		सम्पन्न हुने
१४१	काहुनडाँडा केराबारी पिप्ले बगैँचा खानेपानी योजना	गोरखा	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	४८००	४७९९	४७९९	९५.९८	२३००		सम्पन्न हुने
१४२	कदमपानी भिमसेनस्थान खानेपानी योजना, गण्डकी गा.पा. ८	गोरखा	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	५०००	४९९८	४९९८	९९.९६	४०००		सम्पन्न हुने

क्र. सं.	कार्यक्रम/ आयोजनाको नाम	जिल्ला	स्रोत सुनिश्चित/सहमति रकम	स्रोत सुनिश्चित मिति	सम्झौता मिति	सम्झौता रकम	खर्चको विवरण		हालसम्मको प्रगति %		२०८२/८३ को विनियोजन	बाँकी दायित्व	कैफियत
१४३	ठूलो पधरो मर्मत संभार तथा मुहान संरक्षण भिमसेन थापा २ गोरखा	गोरखा	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	५०००	४९९८	४९९८	९९.९६		३०००		सम्पन्न हुने
१४४	बराहधारा निर्माण मुल संरक्षण गो.न.पा ८	गोरखा	५०००	२०८१-११-२६	२०८०/८१	४८००	२९८९	२९८९	५९.७८		३०००		सम्पन्न हुने
१४५	नयाकुवा खानेपानी निर्माण योजना भिमसेन थापा ४ गोरखा	गोरखा	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	४८००	४३००	४३००	८६.००		३०००		सम्पन्न हुने
१४६	ठाडी खोल्सी ठुलो स्वारा फुलबारी खानेपानी आयोजना सिरानचोक ५	गोरखा	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	५०००	४९९३	४९९३	९९.८६		३०००		सम्पन्न हुने
१४७	तिनधारे लिफ्टिङ्ग खानेपानी योजना, शहिद लखन गा.पा ०६	गोरखा	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	५०००	४९९६	४९९६	९९.९२		१९२४		सम्पन्न हुने
१४८	निमजुङ खानेपानी योजना शहिद लखन २	गोरखा	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	५०००	४९९७	४९९७	९९.९४		३०००		सम्पन्न हुने
१४९	ग्यझाखोला लिफ्टिङ्ग खा.पा आयोजना अधुरो शहिद लखन	गोरखा	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	४८००	४६९९	४६९९	९३.९८		१५००		सम्पन्न हुने
१५०	मझिगाउँ /दुवार खानेपानी लिफ्टिङ्ग खानेपानी आयोजना	गोरखा	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	४८००	४०००	४०००	८०.००		४०००		सम्पन्न हुने
१५१	एकचार पम्पिङ्ग खानेपानी मर्मत योजना भिमसेन थापा ६ गोरखा	गोरखा	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	४८००	२०००	२०००	४०.००		२०००		सम्पन्न हुने
१५२	मस्युङ्दी बलथुम खानेपानी ९०० घरधुरी खा पा आयोजना	गोरखा	९८४५	२०८२-०२-१२	२०८१/८२	९४५१.२	१०००	१०००	१०.१६		८८४५		सम्पन्न हुने
१५३	रामपुर लिफ्टिङ्ग खानेपानी गण्डकी ५	गोरखा	९६००	२०८२-०२-१२	२०८१/८२	९२१६	२०००	२०००	२०.८३		७६००		सम्पन्न हुने
१५४	धर्तिपानी महिपते भोगटेनी योजना सिरानचोक २	गोरखा	९२६०	२०८२-०२-१२	२०८१/८२	८८८९.६	१९९७	१९९७	२१.५७		७२६०		सम्पन्न हुने
१५५	आलेगाउँ खानेपानी आयोजना गो.न.पा ८	गोरखा	९२४८	२०८२-०२-१२	२०८०/८१	८८७८.०८	२०००	२०००	२१.६३		७२४८		सम्पन्न हुने
१५६	सौरपानी भन्ज्याङ्ग-चुनेडाँडा खानेपानी योजना, बारपाक सुलिकोट गा.पा ०४	गोरखा	१८०००	२०८२-०२-१२	२०८१/८२	१७२८०	३०००	३०००	१६.६७		१५०००		सम्पन्न हुने
१५७	फलामखानी बस्ताकोटी धारा लिफ्टिङ्ग खानेपानी योजना पालुङटार न.पा २ गोरखा	गोरखा	५०००	२०८२-०१-२६	२०८१/८२	४८००	३५००	३५००	७०.००		२०००		सम्पन्न हुने
१५८	झाक्रीखोला धारापानि खत्रीटार खानेपानी तथा	गोरखा	५०००	२०८२-०१-२६	२०८१/८२	४८००	४९८५	४९८५	९९.७०		४०००		सम्पन्न हुने

क्र. सं.	कार्यक्रम/ आयोजनाको नाम	जिल्ला	स्रोत सुनिश्चित/सहमति रकम	स्रोत सुनिश्चित मिति	सम्झौता मिति	सम्झौता रकम	खर्चको विवरण		हालसम्मको प्रगति %		२०८२/८३ को विनियोजन	बाँकी दायित्व	कैफियत
	सरसफाई												
१५९	बर्खेधारा खानेपानी आयोजना	गोरखा	५०००	२०८२-०१-२६	२०८१/८२	४८००	४०००	४०००	८०.००		२०००		सम्पन्न हुने
१६०	बोर्लाङ्गीगाउँ खानेपानी एक घर एक धारा शहीदलखन ७	गोरखा	५०००	२०८२-०१-२६	२०८१/८२	४८००	४०००	४०००	८०.००		२०००		सम्पन्न हुने
१६१	बालकी वाडलीङ हिमलुङ थुम्का खानेपानी आयोजना	गोरखा	५०००	२०८२-०१-२६	२०८१/८२	४८००	२९९२	२९९२	५९.८४		१०००		सम्पन्न हुने
१६२	काउले गाउँ खानेपानी आयोजना सिरानचोक ४ गोरखा	गोरखा	५०००	२०८२-०१-२६	२०८१/८२	४८००	१९९५	१९९५	३९.९०		२०००		सम्पन्न हुने
१६३	दामे पम्पिङ खानेपानी टंकी निर्माण तथा मर्मत योजना भिमसेन थापा २ गोरखा	गोरखा	५०००	२०८२-०१-२६	२०८१/८२	४८००	४०००	४०००	८०.००		३०००		सम्पन्न हुने
१६४	आँपपिपल सिम्पानी रातडाँडा बृहत दामिचौर खा.पा.आ.	गोरखा	८०००	२०८१-०६-२०	२०८१/८२	७६८०	५९९८	५९९८	७४.९८		१५००		सम्पन्न हुने
१६५	बिचकरी लिफ्ट खा.पा.आ.	गोरखा	९९००	२०८१-०६-२०	२०८१/८२	९५०४	९३००	९३००	९३.९४		२०००		सम्पन्न हुने
१६६	स्याउली बजार खा.पा.आ.	गोरखा	९०००	२०८१-०६-२०	२०८१/८२	८६४०	७९९७	७९९७	८८.८६		१७००		सम्पन्न हुने
१६७	पालेखर्कछाप ठोटनेरी मान्बु थलाचोक बेसी घाम्लीङ कटुन्जेबेसी खा.पा.आ.	गोरखा	२०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	१९२०	९९९	९९९	४९.९५		१०००		सम्पन्न हुने
१६८	ल्हानसिँ कुडुले लिफ्टिङ्ग खानेपानी योजना, गण्डकी गा.पा. १	गोरखा	३०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	३०००	२९९८	२९९८	९९.९३		१५००		सम्पन्न हुने
१६९	पहरे खा.पा.आ.	गोरखा	३०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	२८८०	१९९७	१९९७	६६.५७		१०००		सम्पन्न हुने
१७०	अर्चले खानेपानी आयोजना, शहिद लखन गा.पा ०९	गोरखा	४०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	३८४०	३४९५	३४९५	८७.३८		२५००		सम्पन्न हुने
१७१	आप्रिक खानेपानी आयोजना आरुघाट गाउँपालिका ४ गोरखा	गोरखा	४०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	३८४०	२४९६	२४९६	६२.४०		१५००		सम्पन्न हुने
१७२	कर्मसिँग खानेपानी आयोजना	गोरखा	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	४८००	२९५१	२९५१	५९.०२		२५००		सम्पन्न हुने
१७३	छापागाउँ /बैटारी खानेपानी आयोजना	गोरखा	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	४८००	४०००	४०००	८०.००		२०००		सम्पन्न हुने
१७४	अधेरीखोला लिफ्टिङ्ग खा पा ट्याङ्की निर्माण ५०	गोरखा	५०००	२०८१-११-२६	२०८०/८१	४८००	४५००	४५००	९०.००		२०००		सम्पन्न हुने

क्र. सं.	कार्यक्रम/ आयोजनाको नाम	जिल्ला	स्रोत सुनिश्चित/सहमति रकम	स्रोत सुनिश्चित मिति	सम्झौता मिति	सम्झौता रकम	खर्चको विवरण		हालसम्मको प्रगति %	२०८२/८३ को विनियोजन	बाँकी दायित्व	कैफियत
	हजार लिटरको											
१७५	बिरौटा खानेपानी आयोजना	गोरखा	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	४८००	२५००	२५००	५०.००	२०००		सम्पन्न हुने
१७६	गोरखा जिल्ला अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा मध्यम / उच्चस्तरको खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउन	गोरखा	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	५०००	४९८९	४९८९	९९.७८	३०००		सम्पन्न हुने
१७७	भुंगखाने लिफ्टिंग खानेपानी आयोजना	गोरखा	९७२०	२०८२-०२-१२	२०८१/८२	९३३९.२	२०००	२०००	२०.५८	७७२०		सम्पन्न हुने
१७८	सिम्को खोल्सी लिफ्टिङ्ग खानेपानी योजना, गोरखा न.पा ०१	गोरखा	९७००	२०८२-०२-१२	२०८०/८१	९३९२	२०००	२०००	२०.६२	७७००		सम्पन्न हुने
१७९	असुराघारी बसेरीगाउँ खानेपानी सिरानचोक ६ (आलेगाउँ, दमैगाउँ, ठूलो गाउँ, खनालगाउँ) सिरानचोक ६	गोरखा	९४४८	२०८२-०२-१२	२०८१/८२	९०७०.०८	२०००	२०००	२१.१७	७४४८		सम्पन्न हुने
१८०	अन्नपूर्ण खोप्लाङ खा.पा.आ.	गोरखा	१६०००	२०८२-०२-१२	२०८१/८२	१५३६०	१६९८	१६९८	१०.६१	१४३००		सम्पन्न हुने
१८१	तल्लो भाडस्वाँरा, माथिल्लो भाडस्वाँरा भ्याँवा खानेपानी अजिरकोट ४	गोरखा	१८९३०	२०८२-०२-१२	२०८१/८२	१८१७२.८	२०००	२०००	१०.५७	१६९३०		सम्पन्न हुने
१८२	काउलेपौवा खानेपानी योजना, भिमसेन थापा गा.पा ०२	गोरखा	५०००	२०८२-०१-२६	२०८१/८२	४८००	३९९२	३९९२	७९.८४	२५००		सम्पन्न हुने
१८३	पन्हुंग अँधेरी खानेपानी आयोजना भीमसेन	गोरखा	५०००	२०८२-०१-२६	२०८१/८२	४८००	३४९८	३४९८	६९.९६	३०००		सम्पन्न हुने
१८४	फासँखोला खानेपानी योजना बाँसपुर सिरानचोक गाउँपालिका वडा नं ६ बाँसपुर	गोरखा	५०००	२०८२-०१-२६	२०८१/८२	४८००	२९९८	२९९८	५९.९६	१०००		सम्पन्न हुने
१८५	चित्लीखोला बृहत खा.पा.आ.	लमजुङ	१७०००	२०८१-०६-२०	२०८१/८२	१६३२०	१२९९४	१२९९४	७६.४४	३०००		सम्पन्न हुने
१८६	कर्मदा नदीका शिवजी मन्दिरमा खानेपानी सुन्दरबजार न.पा ७ लमजुङ	लमजुङ	९५००	२०८१-०६-२०	२०८१/८२	९१२०	७८९९	७८९९	८३.१५	१०००		सम्पन्न हुने
१८७	बेशिसहर ५ नाल्मा डाँडामा १०० घरधुरीलाई खानेपानी	लमजुङ	१८००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	१७२८	८००	८००	४४.४४	५००		सम्पन्न हुने
१८८	बाग्रेबेसी चनौटेटोल खा.पा.आ.	लमजुङ	२०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	१९२०	२०००	२०००	१००.००	१०००		सम्पन्न हुने
१८९	कुडुले, बगालेटोल कालिका खानेपानी योजना, राइनास न.पा. ९	लमजुङ	३०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	२८८०	२५६०	२५६०	८५.३३	२०००		सम्पन्न हुने

क्र. सं.	कार्यक्रम/ आयोजनाको नाम	जिल्ला	स्रोत सुनिश्चित/सहमति रकम	स्रोत सुनिश्चित मिति	सम्झौता मिति	सम्झौता रकम	खर्चको विवरण		हालसम्मको प्रगति %	२०८२/८३ को विनियोजन	बाँकी दायित्व	कैफियत
१९०	झुमस्वारा खानेपानी आयोजना दोर्दी	लमजुङ	३०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	३०००	२९८६	२९८६	९९.५३	१०००		सम्पन्न हुने
१९१	झिमरुङ-माउखोला-सिमलचौर खानेपानी योजना मध्यनेपाल न पा ७	लमजुङ	३०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	३०००	२९९७	२९९७	९९.९०	१०००		सम्पन्न हुने
१९२	तिवारी गाउँ कोईराला फाँट खानेपानी योजना, सुन्दर बजार न.पा.	लमजुङ	३०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	३०००	२९८१	२९८१	९९.३७	१०००		सम्पन्न हुने
१९३	सैल पुत्री नमुना मा.वि. ट्यांकी निर्माण राईनास न.पा २ लमजुङ	लमजुङ	२५००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	२४००	२४९२	२४९२	९९.६८	५००		सम्पन्न हुने
१९४	अर्चलबोट खा.पा.आ.	लमजुङ	४०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	४०००	४०००	४०००	१००.००	१५००		सम्पन्न हुने
१९५	ढोडेसिंग खत्रीठाटि खानेपानी आयोजना	लमजुङ	४०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	४०००	४०००	४०००	१००.००	२०००		सम्पन्न हुने
१९६	नमुना सामुदायिक अस्पताल डिप बोर्डिङ खा.पा.आ सुन्दरबजार ६ लमजुङ	लमजुङ	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	४८००	३५००	३५००	७०.००	२०००		सम्पन्न हुने
१९७	दुधपोखरी खानेपानी योजना, गुधपोखरी गा.पा १	लमजुङ	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	४८००	४२००	४२००	८४.००	३०००		सम्पन्न हुने
१९८	प्रोवि खानेपानी योजना मर्स्याङ्दी २	लमजुङ	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	४८००	४२००	४२००	८४.००	२७००		सम्पन्न हुने
१९९	कोलासोथर बृहत गिलुंग टक्सार भुजुंग गम्नांग खानेपानी आयोजना	लमजुङ	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	४८००	१४९९	१४९९	२९.९८	३५००		सम्पन्न हुने
२००	खहरेखोला खानेपानी योजना, बेशिशहर न.पा १०	लमजुङ	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	४८००	४७९८	४७९८	९५.९६	२०००		सम्पन्न हुने
२०१	राईनास लम्जुंग बेसीसहर खानेपानी योजना	लमजुङ	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	४८००	१९९५	१९९५	३९.९०	२५००		सम्पन्न हुने
२०२	जल्पादेवी खा.पा.आ. सोलार सिष्टम	लमजुङ	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	४८००	३४९९	३४९९	६९.९८	३०००		सम्पन्न हुने
२०३	जिताकोट खानेपानी आयोजना, लमजुङ	लमजुङ	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	४८००	४९९८	४९९८	८३.९६	२५००		सम्पन्न हुने
२०४	चिती खा.पा.आ.	लमजुङ	९५२५	२०८२-०२-१२	२०८१/८२	९१४४	२०००	२०००	२१.००	७५२५		सम्पन्न हुने
२०५	प्याराजुङ खानेपानी आयोजना	लमजुङ	९१००	२०८२-०२-१२	२०८१/८२	८७३६	१०००	१०००	१०.९९	८१००		सम्पन्न हुने
२०६	बाह्रपोखरी खानेपानी योजना, दोर्दी गा.पा. ७,८,९	लमजुङ	८९००	२०८२-०२-१२	२०८१/८२	८५४४	२०००	२०००	२२.४७	६९००		सम्पन्न हुने

क्र. सं.	कार्यक्रम/ आयोजनाको नाम	जिल्ला	स्रोत सुनिश्चित/सहमति रकम	स्रोत सुनिश्चित मिति	सम्झौता मिति	सम्झौता रकम	खर्चको विवरण		हालसम्मको प्रगति %		२०८२/८३ को विनियोजन	बाँकी दायित्व	कैफियत
२०७	भार्ते खानेपानी योजनाको निरन्तरता एक घर एक धारा	लमजुङ	९३००	२०८२-०२-१२	२०८१/८२	८९२८	२०००	२०००	२१.५१		७३००		सम्पन्न हुने
२०८	दारेगौडा खत्री गाउँ खानेपानी योजना वेशीशहर ३ लमुङ	लमजुङ	५०००	२०८२-०१-२६	२०८१/८२	४८००	४९९५	४९९५	९९.९०		२०००		सम्पन्न हुने
२०९	बोरांग छाप स्वारा भंगाटि दमाहुंगा सालघारी बस्तीमा खानेपानी आयोजना	लमजुङ	५०००	२०८२-०१-२६	२०८१/८२	४८००	३९९२	३९९२	७९.८४		२५००		सम्पन्न हुने
२१०	स्वास्थ्य चौकी खानेपानी आयोजना	लमजुङ	३०००	२०८१-११-२६	२०८१/८२	३०००	३०००	३०००	१००.००		१५००		सम्पन्न हुने
	खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय म्याग्दी												
२११	कुहुँ खानेपानी आयोजना मंगला १ म्याग्दी	म्याग्दी	२५००	२०८१-११-२६		२५००	२१००.१३	२१००.१३	८४.०१	१००.००	०		सम्पन्न हुने
२१२	खालखोला थाप्लेडाडा खानेपानी योजना, मालिका ०४, म्याग्दी	म्याग्दी	३०००	२०८१-११-२६		३०००	१८६९.०२३	१८६९.०२३	६२.३०	८०.००	७५०	३८०.९७७	सम्पन्न नहुने
२१३	चिमखोला भगवती पिप्ले वृहत खानेपानी आयोजना रघुगंगा ३ म्याग्दी	म्याग्दी	४५००	२०८१-११-२६		४५००	३८९१.१३८	३८९१.१३८	८६.४७	१००.००	५००	१०८.८६२	सम्पन्न नहुने
२१४	भुकभुके खानेपानी योजना, बे.न.पा. ३, भक्तीमले	म्याग्दी	४०००	२०८१-११-२६		४०००	३२२२.७५९	३२२२.७५९	८०.५७	१००.००	५००	२७७.२४१	सम्पन्न नहुने
२१५	चित्लेटि एकपाटे खाकनपोखरी डस्मरा र चुतेनी खानेपानी आयोजना	म्याग्दी	४०००	२०८१-११-२६		४०००	२२४६.०२९	२२४६.०२९	५६.१५	७५.००	१५००	२५३.९७१	सम्पन्न नहुने
२१६	काउले खानेपानी योजना मर्मत मंगला १ म्याग्दी	म्याग्दी	४०००	२०८१-११-२६		४०००	२३३५.००३	२३३५.००३	५८.३८	१००.००	१५००	१६४.९९७	सम्पन्न नहुने
२१७	दुखुखोला रणवाड खानेपानी आयोजना मंगला २ म्याग्दी	म्याग्दी	५०००	२०८१-११-२६		५०००	१८०४.०५२	१८०४.०५२	३६.०८	८०.००	२५००	६९५.९४८	सम्पन्न नहुने
२१८	कोसेपानी घोरेपानी खानेपानी आयोजना	म्याग्दी	४०००	२०८१-११-२६		४०००	२५९३.८०७	२५९३.८०७	६४.८५	८०.००	१५००		सम्पन्न हुने
२१९	काउले घोटघोते खानेपानी योजना	म्याग्दी	५०००	२०८१-११-२६		५०००	२३७१.८९५	२३७१.८९५	४७.४४	८०.००	२६००		सम्पन्न हुने
२२०	तल्लो शिख खानेपानी योजना	म्याग्दी	४०००	२०८१-११-२६		४०००	२९७४.२१३	२९७४.२१३	७४.३६	८०.००	१४००		सम्पन्न हुने
२२१	दामदुम विम तल्लोगाउँ लिफ्टिंग खानेपानी मर्मत योजना, मालिका ७	म्याग्दी	४०००	२०८१-११-२६		४१००	१६५७.९६	१६५७.९६	४०.४४	५०.००	३१००		सम्पन्न हुने

क्र. सं.	कार्यक्रम/ आयोजनाको नाम	जिल्ला	स्रोत सुनिश्चित/सहमति रकम	स्रोत सुनिश्चित मिति	सम्झौता मिति	सम्झौता रकम	खर्चको विवरण		हालसम्मको प्रगति %		२०८२/८३ को विनियोजन	बाँकी दायित्व	कैफियत
२२२	शिख उपल्लो खानेपानी योजना	म्याग्दी	५०००	२०८१-११-२६		५०००	२९८७.२२३	२९८७.२२३	५९.७४	८०.००	२०००		सम्पन्न हुने
२२३	ओखलेको खानेपानी योजना बेनी न.पा. १०, म्याग्दी	म्याग्दी	४४५०	२०८२-०१-३०		३५००	१७४१.३५८	१७४१.३५८	४९.७५	८०.००	११५०		सम्पन्न हुने
	२०८१/८२ भन्दा पहिलेका स्रोत सुनिश्चित योजना हरू												
	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय गोरखा												
१	चिसापानी, व्याखर्क, चिप्लेटी, खानेपानी तथा ट्याङ्की निर्माण सिरानचोक ८	गोरखा	१९५००	२०८०-११-१८	२०८०/८१	१८७२०	२५००	३५००	१७.९५		२०००		सम्पन्न हुने
२	पहरे भन्ज्याङ लिफ्ट खानेपानी वारपाक सुलिकोट ८	गोरखा	१५०००	२०८०-११-१८	२०८०/८१	१४४००	८९९५	१०४९५	६९.९७		३०००		सम्पन्न हुने
३	भुवाने घुमचोकटार भुतभुते खानेपानी आयोजना	गोरखा	१३५००	२०८०-११-१८	२०८०/८१	१२९६०	६९३६	७९३६	५८.७९		२०००		सम्पन्न हुने
४	सामा गाउँ बृद्धआश्रम खानेपानी निर्माण योजना चुमनुव्री १ गोरखा	गोरखा	१४०००	२०८०-११-१८	२०८०/८१	१३४४०	९९९४	११५९०	८२.७९		१०००		सम्पन्न हुने
५	विखेखोला खा.पा.आ.बुङकोट	गोरखा	१६०५४	२०८०-१०-२२	२०८०/८१	१५४११.८४	५४९९	७४९८	४६.७०		३०००		सम्पन्न हुने
	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय तनहुँ												
६	मिलनचोक जरेबर खानेपानी	तनहुँ	३०२७२	२०७७-१२-१६	२०८१/०८/१०	३०००	३०००	१३७९६	५०.००	५५.००	४५००		सम्पन्न हुने
७	छाब्दी दोभान बोरिंग लिफ्टिंग	तनहुँ	३६८१०	२०७७-१२-१६	२०८१/०६/३०	६०००	६०००	२४१०५	६९.००	७५.००	६०००		सम्पन्न हुने
८	झापुटार खानेपानी आयोजना	तनहुँ	२५५९४	२०७७-१२-१६	२०७८/०३/२१	२८७५०	९५००	१८६५२	६०.००	६५.००	४०००	५०००	सम्पन्न नहुने
९	टरुवा खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना कावासोती ७	नवलपुर	२७०००	२०८०-११-१८	२०८१/०२/०९	१२९७४	७८७६	१३५२२	१८.००	३०.००	६०००	५५०००	सम्पन्न नहुने
१०	धरादी खानेपानी आयोजना	तनहुँ	९०००	२०८०-११-१८	२०८१/०६/१५	८९५०	४२५६	१०५२६	८०.००	८५.००	२०००	१००००	सम्पन्न नहुने
११	कोल्हुवा खानेपानी आयोजना मध्यबिन्दु -२	नवलपुर	१६०००	२०८०-११-१८	२०८१/०२/०९	१२९४१	७०००	४१०६३	११.००	२०.००	७५००	१३०००	सम्पन्न नहुने
१२	घुमारीघाट लिफ्ट खानेपानी आयोजना, बुलिङटार ६, नवलपुर	नवलपुर	१४०००	२०८०-११-१८	२०८१/०८/३०	२४२०	२१५१	३१५१	३४.००	४०.००	२५००	५०००	सम्पन्न नहुने

क्र. सं.	कार्यक्रम/ आयोजनाको नाम	जिल्ला	स्रोत सुनिश्चित/सहमति रकम	स्रोत सुनिश्चित मिति	सम्झौता मिति	सम्झौता रकम	खर्चको विवरण		हालसम्मको प्रगति %		२०८२/८३ को विनियोजन	बाँकी दायित्व	कैफियत
१३	प्रसैया खानेपानी योजना, विनय त्रिवेणी -६	नवलपुर	९०००	२०८०-११-१८	२०८१/०७/१३	६३५७	२५००	५३५०	३५.००	४०.००	३५००	३५००	सम्पन्न नहुने
१४	बृहत घिरिग-१ खानेपानी योजना(पुटटार,अत्रौली,बैडी,भन्टार,देवीस्थान,कट हरे,पुटगाउँ समेत)	तनहुँ	२२०००	२०८०-११-१८	२०७७/०३/२१	५३१११	०	३७३७३	४०.००	४५.००	१००००	३००००	सम्पन्न नहुने
१५	हजारिया रिसिंग पाटन बोरिंग खानेपानी योजना, भिमाद न पा -५ तनहुँ	तनहुँ	९०००	२०८०-११-१८	२०८१/१०/२५	५०००	४९५०	६९५०	४९.००	५५.००	३५००	९०००	सम्पन्न नहुने
१६	डिकुस खानेपानी लिफ्टिंग योजना, भिमाद-०७, तनहुँ	तनहुँ	१३५००	२०८०-११-१८	२०८०/०८/२८	१९००	१८६०	४३६०	३४.००	४०.००	३०००	५०००	सम्पन्न नहुने
१७	कुमालटारी बोटेगाउँ बेलटारी लिफ्ट खानेपानी आयोजना ब्यास-१०	तनहुँ	९०००	२०८०-११-१८	२०८२/०७/१३	७५००	७३७३	८३७३	४९.००	५५.००	५०००		सम्पन्न हुने
१८	छिरौदी खानेपानी योजना, भिमाद न.पा. -१ तनहुँ	तनहुँ	९०००	२०८०-११-१८	२०८१/८२	५०००	४९९८	५२००	१२.००	२०.००	५०००	३००००	सम्पन्न नहुने
	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय बागलुंग												
१९	लामीचौर रमेटार खानेपानी आयोजना बागलुंग नगरपालिका ४ कुडुले	बागलुंग	१५०००	२०८०-११-१८	२०८०/८१	१५०००	०	१५००	१०.००	५८.००	३०००	१०५००	सम्पन्न नहुने
२०	भिरकटेरा खा.पा.आ., बडीगाड गा.पा.-०५	बागलुंग	१००००	२०८०-११-१८	२०८०/८१	१००००	०	८८३	८.८३	६२.००	३०००	६११७	सम्पन्न नहुने
२१	जलजला लिफ्टिंग खानेपानी आयोजना	बागलुंग	३९८२	२०८१-११-२६	२०८१/८२	३९८२	०	०	०.००	८२.००	११००	२८८२	सम्पन्न नहुने
	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय स्यांगजा												
२२	कराडूदी मसार लि.खा.पा. कालीगण्डकी २	स्यांगजा	१५००	२०८१-११-२६	२०८१/०८२	४५००	६४४	३८५४	४२.५३	४३.५३	३५०	२९६	सम्पन्न नहुने
	जम्मा		१३९९३१			१६६६९६०					५९६५५०	१९८७८४	

सांराश

२०८१/८२ मा सम्पन्न आयोजना	८
२०८२/८३ मा सम्पन्न भैसकेका योजना	४१
२०८२/८३ मा सम्पन्न हुनसक्ने आयोजना	११५
आगामी आ.व. मा सम्पन्न हुनसक्ने आयोजना	७७

क्र. सं.	कार्यक्रम/ आयोजनाको नाम	जिल्ला	स्रोत सुनिश्चित/सहमति रकम	स्रोत सुनिश्चित मिति	सम्झौता मिति	सम्झौता रकम	खर्चको विवरण	हालसम्मको प्रगति %	२०८२/८३ को विनियोजन	बाँकी दायित्व	कैफियत
	जम्मा आयोजना	२४१									

ख. सिंचाइ क्षेत्र (रु. हजारमा)

(१) आ. व. २०८१/८२ मा सम्पन्न भएका बहुवर्षीय तथा स्रोत सुनिश्चितता/स्रोत सहमति प्रदान भएका आयोजनाको विवरण

क्र. सं.	कार्यक्रम/ आयोजनाको नाम	जिल्ला	अपेक्षित उपलब्धी		अध्यावधिक उपलब्धी	स्रोत सुनिश्चित/ सहमति रकम	सम्झौता मिति	सम्झौता रकम	खर्चको विवरण		हालसम्मको प्रगति %		२०८२/८३ को विनियोजन	बाँकी दायित्व	कैफियत
			परिमित	इकाई					आ.व. २०८१/८२ को खर्च	२०८१/८२ सम्मको कुल खर्च	वित्तीय	भौतिक			
१	मादी नदी नियन्त्रण, तनहुँ	तनहुँ	६६०	मि	६६०	४९९२७	२०७८/२०७९	२०६४८०.६३	५१५८६.५१	२०३३२२.२५	९८.४७	१००	०		सम्पन्न
२	टुकुचे झोड सिंचाई योजना थासाड १, मुस्ताङ	मुस्ताङ	५५	हे	५५	५२४६६	२०७६/२०७७	२८३६८	३८५४	२७०७८.१८	९२	१००	०	०	सम्पन्न
३	आलेकुलो सिंचाई योजना, दुध पोखरी गापा ४ लम्जुंग	लम्जुंग	१२	हे	१२	१०७१७	२०७९/२०८०	४९७८.५५	१२४३	४८८४	९८.१०	९९.१०	०		सम्पन्न
४	पल्लो ख्युरी खोला सिंचाई योजना, मर्स्याङ्गदी २, लमजुङ	लम्जुंग	१८	हे	१८	८९३१.५१	२०७७/२०७८	६४६२.३९	१३४१	५४०२	८३.५९	८४.५९	०		सम्पन्न
५	मादी मिदिम नदी नियन्त्रण, मध्ये नेपाल न.पा.	लम्जुंग	१२०	मि	१२०	६२३७.७१	२०७६/२०७७	३६००.५३	२९१	३४३३	९५.३५	९६.३५	१५००		सम्पन्न
६	शेराबेशी सिंचाई योजना, दोर्दी गा.पा. ०६, लमजुङ	लम्जुंग	१५	हे	१५.	९५२४.३	२०७६/२०७७	५८०५.३५	०	५३४०	९१.९९	९२.९९	०		सम्पन्न
७	सादिखोला सिंचाई योजना	लम्जुंग	६	हे	६	६०२२.२	२०७८/२०७९	४२७६.०९	६६६	३८३८	८९.७६	९०.७६	०		सम्पन्न
८	रजर आर्पचौर बगरी खेत हिउदे सिंचाई कुलो निर्माण, देवचुली -१६	नवलपुर	३३	हे	३३	९९९१.००	२०८०/१२/१४	४६३७	२४८६.५१	४६१९.०७	९५.७८	१००	०	०	
९	चेपेघाट घाट संरक्षण एव तटबन्ध निर्माण, पालुङ्गटार	गोरखा	२८५	मि	२८५	१४९४३	२०७९/११/०५	८४३०	७८२४.५५	८०५९.३८	९५.६	९६	०	०	

क्र. सं.	कार्यक्रम/ आयोजनाको नाम	जिल्ला	अपेक्षित उपलब्धी		अध्यावधिक उपलब्धी	स्रोत सुनिश्चित/	सम्झौता मिति	सम्झौता रकम	खर्चको विवरण		हालसम्मको प्रगति %		२०८२/८३ को विनियोजन	बाँकी दायित्व	कैफियत
१०	मालिमटार सिंचाइ योजना, बारपाक, सुलिकोट गापा ६, गोर्खा	गोरखा	१०	हे.	१०	८८३३	२०८०/०१/०५	७०२२	३४५०.८६४	७००३.०९४	९९.७३१	१००	०	०	सम्पन्न
११	पातीखोला नियन्त्रण माछापुच्छ्रे गापा -५, कास्की	कास्की	३	हे.	३	८४५०	२०८०/८१	३८११	३,०९९.९९	३७५९.९९२	९८.६६	१००	०	०	सम्पन्न
१२	करपुटार सिंचाई योजना, मध्यनेपाल न. पा ७ करपुटार	लम्जुंग	१०८	हे	१०८	१५०००	२०८०/२०८१	८९७१	८८५०	८८५०	९८.६५	९९.६५	२०००		सम्पन्न
१३	जहरे सिंचाई योजना (३५ हे.), कुश्मा-११ पर्वत	पर्वत	३५	हे.	३५	१२८००	२०८१/०३/११	५७००.८६	०	५२००.१३	९५	१००	०	०	सम्पन्न
१४	धुवाखोला सिंचाइ योजना , फ.न.पा.५, पर्वत	पर्वत	३७	हे.	२२	१०८००	२०८१/०३/१०	६६००.८६		६४००.८५	९५	१००	२०००	०	सम्पन्न
१५	चुचुरे दरौंदी दोभान भुसुण्डे खोला तटबन्धन, पा नपा १	गोरखा	२११	मि	२११	१४०००	२०८१/०३/०५	६३२६.७९८२४	६०८३.४५	६०८३.४५	९६.१५४	१००	०	०	सम्पन्न
१६	शिवालयदेखि भँडारे तटबन्धन, सिरानचोक ४	गोरखा	१८५	मि	१८५	१४०००	२०८१/०३/१२	६६६८.८७९४२	६५९७.०६	६५९७.०६	९८.९२३	१००	०	०	सम्पन्न
१७	बौलाहा खोला तटबन्धन, देवचुली नवलपुर	नवलपुर	२०४	मि.	२०७	९०००	२०८१/०३/१०५	८१३९.०८९६८	८३८९.०३७	८३८९.०३७	९९.१	१००	२०००	०	सम्पन्न
१८	कल्याणटारी सिंचाई योजना (१२ हे.), बुलिङटार-४, नवलपरासी (व.सु.पू)	नवलपुर	१२	हे	१२	१७०००	२०८१/०३/१०५	९७५९.४५५८३	७९५७.१०९४३	८४४४.१०९४३	८३.१९	१००	१०००	०	सम्पन्न
१९	सेन स्यागु सिंचाई योजना, बारागाड मुक्तिक्षेत्र गा.पा ४, कागवेनीको नहर तथा संरचना निर्माण कार्य (सिंचाई प्रणालीको निर्माण)	मुस्ताङ्ग	३५	हे	३५	२८०००	२०८०/२०८१	११२२५	२५३०	४५१०	६०	२९	५००	६७५	सम्पन्न
२०	तन्डक्या किम्लिङ सिंचाई योजना मर्मत, लोमान्थाङ गा.पा ४, मुस्ताङ	मुस्ताङ्ग	२३	हे	२३	१५५००	२०८०/२०८१	१२४७५		१५००	९		०	०	सम्पन्न
२१	हाडेटार सिंचाई योजना, सुन्दरबजार न.पा., लमजुङ	लम्जुंग	२२५	हे	२२५	१९९९९	२०८०/२०८१	१२१६६.०८	७७४४	११७४४	९६.५३	९७.५३	२०००		सम्पन्न

आ.व. २०८१/८२ को वार्षिक प्रगति विवरण

क्र. सं.	कार्यक्रम/ आयोजनाको नाम	जिल्ला	अपेक्षित उपलब्धी		अध्यावधिक उपलब्धी	स्रोत सुनिश्चित/	सम्झौता मिति	सम्झौता रकम	खर्चको विवरण		हालसम्मको प्रगति %		२०८२/८३ को विनियोजन	बाँकी दायित्व	कैफियत
२२	भुसुन्डे खोला नियन्त्रण कार्य, सिरानचोक गा.पा. तथा पालुडटार न.पा. गोरखा	गोरखा	३०८	मि	३०८	१४९८६	२०८०/१२/२२	८१११.१३४४	४२२३.६७२	७७७३.३३	९५.८३५	९६	३०००	०	सम्पन्न
२३	चुवा सिचाई योजना कु.न.पा. ०८ पर्वत	पर्वत	२५	हे.	२५	६२६५	२०८१/०१/१०	५५००.९		५४००.०९	९०	१००	१०००	०	सम्पन्न
२४	बृहत गण्डकी डिप बोरिङ योजना, गण्डकी गा.पा. ७ र ८ गोरखा	गोरखा	५	हे.	४	७२००	२०८०/२०/८१	३०००		३०००	९०	१००	०	०	सम्पन्न
२५	झ्याम्टे खोला मैरनी साझादह सिचाई योजना मंगला, गा. पा.-३ म्याग्दी	म्याग्दी	१३	हे.	१३	४०००	२०८१/०८/२	४०००	३९५३	३९५३	९५	१००	०	०	सम्पन्न
	जम्मा					३४८७०६.५		३९२५१६.४४	१३२१७०.७५	३६४५८४.५८			१५०००	६७५	

(२) आ. व. २०८२/८३ संचालनमा रहेका बहुवर्षीय तथा स्रोत सुनिश्चितता/स्रोत सहमति प्रदान भएका आयोजनाको विवरण

क्र. सं.	कार्यक्रम/ आयोजनाको नाम	जिल्ला	अपेक्षित उपलब्धी		कुल लागत अनुमान	स्रोत सुनिश्चित/ सहमति रकम	स्रोत सुनिश्चित मिति	सम्झौता मिति	सम्झौता रकम	खर्चको विवरण		हालसम्मको प्रगति %		२०८२/८३ को विनियोजन	बाँकी दायित्व	कैफियत
			परिमाण	इकाई						आ.व. २०८१/८२ को खर्च	२०८१/८२ सम्मको कुल खर्च	वित्तीय	भौतिक			
१	विजयपुर बेगनास सिंचाइ नहर तथा बाढी व्यवस्थापन कार्य, पोखरा २६-३२	कास्की	९०	हे.	६२५००	६२५००	२०७८-११-१३	२०७८/२०७९	३४५००.२२	६,२१५.५३	३३,३९७.३२	९६.८०	९२	३०००.००		
२	डुडेको रह ठुलो खोला सिंचाई योजना (१८ ह), पोखरा म.न.पा. ३३, कास्की	कास्की	१९	हे.	१४९२३	१४९२३	२०७७-११-२०	२०७७/२०७८	८९६०	०	५६६४.२९२८	६३.२२	७५	२०००.००	१२९५.७१	सम्पन्न नहुने
३	काहुँखोला नदि नियन्त्रण कार्य, पोखरा ११,१३	कास्की	१.७	कि. मि.	८४६३८	८४६३८	२०८०-०३-२४	२०७९/२०८०	४६९५३	३०,७८२.००	३०७८१.९९९	६५.५६	६७	१८५००.००		बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चित

क्र. सं.	कार्यक्रम/ आयोजनाको नाम	जिल्ला	अपेक्षित उपलब्धी		कुल लागत	स्रोत सुनिश्चित/	स्रोत सुनिश्चित मिति	सम्झौता मिति	सम्झौता रकम	खर्चको विवरण		हालसम्मको प्रगति %		२०८२/८	बाँकी दायित्व	कैफियत
			१.४	कि. मि.						१७,४२९.६४	१७४२९.६४	४०.५५	४२			
४	सिलाथान घट्टेखोला संरक्षण पोखरा १३, कास्की	कास्की	५	कि. मि.	८५५१४	८४५१४	२०८०-०३-२४	२०७९/२०८०	४२९८०	१७,४२९.६४	१७४२९.६४	४०.५५	४२	१८५००.००	७०५०.३६	वहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चित
५	सुइखेत पुल तल माथि तटबन्धन, पोखरा-२५, कास्की	कास्की	५	कि. मि.	२२०००	२००००	२०८०-११-१८	२०८०/८१	९४०७.४१	४,८१०.७१	५७५०.७०९	६१.१३	६२	७०००.००		निर्माणाधीन
६	टारबेशी सिचाई , पोखरा-१९	कास्की	२०	हे.	२९४३२			२०७७/२०७८	१०४८४.४२	९८४.२६२	५७४८.५९	५४.८२९९	६०	२५००.००	२२३५.८२	सम्पन्न हुने
७	अर्मला क्षेत्र संरक्षण तथा कालीखोला तटबन्ध	कास्की	२.६८	कि. मि.	१२०५६९			२०७९/८०	८४१५२.१२	२०३४६.४२७	६२९८४.४०७	७४.८४५९	७५	१६३००.००	४८६७.७१	सम्पन्न नहुने
८	पात्रे खोला पाउँदुर फाँट सिचाई योजना-अन्नपूर्ण-३, कास्की	कास्की	४५	हे.	५०००	४९२२	२०८१-११-२६	२०८१/२०८२	२१४२		२१४०.६७०३९	९९.९३१४		२०००.००	७८१.३३	आ.व २०८१/८२ को बिनियोजित बजेटको मात्र सम्झौता भई कार्य सम्पन्न भएको।
९	कुखुरे खोला बौर शिव मन्दिर सिचाई कुलो निर्माण, पोखरा-२१, दम्सादी, कास्की	कास्की	१३	हे.	४९९९	४९२२	२०८१-११-२६	२०८१/२०८२	१९३०		१८७६.८८६९१	९७.२७०१		२०००.००	१०४५.११	
१०	बोक्सीको रह देखि खग प्रशाखा मर्मत कार्य, पोखरा कास्की	कास्की	२०	हे.	४९९९	४९२२	२०८१-११-२६	२०८१/२०८२	४७९६		०	०		२५००.००	२४२२.००	
११	पिप्ले बगर सिचाई योजना मर्मत पोखरा १६	कास्की	३०	हे.	४९२२	४९२२	२०८१-११-२६	२०८१/२०८२	१०६८		१००५.१९४८५	९४.१३०३		२०००.००	१९१६.८१	
१२	गैरली कुलो सिचाई योजना, माछापुच्छ्रे गा.पा. २, कास्की	कास्की	२५	हे.	४९९९	४९२२	२०८१-११-२६	२०८१/२०८२	२१३४		२१३१.६६८२१	९९.८९०१		२०००.००	७९०.३३	आ.व २०८१/८२ को बिनियोजित बजेटको मात्र सम्झौता भई कार्य सम्पन्न भएको।
१३	डंडे साहुकुलो सिचाई योजना ,पोखरा म. न. पा. १९ कास्की	कास्की	३५	हे.	४९९९	४९२२	२०८१-११-२६	२०८१/२०८२	२१३३		२१३१.३९९०८	९९.९३४१		२०००.००	७९०.६०	
१४	उपल्लो डवके सिचाई योजना रुपा ३ कास्की	कास्की	३३	हे.	४९९६	४९९७	२०८१-११-२६	२०८१/२०८२	१०६७		१०६२.९८६	९९.६६९९		२०००.००	१९३४.०१	

क्र. सं.	कार्यक्रम/ आयोजनाको नाम	जिल्ला	अपेक्षित उपलब्धी		कुल लागत	स्रोत सुनिश्चित/	स्रोत सुनिश्चित मिति	सम्झौता मिति	सम्झौता रकम	खर्चको विवरण		हालसम्मको प्रगति %		२०८२/८	बाँकी दायित्व	कैफियत
१५	लाहाचोक जोगीचौर भित्री कुलो, माछापुच्छ्रे ४, कास्की	कास्की	२५	हे.	४९९७	४९९८	२०८१-११-२६	२०८१/२०८२	१०६६		१०६०.५९१ ९३	९९.५०२१		२०००.००	१९३७.४१	
१६	ठुलो पधेरा तेर्सो कुलो सिंचाई योजना माछापुच्छ्रे ४, कास्की	कास्की	१८	हे.	४९९६.४	४९९४	२०८१-११-२६	२०८१/२०८२	१०६७		१०६४.४५६ ७१	९९.७७७५		२०००.००	१९२९.५४	
१७	घारी कुलो- जनै मन्तने तिनघरे चोककुलो सिंचाई योजना, माछापुच्छ्रे गा. पा. ४, लाहाचोक, कास्की	कास्की	२५	हे.	४९९२.७	४९९२	२०८१-११-२६	२०८१/२०८२	२२०४		२२००.१०१ १७	९९.८१७७		२०००.००	७९१.९०	
१८	हुम्दी गल्लिखेत सिंचाई, माछापुच्छ्रे गापा -५, पोखरा	कास्की	२४	हे.	४९९९	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/२०८२	१६०१		१५७७.५५४ ७७	९८.५०७५		२०००.००	१४२२.४५	
१९	बिद्विडार उपल्लो कुलो सिंचाई योजना, रुपा १ कास्की	कास्की	३०	हे.	४९९४	४९९४	२०८१-११-२६	२०८१/२०८२	१६०१		१५९८.५७५ २६	९९.८४५		२२००.००	११९५.४२	
२०	खाल्टेखोला टाकान्जाटार सिंचाई योजना, रुपा ३, कास्की	कास्की	६७	हे.	५०००	५०००	२०८१-११-२६	२०८१/२०८२	१०६८		१०४०.९५१ ६२	९७.५		२०००.००	१९५९.०५	
२१	कसेरी फाँट सिंचाई योजना, पालुंगटार न.पा.-६	गोरखा	४०	हे.	१९९९८	१९९९८	२०८०-०२-१०	२०८०/०५/०७	११३४७	२४८७.२ ४५	७०३४.७४ ५	६१.९९६५	६५	३०००.००	१३१२.२६	सम्पन्न नहुने
२२	मसुर्याङ्दी ताल पोखरी बहुउद्देश्यीय लिफ्टिंग सिंचाई नपा ०६, गोर्खा	गोरखा	२०. २१	हे.	१७२८६	१७२८६	२०७९-०८-०७	२०७९/१२/३०	१४४२९.७ १	४१४८.८ ८३	७८५२.५६३	५४.४१९४	५५	३४००.००	३१७७.१५	सम्पन्न नहुने
२३	न्यौपाने खोला तटबन्ध, पालुङ्गटार न.पा. ४, गोरखा	गोरखा			१९९९५	१९९९५	२०७७-०२-१६	२०७९/११/०३	१२०८८	०	६९४४.७७	५७.४५१८	६०	२०००.००	३१४३.२३	सम्पन्न नहुने
२४	क्याबरा सिंचाई योजना, बा.सु.गा.पा. ४, बारपाक	गोरखा	२४	हे.	५०००	५०००		२०७७/०३/२३	३१७९.९७ ५	०	१८४०	५७.८६२१	६०	१०००.००	३३९.९८	सम्पन्न नहुने
२५	खत्रीटार पौवाटार सिंचाई योजना (७६ हे.) पा.न.पा - ०६ र ७, गोरखा	गोरखा	७६	हे.	३३१२७	३२३७३	२०७६/०९/०८	२०७७/०२/१६	२८३९७.५ ५	४०२६.३२ २	२६१४४.९० २	९२.०६७५	९५	१०००.००	१२५२.६५	सम्पन्न नहुने

क्र. सं.	कार्यक्रम/ आयोजनाको नाम	जिल्ला	अपेक्षित उपलब्धी		कुल लागत	स्रोत सुनिश्चित/	स्रोत सुनिश्चित मिति	सम्झौता मिति	सम्झौता रकम	खर्चको विवरण		हालसम्मको प्रगति %		२०८२/८	बौकी दायित्व	कैफियत
२६	दरौदी शेराफाँट तटबन्धन, सिरानचोक ४	गोरखा			१४०००	१४०००	२०८०-११-१८	२०८१/०३/०५	६४४६.०११	५६०७.५२६	६१७०.५२६	९५.७२६३	१००	०.००		सम्पन्न
२७	शेराफाँट कुलो निर्माण सिंचाई योजना सिरानचोक ४, गोरखा	गोरखा			१००००	१००००	२०८०-११-१८	२०८१/०३/०९	५१८१.२०२	५१२४.५७	५१२४.५७	९८.९०७	१००	०.००		सम्पन्न
२८	भुसुन्डे खोला नियन्त्रण कार्य, सिरानचोक गा.पा. तथा पालुडटार न.पा, गोरखा (क्रमागत योजना)	गोरखा			१४९८६	१४९८६	२०८०-१०-२२	२०८०/१२/२२	८१११.१३४	४२२३.६७२	७७७३.३३	९५.८३५३	९६	०.००		सम्पन्न
२९	बुद्धसिंहटार सिंचाई आयोजना अजिरकोट ३ गोरखा	गोरखा	६	हे.	३१३६	३१३६	२०८१-११-२६			६१८.३०९	६१८.३०९	१९.७९६५	२०	१६८८.००		सम्पन्न हुने
३०	साधिखोला ओखेनी सिंचाई योजना, सिरानचोक-२	गोरखा	१५.७	हे.	४१५९.४५	४०००	२०८१-११-२६			१३९५.८९६	१३९५.८९६	३३.५५९६	३५	४०००.००		सम्पन्न हुने
३१	कुनाखेत अम्बोटे सिंचाई योजना, पा.न.पा १/९, गोरखा	गोरखा	७.५	हे.	४७१२.१८	४५००	२०८१-११-२६	२०८२/०४/१९	१५३१	१९१७.६३७	१९९१.८९	४२.२७११	४५	२२५०.००		सम्पन्न हुने
३२	रैकर बेसी सिंचाई योजना, शहिद लखन गा.पा. २	गोरखा	२०	हे.	४१०६.४२	४०००	२०८१-११-२६			२४९४.४३	२४९४.४३	६०.७४४६	३५	१५००.००	१११.९९	सम्पन्न हुने
३३	खानीखोला तल्लो भिरसिङ्ग सिंचाई योजना मर्मत सिरानचोक १ गोरखा	गोरखा	८	हे.	४७१२.६९	४५००	२०८१-११-२६			२३१५.८६१	२३५६.४६	५०.००२४	५०	५००.००	१८५६.२३	सम्पन्न हुने
३४	खप्टेखोला सिचौर केरावारी सिंचाई योजना सिरानचोक १ गोरखा	गोरखा	१०	हे.	४७१३.१७	४५००	२०८१-११-२६			३२५१.१७	३२५१.१७	६८.९८०५	६८	२५००.००		सम्पन्न हुने
३५	च्याङ्गलीटार सिंचाई योजना (त्रिलाङ्ग र माझगेरा कुलो) पा.न.पा.७, गोरखा	गोरखा	२०	हे.	४१०६.४२	४०००	२०८१-११-२६			३९७८.८८	३९७८.८८	९६.८९४१	९४	१०००.००	१२७.५४	सम्पन्न नहुने

क्र. सं.	कार्यक्रम/ आयोजनाको नाम	जिल्ला	अपेक्षित उपलब्धी		कुल लागत	स्रोत सुनिश्चित/	स्रोत सुनिश्चित मिति	सम्झौता मिति	सम्झौता रकम	खर्चको विवरण		हालसम्मको प्रगति %		२०८२/८	बाँकी दायित्व	कैफियत
३६	ज्यामिरे सिर्दिकुलो निर्माण गो.न.पा-११	गोरखा	६	हे.	४१०५.२४	४०००	२०८१-११-२६			३९,८८.७६	३९,८८.७६	९७.१६२७	८२	५००.००		सम्पन्न हुने
३७	भण्डारथोक सिंचाई योजना (५२ हे.) पा.ना.पा - ०३, गोरखा	गोरखा	५२	हे.	४१०५.४४	४०००	२०८१-११-२६			१८८६.४१	१८८६.४१	४५.९४९	४५	१०००.००	१२१९.०३	सम्पन्न नहुने
३८	लोकेन्द्र गैरी खेत कुलो / बाँध निर्माण योजना पा.न.पा.१० लप्सीचौर गोरखा	गोरखा	११	हे.	४९९७.९४	४७८५	२०८१-११-२६			४७२९.४७	४७२९.४७	९४.६२८४	९१	५००.००		सम्पन्न हुने
३९	छादीखोला सिंचाई योजना पा.न.पा. १०, गोरखा	गोरखा	७.५	हे.	४९९९.१२	४७८५	२०८१-११-२६	२०८२/०४/२१	२०३९	१९९५.१४	१९९५.१४	३९.९०९८	४०	२२१०.००	७९३.९८	सम्पन्न हुने
४०	बेल्लोटे सिंचाई योजना मर्मत संभार, भिमसेन थापा-४, गोरखा	गोरखा	१०	हे.	४६५८.९९	४५००	२०८१-११-२६			४२१४.४४	४२१४.४४	९०.४५८२	८८	५००.००		सम्पन्न हुने
४१	भुसुण्डेखोला बेलवासटार कुलो निर्माण पा.न.पा.१ गोरखा	गोरखा	८	हे.	४९९९.४६	४७८५	२०८१-११-२६			३६६९.४७	३६६९.४७	७३.३९७३	७५	१०००.००	३२९.९९	सम्पन्न हुने
४२	बगरखेत पाङ्ग्राइयाल कुलो मर्मत आरुघाट गाउँपालिका ८ गोरखा	गोरखा	४	हे.	४९९९.८३	४९३५	२०८१-११-२६	२०८२/०४/१५	२४९१	९९३.०१५	९९३.०१५	१९.८६१	२०	३९३५.००	७१.८२	सम्पन्न हुने
४३	अँधेरीखोला उपलटार एक्से सिंचाई, अजिरकोट २, गोरखा	गोरखा	१०	हे.	४१०३.६७	४०००	२०८१-११-२६			९९०.८४	९९०.८४	२४.१४५२	२५	२७००.००	४१२.८३	सम्पन्न हुने
४४	चारसय फाँटकुलो मर्मत योजना, भीमसेन थापा गा. पा.- ८	गोरखा	५०	हे.	३२१३	३२१३	२०८२-०१-२६			९८४.५५	९८४.५५	३०.६४२७	३२	२२१३.००		सम्पन्न हुने
४५	गैरी आँपटारीकुलो रातडौँडा पालुंगटार-२, गोरखा	गोरखा	१०	हे.	२२१२	२१०६	२०८२-०१-२६			९९२.८६	९९२.८६	४४.८८५२	४५	११०६.००	११३.१४	सम्पन्न हुने
४६	बाह्रविसे डूमरी कुलो निर्माण, पा.नपा-२	गोरखा	१०	हे.	३३१९	३२१३	२०८२-०१-२६			९९९.५२	९९९.५२	३०.११५१	३२	२२१३.००	१०६.४८	सम्पन्न हुने

क्र. सं.	कार्यक्रम/ आयोजनाको नाम	जिल्ला	अपेक्षित उपलब्धी		कुल लागत	स्रोत सुनिश्चित/	स्रोत सुनिश्चित मिति	सम्झौता मिति	सम्झौता रकम	खर्चको विवरण		हालसम्मको प्रगति %		२०८२/८	बाँकी दायित्व	कैफियत
४७	पहाडखोला बाट बस्ति संरक्षण कार्य , शुक्ला गण्डकी नपा ९	तनहुँ	३०	हे.	२४९७६	२४९७६	२०७८-११-१३	२०७८/२०७९	१८९४८.७३	१२०००	१९००५	१००	१००	१५००.००	४४७९.००	ठेक्का सम्पन्न
४८	डुम्रीबेसी सिंचाई योजना भिमाद १ र धिरीङ्ग २	तनहुँ	९७	हे.	७३४१०	७३४१०	२०७७-०२-१६	२०७६/२०७७	३८१८२	४११४.७८	३८०३७.७८	९९.६२	१००	५००.००	३४८७२.२२	ठेक्का सम्पन्न
४९	पदेलफाँट लुईटेल फाँट सिंचाई योजना, भानु-१०	तनहुँ	१०	हे.	१०७००	१०७००	२०७७-११-२०	२०७७/२०७८	६५८०	४६४.२८	५६८९.९१	८६.४७	८८	५००.००	४५१०.०९	सम्पन्न हुने
५०	नारेधर ताल जलाशय लिफ्ट सिंचाई योजना, व्यास-६	तनहुँ	१५	हे.	२५६९२	२५६९२	२०७७-११-२०	२०७७/२०७८	१९४११.७५	९१७६.८९	९१७६.८९	४७.२७	६०	३०००.००	१३५१५.११	सम्पन्न हुने
५१	छाब्दीफाँट एकीकृत सिंचाई योजना, व्यास न.पा. १	तनहुँ	२०	हे.	१९०६९	१९०६९	२०७८-११-१३	२०७८/२०७९	७३२०.१५५	०	४३५८.३२	५९.५३	६०	८००.००	१३९१०.६८	ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा रहेको
५२	साँगेखोला डुम्रे सुपारे तटबन्ध निर्माण, व्यास-५, तनहुँ	तनहुँ	०.५	हे.	४९९०	४९९०	२०७९-०८-०७	२०७९/२०८०	४०७१	२२६६.५५	४०६६.६५५	९९.९४	१००	१०००.००		सम्पन्न हुने
५३	मदीखोला ठुलो कुलो मर्मत कार्य, व्यास न.पा.-६	तनहुँ	२०	हे.	४९९०	४९९०		२०७९/२०८०	३७१९	२०२	३४३९.३४	९२.४८	९३	९४.००	१४५६.६६	सम्पन्न नहुने
५४	सिंगाले बाँध पक्की कुलो निर्माण, भिमाद-७	तनहुँ	१६	हे.	१००००	१००००	२०८०-११-१८	२०८०/२०८१	६१८८.८७	२८६५.३३	२८६५.३३	४६.२९	५०	१८००.००	५३३४.६७	सम्पन्न नहुने
५५	फेदीखोला कुतियाफाँट सिंचाई योजना मर्मत, भिमाद-५	तनहुँ	१२	हे.	१००००	१००००	२०८०-११-१८	२०८०/२०८१	६३३०.४२	४७२३.९	४७२३.९	७४.६२	८०	१९००.००		सम्पन्न हुने
५६	जिदिखोला पहिरो नियन्त्रण, भिमाद-६, मालेबगर	तनहुँ	८२	मि.	१००००	१००००	२०८०-११-१८	२०८०/२०८१	२१४०.८९	१८९०.३४	१८९०.३४	८८.२९	१००	१०००.००	७१०९.६६	ठेक्का सम्पन्न
५७	शिशाखोला बुल्दीखोला छविसे देखि घाँसीकुवा सम्म नदि नियन्त्रण कार्य, व्यास ११,१२ कार्य	तनहुँ	२	हे.	२००००	२००००	२०८०-१०-२२	२०८०/२०८१	१२४५२.८९	११८३६.२६	११८३६.२६	९५.०४	९६	४०००.००	४१६३.७४	ठेक्का सम्पन्न
५८	बेसारघारी सिंचाई योजना देवघाट-१, तनहुँ	तनहुँ	१५	हे.	१८९६५	१८९६५	२०७७-११-२०		१२११७.२८	०	१०४१२.५३	८५.९३	९२	१०००.००		सम्पन्न हुने
५९	कैडलेफाँट सिंचाई योजना,	तनहुँ	२३	हे.	४९८२.०	४९८२	२०८१-११-२६	२०८२/०४	३७२७	२०००	२०००	-	-	१८००.००		ठेक्का सम्पन्न

क्र. सं.	कार्यक्रम/ आयोजनाको नाम व्यास-६ र म्याग्दे-७	जिल्ला	अपेक्षित उपलब्धी		कुल लागत	स्रोत सुनिश्चित/	स्रोत सुनिश्चित मिति	सम्झौता मिति /१६	सम्झौता रकम	खर्चको विवरण		हालसम्मको प्रगति %		२०८२/८	बाँकी दायित्व	कैफियत
६०	संग्रामेटार सिंचाई योजना मर्मत कार्य, व्यास-८	तनहुँ	१०	हे.	४९७६.०	४९७६	२०८१-११-२६	२०८२/०४/१६	३४८९	१०००	१०००	-	-	२६००.००		सम्पन्न हुने
६१	बयकुना सिंचाई योजना, शुक्लागण्डकी नपा ११	तनहुँ	१४	हे.	४९९८.०	४९९८	२०८१-११-२६	प्याकेज २ खरिद प्रक्रियामा रहेको		२०००	२०००	-	-	१५००.००	१४९८.००	सम्पन्न नहुने
६२	चामेबगर सिंचाई योजना, म्याग्दे-३	तनहुँ	५	हे.	१९९९.०	१९९९	२०८१-११-२६			१०००	१०००	-	-	१०००.००		सम्पन्न हुने
६३	डाँप्रे खोला सिंचाई योजना, शुक्लागण्डकी-८	तनहुँ	१२	हे.	४९९७.०	४९९७	२०८१-११-२६	२०८२/०४/१६	३५२०	१०००	१०००	-	-	२६५०.००	१३४७.००	सम्पन्न नहुने
६४	जाम्दी सिंचाई योजना, शुक्लागण्डकी-६	तनहुँ	१२.५	हे.	४९९९.०	४९९९	२०८१-११-२६	प्याकेज २ खरिद प्रक्रियामा रहेको		२०००	२०००	-	-	१५००.००	१४९९.००	सम्पन्न नहुने
६५	सेराफाँट सिंचाई योजना (२० हे), शुक्लागण्डकी-१०	तनहुँ	२०	हे.	४९९९.०	४९९९	२०८१-११-२६	प्याकेज २ खरिद प्रक्रियामा रहेको		१०००	१०००	-	-	१५००.००	२४९९.००	सम्पन्न नहुने
६६	जरेबर सिंचाई योजना, शुक्लागण्डकी-०१	तनहुँ	१३	हे.	४९९९.०	४९९९	२०८१-११-२६	२०८२/०४/१६	३३२४	१०००	१०००	-	-	२८५०.००	११४९.००	सम्पन्न नहुने
६७	सिङ्हाले बाँध कुलो मर्मत तथा बाँगे खोला नियन्त्रण, शुक्लागण्डकी-८	तनहुँ	१०	हे.	४८७९.०	४८७९	२०८१-११-२६	२०८२/०४/१६	३७०५	१०००	१०००	-	-	२८५०.००	१०२९.००	सम्पन्न नहुने
६८	डाँडा साठी कुलो सिंचाई योजना, ऋषिड-६	तनहुँ	८	हे.	४९९७.०	४९९७	२०८१-११-२६	२०८२/०४/१६	२८५०	८४१	८४१	-	-	३०००.००	११५६.००	सम्पन्न नहुने
६९	आँपटार सिंचाई योजना, देवघाट-१	तनहुँ	२०	हे.	४९९७.०	४९९७	२०८१-११-२६	प्याकेज २ खरिद प्रक्रियामा रहेको		२०००	२०००	-	-	१६००.००	१३९७.००	सम्पन्न नहुने
७०	कोलेटार सिंचाई योजना, आँबुखैरेनी-१	तनहुँ	१०	हे.	४९९७.०	४९९७	२०८१-११-२६	२०८२/०४/१६	३८४७	२०००	२०००	-	-	१९५०.००		सम्पन्न हुने

आ.व. २०८१/८२ को वार्षिक प्रगति विवरण

क्र. सं.	कार्यक्रम/ आयोजनाको नाम	जिल्ला	अपेक्षित उपलब्धी		कुल लागत	स्रोत सुनिश्चित/	स्रोत सुनिश्चित मिति	सम्झौता मिति	सम्झौता रकम	खर्चको विवरण		हालसम्मको प्रगति %		२०८२/८	बाँकी दायित्व	कैफियत
७१	शेरा बर्राबोटे सिंचाई योजना, (४२ हे), भानु-९	तनहुँ	४२	हे.	४९९९.०	४९९९	२०८१-११-२६	२०८२/०४/१६	३४८४	१०००	१०००	-	-	२६००.००	१३९९.००	सम्पन्न नहुने
७२	साठीको बाँध कुलो सिंचाई योजना, बन्दीपुर-३	तनहुँ	२०	हे.	४९९७.०	४९९७	२०८१-११-२६	२०८२/०४/१६	४०२४	२०००	२०००	-	-	२१००.००		सम्पन्न हुने
७३	फदुवा छबिसे सिंचाई योजना, घिरिग	तनहुँ	१०	हे.	३९९८.०	३९९८	२०८१-११-२६	प्याकेज २ खरिद प्रक्रियामा रहेको		२०००	२०००	-	-	२०००.००		सम्पन्न हुने
७४	जोगीटार सिंचाई योजना, आँबुखैरेनी-१	तनहुँ	१०	हे.	४९९७.०	४९९७	२०८१-११-२६	प्याकेज २ खरिद प्रक्रियामा रहेको		२०००	२०००	-	-	१५००.००	१४९७.००	सम्पन्न नहुने
७५	सिलीडे धनुवाटार, लामाचौर बाँध कुलो मर्मत, बन्दीपुर-३	तनहुँ	२०	हे.	४९९७.०	४९९७	२०८१-११-२६	२०८२/०४/१६	४२६७	२०००	२०००	-	-	२३५०.००		सम्पन्न हुने
७६	ठुलाखोला सिंचाई कुलो आरुखर्क भानु-१०	तनहुँ	५	हे.	३९९८.०	३९९८	२०८१-११-२६	२०८२/०४/१६	३३६२	१०००	१०००	-	-	२४५०.००		सम्पन्न हुने
७७	चुँदीखोला चारसय बराह बाँध सिंचाई योजना, भानु-०६	तनहुँ	२०	हे.	४९९६.०	४९९६	२०८१-११-२६	२०८२/०४/१६	३९९४	१०००	१०००	-	-	३२००.००		सम्पन्न हुने
७८	देवानेखोला रैतरी पाखा खोल्सी व्यवस्थापन गरि पोखरी सिंचाई योजना, भानु-१	तनहुँ	५	हे.	४९९७.०	४९९७	२०८१-११-२६	प्याकेज २ खरिद प्रक्रियामा रहेको		२०००	२०००	-	-	३५००.००		सम्पन्न हुने
७९	फुलबारी बाँधकुलो, भिमाद-०३	तनहुँ	१०	हे.	४९९९.०	४९९९	२०८१-११-२६	२०८२/०४/१६	३८९६	१०००	१०००	-	-	३०५०.००		सम्पन्न हुने
८०	देविखोला-खहरे सिंचाई योजना, बन्दीपुर-४	तनहुँ	२९	हे.	३४९८.०	३४९८	२०८१-११-२६	प्याकेज २ खरिद प्रक्रियामा रहेको		२५००	२५००	-	-	१०००.००		सम्पन्न हुने
८१	कालिगण्डकी लिफ्ट सिंचाई योजना, देवघाट- ०५ ,तनहुँ	तनहुँ	१०	हे.	४९९७.०	४९९७.०	२०८१-११-२६	प्याकेज २ खरिद								

क्र. सं.	कार्यक्रम/ आयोजनाको नाम	जिल्ला	अपेक्षित उपलब्धी		कुल लागत	स्रोत सुनिश्चित/	स्रोत सुनिश्चित मिति	सम्झौता मिति	सम्झौता रकम	खर्चको विवरण		हालसम्मको प्रगति %		२०८२/८	बाँकी दायित्व	कैफियत
			१९	मि.												
८२	लामाखेत सिंचाई योजना, म्याग्दे- ६, तर्नहु	तनहुँ	१९	मि.	४९९९.८९	४९९९.८९	२०८१-११-२६	प्रक्रियामा रहेको								
८३	पहिरन खोल्सी, सामाखोल्सी, हुरमा, रिसिंग ०८	तनहुँ	२	हे.	४९६९	४९६९	२०८१-११-२६									
८४	चिर्दी खोला घट्टे कुलो सिंचाई योजना, फलेवास १०, पर्वत	पर्वत	३०	हे.	२५०००	१६०००	०७४/०७५	२०७५/०७/११	१२२१६.०३	०	६८४१	५६	८०	२१००.००	३२७५.०३	सम्पन्न नहुने
८५	पातिखोला सिंचाई योजना, मोदी-०२, पर्वत	पर्वत	५	हे.	३०००	३०००	२०८१-११-२६				१५००	५०	५५	१५००.००		सम्पन्न हुने
८६	मज्वाखोला देखि बास्कोट हुदै मानिकेटार सिंचाई योजना, फलेवास-७, पर्वत	पर्वत	१०	हे.	५०००	३०००	२०८१-११-२६				३०००	६०	७५	२०००.००		सम्पन्न हुने
८७	पुर्जाखोला सिंचाई योजना, जलजला -७, पर्वत	पर्वत	१५	हे.	२००००	५०००	२०८१-११-२६	२०८२/०३/०५	२६३३		१५६००	७८	८०	२७००.००		सम्पन्न हुने
८८	ठुलो कुलो सिंचाई योजना पैयुँ -०७, पर्वत	पर्वत	१५	हे.	१५०००	५०००	२०८१-११-२६	२०८२/०३/०५	२७८८.००		१२०००	८०	८२	२९००.००		सम्पन्न हुने
८९	नहरे कुलो सिंचाई योजना पैयुँ-५, पर्वत	पर्वत	२०	हे.	१००००	५०००	२०८१-११-२६	२०८२/०३/०८	१७०८.००		७०००	७०	७५	१८००.००		सम्पन्न हुने
९०	चौडिल्ला टारी सिंचाई योजना, बिहादी -५, पर्वत	पर्वत	१२	हे.	८०००	४०००	२०८१-११-२६				४०००	५०	६०	२०००.००		सम्पन्न हुने
९१	बुढीकुलो पंघाले सिंचाई कुलो स्तरोन्नति कुश्मा-१	पर्वत	१०	हे.	२५००	१५००	२०८२-०१-३०				१०००	४०	५०	१०००.००		सम्पन्न हुने
९२	साठीमुरे कुलोखेत योजना, कु.न.पा. ३, पर्वत	पर्वत	१०	हे.	४०००	४०००	२०८२-०१-३०				०	०	०	२०००.००	२०००.००	सम्पन्न नहुने
९३	ठुलो खेत सिंचाई योजना, फलेवास-३, पर्वत	पर्वत	१०	हे.	५५००	१०००	२०८२-०१-३०				४०००	७२.७२७३	७५	१०००.००		सम्पन्न हुने

क्र. सं.	कार्यक्रम/ आयोजनाको नाम	जिल्ला	अपेक्षित उपलब्धी		कुल लागत	स्रोत सुनिश्चित/	स्रोत सुनिश्चित मिति	सम्झौता मिति	सम्झौता रकम	खर्चको विवरण		हालसम्मको प्रगति %		२०८२/८	बाँकी दायित्व	कैफियत
९४	नयाँ कुलो सिंचाई योजना, कुश्मा-०१, पर्वत	पर्वत	१०	हे.	४५००	४०००	२०८२-०१-३०				१०००	२२.२२२२	३५	३०००.००		सम्पन्न हुने
९५	दादरखोला लाम्खुङ्ग बिरौटा सिंचाई योजना, काठेखोला ५ बिँहु, बागलुङ	बागलुङ	२०	हेक्टर	२४८४३	२४८४३	२०८०-११-१८	२०८१/८२	११६४७.३१	६५४	७२५२.४६	६२.२६७३	६५	४१००.००	२०००.००	सम्पन्न नहुने
	प्याकेज १								७४९३.३१	६५४	७२५२.४६	९६.७८५८	९८			पहिलो प्याकेज सम्पन्न
	प्याकेज २							२०८१/८२	४१५४	०	०	०	१०			सम्पन्न हुने
९६	मझुवाफाँट सिंचाई योजना, गल्कोट.न.पा. ६	बागलुङ	२४	हेक्टर	२००००	१८०००	२०८०-११-१८	२०८१/८२	५३११	३२२७.९०४	३२२७.९०४	६०.७७७७	६०	२२००.००	२०००.००	
९७	ठुलाखेत सिंचाई योजना जैमिनी न.पा. ९, बागलुङ	बागलुङ	१०	हेक्टर	९५०२	९५०२	२०८०-१०-२२	२०८०/८१	५४९१.८५७	४७२१.३३४	४७२१.३३४	८५.९६९७	७५	५००.००		म्याद सकिएको र ८७ % काम भएको तर म्याद थप नभएको ।
९८	तितिनखोला सिलगुम सिंचाई योजना, तमानखोला गा.पा. २ बागलुङ ।	बागलुङ	२०	हेक्टर	११११८	११११८	२०८०-१०-२२	२०८०/८१	६५६०.६२५	६४०७.९०१	६४०७.९०१	९७.६७२१	१००	१०००.००		सम्पन्न हुने
९९	ठुलाचौर ढाडखर्क ठुलाबेशी सिंचाई आयोजना बडीगाड ६	बागलुङ	५०	हेक्टर	४८५९६	४८५९६		२०७९/८०	३५४६७.११	५५०	२२५४१.७३	६३.५५६७	६५	१२४००.००		सम्पन्न हुने
	पहिलो प्याकेज							२०७९/८०	२२६२२.६२	०	२१९९१.७३	९७.२११२	९८			
	दोस्रो प्याकेज							२०८१/८२	१२८४४.४९	५५०	५५०	४.२८१९९	१०			सम्पन्न हुने

क्र. सं.	कार्यक्रम/ आयोजनाको नाम	जिल्ला	अपेक्षित उपलब्धी		कुल लागत	स्रोत सुनिश्चित/	स्रोत सुनिश्चित मिति	सम्झौता मिति	सम्झौता रकम	खर्चको विवरण		हालसम्मको प्रगति %		२०८२/८	बौकी दायित्व	कैफियत
१००	ढाब सिंचाइ योजना बरेड गा पा ४ बागलुङ	बागलुङ	२५	हेक्टर	२९९७	२९९७	२०८१/११/२६	आशयको सूचना जारी भएको	२५८५	९९१.५५९	९९१.५५९	३८.३५९९	४०	२०००.००		सम्पन्न हुने
१०१	ढाण पिपलबोट बाट अर्चले देखि खोडेला आयोजना बा न पा ३	बागलुङ	१०	हेक्टर	४९९९	४९९९	२०८१/११/२६	आशयको सूचना जारी भएको	३२१५	१५०७.८९८	१५०७.८९८	४६.९०७५	५०	३०००.००		सम्पन्न हुने
१०२	गैरी विरोटा सिंचाइ योजना बा न पा १२	बागलुङ	२५	हेक्टर	४९७१	४९७१	२०८१/११/२६	आशयको सूचना जारी भएको	३८३८	९६०	९६०	२५.०१	३०	३५००.००		सम्पन्न हुने
१०३	गौदिखोला मसानघाट देखि काउलेफाँट सिंचाइ कुलो स्तरउन्नती गल्कोट न पा १	बागलुङ	१०	हेक्टर	४९९८	४९९८	२०८१/११/२६	आशयको सूचना जारी भएको	३०२०		०	०	५	४५००.००		सम्पन्न हुने
१०४	राक्से सिंचाइ कुलो निर्माण बडिगाड गा पा २	बागलुङ	१०	हेक्टर	३११३	३११३	२०८१/११/२६	आशयको सूचना जारी भएको	२५८१	१०९४.५०५	१०९४.५०५	४२.४११	५०	२१००.००		सम्पन्न हुने
१०५	रियाले काप्रे खेत सिंचाइ पोखरी बा न पा ७	बागलुङ	१०	हेक्टर	१९९७	१९९७	२०८१/११/२६		१९९७	९८७.३६१	९८७.३६१	०	५०	१०००.००		सम्पन्न हुने
१०६	कोत्र्याहा कुलो सिंचाइ योजना, मध्येनेपाल नपा ३	लम्जुङ	१५	हे	९७१२	९७१२	२०७९-०७-०२	२०७९/२०८०	६१६४.९८	२७१८	४१७६	६७.७४	६८.७४	२५००.००		सम्पन्न हुने
१०७	खहरे सिंचाइ योजना दोर्दी-९, लमजुङ	लम्जुङ	२७	हे	१२९२०.०५	१२९२०.०५	२०७६-११-०८	२०७६/२०७७	८२२५.३२	०	२०९०	२५.४१	२६.४१	२०००.००	४१३५.३२	सम्पन्न नहुने
१०८	दोभान खोला बृहत सिंचाइ योजना कलोहोसोथर ५, लमजुङ	लम्जुङ	५०	हे	१८०००	१८०००	२०७६-११-०८	२०७६/२०७७	८६८५.१८	०	४०१२	४६.१९	४७.१९	२५००.००	२१७३.१८	सम्पन्न नहुने
१०९	सिमजुङ सिंचाइ योजना, दोर्दी ४, लमजुङ	लम्जुङ	२५	हे	९९७६	९९७६	२०७६-११-०८	२०७६/२०७७	६९२३.८२	१८८४	३६२७	५२.३९	५३.३९	२०००.००	१२९६.३७	सम्पन्न नहुने
११०	रिस्ती खोला नियन्त्रण कार्य, मध्येनेपाल न.पा	लम्जुङ	२४०	मि	१५०००	१५०००	२०८०-११-१८	२०८०/२०८१	९४८२.५	७००२	७९०२	८३.३३	८४.३३	२८००.००		
१११	मोहना छहरा सिंचाइ योजना कलोहोलासोथर ७ लम्जुङ	लम्जुङ	३०	हे.	४९९६	४९९६	२०८१-११-२६	२०८२/०८३		८०६	८०६	२०	२५	२०००.००	२१९०.००	सम्पन्न हुने

क्र. सं.	कार्यक्रम/ आयोजनाको नाम	जिल्ला	अपेक्षित उपलब्धी		कुल लागत	स्रोत सुनिश्चित/	स्रोत सुनिश्चित मिति	सम्झौता मिति	सम्झौता रकम	खर्चको विवरण		हालसम्मको प्रगति %		२०८२/८	बाँकी दायित्व	कैफियत
११२	सिम्लेखोला दालखोला सिँचाइ तथा तटबन्ध, राईनास-०५	लम्जुंग	१२	हे.	३०००	३०००	२०८१-११-२६	२०८२/०८३		९९३	९९३	३३	३५	२०००.००		सम्पन्न हुने
११३	खहरे खोला नयाँ कुलो सि. यो, बेसिहहर - २	लम्जुंग	८	हे.	४०००	४०००	२०८१-११-२६	२०८२/०८३		१९९६	१९९६	५०	५०	२०००.००		सम्पन्न हुने
११४	किसेदि लामाबगर सिँचाई योजना, दोर्दी गा.पा. ३	लम्जुंग	१०	हे.	३०००	३०००	२०८१-११-२६	२०८२/०८३		१९३५	१९३५	६०	६५	१०००.००		सम्पन्न हुने
११५	पिरसिङ सिँचाई योजना बेसिहहर ४ लमजुङ	लम्जुंग	६	हे.	३०००	३०००	२०८१-११-२६	२०८२/०८३		१६५८	१६५८	५०	५०	१०००.००		सम्पन्न हुने
११६	बेलटारी सिँचाई योजना, मध्येनेपाल २, लम्जुंग	लम्जुंग	११	हे.	४०००	४०००	२०८१-११-२६	२०८२/०८३		९९५	९९५	३०	३५	३०००.००		सम्पन्न हुने
११७	पिप्ले सिँचाई योजना बेसीसहर १	लम्जुंग	१०	हे.	२०००	२०००	२०८१-११-२६	२०८२/०८३		९८३	९८३	५०	५०	१०००.००		सम्पन्न हुने
११८	चालिसे कुलो सिँचाइ योजना, सुन्दरबजार-४	लम्जुंग	७	हे.	३०००	३०००	२०८१-११-२६	२०८२/०८३		१०००	१०००	३०	३५	२०००.००		सम्पन्न हुने
११९	घामांगबेशी सिचाई योजना क्यालोसोथार ०८	लम्जुंग	२३	हे.	४९९६	४९९६	२०८२-०१-३०	२०८२/०८३		१०००	१०००	२०	२०	२०००.००		सम्पन्न हुने
१२०	चर्दी बडहरे सिचाई योजना ,मध्यनेपाल ४	लम्जुंग	१२	हे.	४९९६	४९९६	२०८२-०१-३०	२०८२/०८३		१०००	१०००	२०	२०	३२००.००		सम्पन्न हुने
१२१	नेपाल आदर्श स्कूल मुनि देखि काफलडाँडा जाने सडकको भुङ्गाने कलभर्ट देखि खोला नियन्त्रण तथा तटबन्धन, वालिङ नपा - ८, स्याङ्जा	स्याङ्जा	०.२५	कि. मि.	१००००	१००००	२०८०-११-१८	२०८१-०२-१३	६५४०	४०१४	४९६४	७६	७६	१५००	७६.००	सम्पन्न हुने
१२२	हिरामराड सिचाइ योजना चापाकोट नगरपालिका ५	स्याङ्जा	१०	हे.	१५०००	१५०००	२०८०-११-१८	२०८१-०२-१६	९४६३	६३२१	७७४१	८१	८१	२०००.००		सम्पन्न हुने

क्र. सं.	कार्यक्रम/ आयोजनाको नाम (१० हेक्टर)	जिल्ला	अपेक्षित उपलब्धी		कुल लागत	स्रोत सुनिश्चित/	स्रोत सुनिश्चित मिति	सम्झौता मिति	सम्झौता रकम	खर्चको विवरण		हालसम्मको प्रगति %		२०८२/८	बाँकी दायित्व	कैफियत
१२३	एकीकृत बेलादी कुलो सिंचाइ तथा पिडिखोला तटबन्धन कोब्राबोटे गल्यांग-६	स्याङ्जा	८	हे.	९९९८	९९९८	२०८०-१०-२२	२०८१-०२-१३	६४०९	४००९	५१२९	८०	८१	११००.००	१८०.००	सम्पन्न हुने
१२४	तल्लो बलौटे शोरा सिंचाई योजना चापाकोट ९ स्यांगजा	स्याङ्जा	१५	हे.	४८१०	३०००	२०८१-११-२६	२०८२/८३	४३२९	१९७५	३८१०	७९	७९	१०००.००		सम्पन्न हुने
१२५	खरखरे सिंचाई योजना, आँधिखोला गा.पा. १ को नहर तथा सरचना निर्माण कार्य	स्याङ्जा	१५	हे.	४०९७	२०००	२०८१-११-२६	२०८२/८३	४०९७	९५३	३०९७	७५	७५	१०००.००		सम्पन्न हुने
१२६	भुते ढुंगा भुजुंगे सिंचाई योजना, आँधिखोला गापा - २, स्याङ्जा	स्याङ्जा	१०	हे.	४१६३	३०००	२०८१-११-२६	२०८२/८३	४१६३	९९७	२१६३	५१	५१	१५००.००	५००.००	सम्पन्न हुने
१२७	डिही छापटारी सिंचाई योजना, आँधिखोला गा.पा.६ को नहर तथा सरचना निर्माण कार्य	स्याङ्जा	५	हे.	३४३७	१५००	२०८१-११-२६	२०८२/८३	३४३७	४८२	२४३७	७०	७०	१०००.००		सम्पन्न हुने
१२८	तिलिम हर्जमुनी सिंचाई योजना, आँधिखोला गा.पा.२ को नहर तथा सरचना निर्माण कार्य	स्याङ्जा	१०	हे.	३१६९	२०००	२०८१-११-२६	२०८२/८३	३१६९	८७५	२१६९	६८	६८	१०००.००		सम्पन्न हुने
१२९	सेतीखोला स्थानेचौर सिंचाई योजना फेदिखोला	स्याङ्जा	२५	हे.	६६११	४८००	२०८१-११-२६	२०८२/८३	६६११	१९८९	३८११	५७	५७	२४५०.००	३५०.००	सम्पन्न हुने
१३०	बिना इन्धन पानी तान्ने (हाइ पम्प) सिंचाई योजना परिक्षण, लबरकोट, स्याङ्जा	स्याङ्जा	१०	हे.	९१९१	३०००	२०८१-११-२६	२०८२/८३	९१९१	२६३	७१९१	७८	७८	१०००.००	१०००.००	सम्पन्न हुने
१३१	असिमुरे सातविसे सिंचाई योजना सेतीदोभान स्याङ्जा	स्याङ्जा	१५	हे.	७८१७	३०००	२०८१-११-२६	२०८२/८३	७८१७	९८४	५८१७	७४	७४	१५००.००	५००.००	सम्पन्न हुने
१३२	पञ्चमुल मियाले धौरीखेत सिंचाई कुलो आयोजना वालिङ-११ स्याङ्जा	स्याङ्जा	५०	हे.	१००२३	४७००	२०८१-११-२६	२०८२/८३	१००२३	२८.५२	८३२३	८३	८३	१७००.००		सम्पन्न हुने

क्र. सं.	कार्यक्रम/ आयोजनाको नाम	जिल्ला	अपेक्षित उपलब्धी		कुल लागत	स्रोत सुनिश्चित/	स्रोत सुनिश्चित मिति	सम्झौता मिति	सम्झौता रकम	खर्चको विवरण		हालसम्मको प्रगति %		२०८२/८	बाँकी दायित्व	कैफियत
१३३	धनुवासे सिंचाई योजना हरिनास-७ स्याङ्जा।	स्याङ्जा	१०	हे.	६१५९	३०००	२०८१-११-२६	२०८२/८३	६१५९	९८०	४१५९	६७	६७	१५००.००	५००.००	सम्पन्न हुने
१३४	बृहत कुरुङ्गे सिंचाई कुलो योजना, गल्याङ नपा -४, स्याङ्जा	स्याङ्जा	१२	हे.	६०६६	४७५०	२०८१-११-२६	२०८२/८३	६०६६	२४६८	३८१६	६२	६२	२२५०.००		सम्पन्न हुने
१३५	छहरा क्यादी सिंचाई योजना गल्याङ नपा ४ स्याङ्जा	स्याङ्जा	२५	हे.	१०५१०	४७५०	२०८१-११-२६	२०८२/८३	१०५१०	२५००	८२६०	७८	७८	२२५०.००		सम्पन्न हुने
१३६	मान्के खेला सिस्टेरी सिंचाई गल्याङ ७	स्याङ्जा	१५	हे.	७८८७	४५००	२०८१-११-२६	२०८२/८३	७८८७	१९९९	५३८७	६८	६८	२०००.००	५००.००	सम्पन्न हुने
१३७	सम्धिखोला बुढीकुलो सिंचाई योजना, आँधिखोला गापा - ६, स्याङ्जा	स्याङ्जा	१५	हे.	४५९५	४५००	२०८१-११-२६	२०८२/८३	४५९५	९८९	१०९५	२३	२३	२४००.००	११००.००	सम्पन्न हुने
१३८	एकराएँ सिंचाई, आँधिखोला गापा - ५ स्याङ्जा	स्याङ्जा	१०	हे.	४५९६	४५००	२०८१-११-२६	२०८२/८३	४५९६	५१२	१०९६	२३	२३	२०००.००	१५००.००	सम्पन्न हुने
१३९	माडी सिंचाई योजना, चापाकोट नपा- ८, स्याङ्जा	स्याङ्जा	४०	हे.	४९९१	४८००	२०८१-११-२६	२०८२/८३	४९९१	१९९२	२९९१	४३	४३	२०००.००	८००.००	सम्पन्न हुने
१४०	सयत्मा सिंचाई योजना, हरिनास गापा- ६, स्याङ्जा	स्याङ्जा	१०	हे.	६०७४	४८००	२०८१-११-२६	२०८२/८३	६०७४	१९८७	३२७४	५३	५३	२०००.००	८००.००	सम्पन्न हुने
१४१	डुम्रीकोट, अर्चलखोला, मियाले, खुकुरो, झाउरीखेत सिंचाई कुलो, बालीङ नपा - ११, स्याङ्जा	स्याङ्जा	१५	हे.	६०७२	४८००	२०८१-११-२६	२०८२/८३	६०७२	१९९२	३२७२	५३	५३	२४००.००	४००.००	सम्पन्न हुने
१४२	एकिकृत बायाखोला सियाले सेरेमैने आमबोटे बडारे सिंचाई कुलो, बालीङ नपा - १४, स्याङ्जा	स्याङ्जा	१५	हे.	६०६१	४८००	२०८१-११-२६	२०८२/८३	६०६१	१८३७	३२६१	५३	५३	२४००.००	४००.००	सम्पन्न हुने
१४३	उदियाचौर सिंचाई योजना, बालिङ १३	स्याङ्जा	१५	हे.	१०१६३	४८००	२०८१-११-२६	२०८२/८३	१०१६३	२०००	७३६३	७२	७२	२५००.००	३००.००	सम्पन्न हुने
१४४	धरादी तिवारीथोक, सरीखोला सिंचाई योजना बालिङ १४	स्याङ्जा	१५	हे.	१०८८७	४८००	२०८१-११-२६	२०८२/८३	१०८८७	१९१४	८०८७	७४	७४	१०००.००	१८००.००	सम्पन्न हुने
१४५	बटेदार कुसुन्ने सिंचाई	स्याङ्जा	२०	हे.	८७६४	४९००	२०८१-११-२६	२०८२/८३	८७६४	९९६	४८६४	५५	५५	२०००.००	१९००.००	सम्पन्न हुने

क्र. सं.	कार्यक्रम/ आयोजनाको नाम योजना, गल्याड ९	जिल्ला	अपेक्षित उपलब्धी		कुल लागत	स्रोत सुनिश्चित/	स्रोत सुनिश्चित मिति	सम्झौता मिति	सम्झौता रकम	खर्चको विवरण		हालसम्मको प्रगति %		२०८२/८	बाँकी दायित्व	कैफियत
१४६	खास्ती दिम्पा बैदा कुलो सिंचाई चापाकोट ८	स्याङ्जा	३५	हे.	१०११९.७	४९००	२०८१-११-२६	२०८२/८३	१०१२०	९३७	६२१९.७	६१	६१	२०००.००	१९००.००	सम्पन्न हुने
१४७	बिर्घाटार एकिकृत सिंचाई योजना कालिगण्डकी गा. पा .३ र ४	स्याङ्जा	३०	हे.	२००००	२००००	२०८०-११-१८	२०८१-०२-२५	१३२४१	८७३६	१०७३६	८१	८२	२०००.००	५०५.००	सम्पन्न हुने
१४८	बादुक सिंचाई योजना, रघुगंगा गा पा -१, म्याग्दी	म्याग्दी	२५	हे.	१९९००	१९९००	२०८०-११-१८	२०८०/२०८१	१२४८३	१८४.७१७	२१८४.७१७	१७.५	२५	६०००.००	४२९८.२८	सम्पन्न नहुने
१४९	घोरेनी कोत्रेबाङ्ग सिम सिंचाई योजना, मंगला गा.पा.२ को नहर तथा संरचना निर्माण कार्य	म्याग्दी	१२	हे.	१३२००	१३२००	२०८०-११-१८	२०८०/२०८१	९०५१	३२९७.२	४२९७.२	४७	१००	५००.००	४२५३.८०	सम्पन्न
१५०	वेगखोला वृहत सिंचाई योजना रघुगंगा गा.पा. १ म्याग्दी	म्याग्दी	२५	हे.	४०००	४०००	२०८१-११-२६		४०००	१९३४.८५	१९३४.८५	४८.३७	६०	१०००.००	१०६५.१५	आवश्यक बजेटको व्यवस्था
१५१	राखुपिप्ले सिंचाई योजना रघुगंगा गा. पा. ३ म्याग्दी	म्याग्दी	१०	हे.	४०००	४०००	२०८१-११-२६		४०००	१८१९.८४८	१८१९.८४८	४५.४९६२	६०	१५००.००	६८०.१५	भएमा यस आ.व. २०८२/०८३ मा सम्पन्न हुने
१५२	बुकेनी सिंचाई योजना, मंगला गा.पा. ४ म्याग्दी	म्याग्दी	१५	हे.	५०००	५०००	२०८१-११-२६	६६५००	३३७५	३१८०.८५	३१८०.८५	९४.२४७४	९५	५००.००		सम्पन्न हुने
१५३	गौराखोला सिंचाई योजना, मालिका गा.पा. ५	म्याग्दी	२१	हे.	५०००	५०००	२०८१-११-२६	२०८२-०१-२४	४७४५	२४२४.१६५	२४२४.१६५	५१.०८८८	६०	२०००.००	३२०.८४	सम्पन्न नहुने
१५४	तल्लो ओखलढुंगा गडहरे खोला सिंचाई योजना, मंगला गा. पा. २, म्याग्दी	म्याग्दी	१५	हे.	५०००	५०००	२०८१-११-२६	२०८२-०१-२४	३७३९	२२४६.५६५	२२४६.५६५	६०.०८७९	६०	१०००.००	४९२.२४	सम्पन्न नहुने
१५५	औलो सिंचाई योजना अन्नपूर्ण गा.पा. ७ म्याग्दी	म्याग्दी	८०	हे.	४२१०	४२१०	२०८२-०१-३०		४२१०	७४१.२८८	७४१.२८८	१७.६०७८	८०	१०००.००	२४६८.७१	सम्पन्न नहुने
१५६	१९२५ साले सिंचाई योजना बेनी नगरपालिका १ म्याग्दी	म्याग्दी	२१	हे.	४९९४	४९९४	२०८२-०१-३०		४९९४	८८६.९६७	८८६.९६७	१७.७६०७	४०	३०००.००	११०७.०३	सम्पन्न नहुने

आ.व. २०८१/८२ को वार्षिक प्रगति विवरण

क्र. सं.	कार्यक्रम/ आयोजनाको नाम	जिल्ला	अपेक्षित उपलब्धी		कुल लागत	स्रोत सुनिश्चित/	स्रोत सुनिश्चित मिति	सम्झौता मिति	सम्झौता रकम	खर्चको विवरण		हालसम्मको प्रगति %		२०८२/८	बाँकी दायित्व	कैफियत
१५७	बेलिफ लुर्वाङ्ग सिचाई आयोजना मालिका ७ म्याग्दी	म्याग्दी	२७	हे.	३५२३	३५२३	२०८२-०१-३०		३५२३	१८६५.९२१	१८६५.९२१	५२.९६४	९०	१०००.००	६५७.०८	सम्पन्न नहुने
१५८	केश सिचाई योजना मालिका गा.पा. १ म्याग्दी	म्याग्दी	१८	हे.	४०००	४०००	२०८२-०१-३०		४०००	१३३१.१०७	१३३१.१०७	३३.२७७७	५०	१८००.००	८६८.८९	सम्पन्न नहुने
१५९	बगही डिप ट्युबेल बोर्डिङ उ.स., मध्यविन्दु नपा १, पतवारी	नवलपुर	३०	हे.	५०००	५०००	२०८१-११-२६		५०००	२०००	३८००	१००	६०	२०००.००	१०००.००	सम्पन्न नहुने
१६०	सियाखाने रातडाडा अन्वेषण डिप ट्युबेल सिचाई योजना, भिमाद ७, तनहु	तनहुँ	५	हे.	४६००	४६००	२०८१-११-२६		४६००	१६००	३३५०	१००	५०	१२००.००	२०००.००	सम्पन्न नहुने
१६१	एकिकृत डिप ट्युबेल सिचाई प्रणाली, देवचुली ४,	नवलपुर	१५	हे.	५०००	५०००	२०८१-११-२६		५०००	१५००	४५००	७०	७०	२०००.००	५००.००	सम्पन्न नहुने
१६२	घारी मेरेतारा डिप ट्युबेल सिचाई योजना, शुक्लागण्डकी -०९, तनहु	तनहुँ	५	हे.	४४००	४३३६	२०८२/०१/२६			१७००	१७००	३०	३०	२०००.००	२०००.००	सम्पन्न नहुने
	जम्मा								९८३८८१	३५८२०४	७७५५०८			३६३६०९	२०८३४१	

सारांश

२०८१/८२ मा सम्पन्न आयोजना	२५
२०८२/८३ मा सम्पन्न भैसकेका योजना	०
२०८२/८३ मा सम्पन्न हुनसक्ने आयोजना	७०
आगामी आ.व. मा सम्पन्न हुनसक्ने आयोजना	९२
जम्मा आयोजना	१८७

१०. सन्दर्भ सामग्री

- मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४
- प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, गण्डकी प्रदेश, प्रदेशको स्थिति पत्र, २०७५
- प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, गण्डकी प्रदेश, प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (२०७६/७७-२०८०/८१)
- प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, गण्डकी प्रदेश, दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (२०८१/८२-२०८५/८६)
- सिंचाइ गुरुयोजना, २०१९ (अद्यावधिक, २०२४)
- नमूना कृषि गणना, २०७८
- नेपाल विद्युत प्राधिकरण, वार्षिक पुस्तिका, २०८२/८३
