

गण्डकी प्रदेश सरकार
ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय
पोखरा, नेपाल



आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रगति पुस्तिका



श्रावण, २०८३

प्रकाशन: ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश

टेलिफोन नं.: ०६१-४५०७७१, ४५०८३२, ४५०८३३

सूचना अधिकारी: ९८५६०१७२०४

वेबसाइट: <http://moewrws.gandaki.gov.np>

इमेल: moewrws.gandaki@gmail.com

सर्वाधिकार: ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश

प्राक्थान

प्रदेशस्तरको ऊर्जा, विद्युत, सिंचाइ, खानेपानी, जल उत्पन्न प्रकोप (नदी तथा पहिरो) व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान, नीति कानून, मापदण्ड, गुरुयोजना, योजना तथा आयोजना निर्माण, कार्यान्वयन सञ्चालन, मर्मत संभार गरी प्रदेशभित्र जलस्रोत (ऊर्जा, सिंचाइ र खानेपानी) को समुचित व्यवस्थापन गर्नु यस मन्त्रालयको मुख्य कार्य जिम्मेवारी रहेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषदको पहिलो दिन (२०७४ फाल्गुण ४ गते) को निर्णय अनुसार प्रदेशका सबै घर बस्तीमा विद्युतको पहुँच पुर्याउनको लागि “उज्यालो गण्डकी प्रदेश” अभियान र सबै घरमा निजी धारा जडान गर्नका लागि “एक घर एक धारा” कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरी सोहि अनुसार विविध कार्यक्रमहरू निरन्तर रूपमा कार्यान्वयन भईरहेका छन्। खेति योग्य जमिनमा “बाह्र महिना सिंचाइ” सुविधा पुर्याउनको लागि सिंचाइ का सतह, भूमिगत र लिफ्ट तथा नवीनतम प्रविधिमा आधारित सिंचाइ आयोजनाहरू कार्यान्वयन गरिरहेको छ।

यस पुस्तिकामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यस मन्त्रालयको ऊर्जा, जलस्रोत, सिंचाइ तथा खानेपानी क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रदेश सरकारका आयोजना तथा नेपाल सरकारबाट सशर्त तथा विशेष अनुदानका रूपमा कार्यान्वयनका लागि प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका आयोजना र कार्यक्रमहरू, मन्त्रालय आफै र मातहतका कार्यालयहरूबाट कार्यान्वयन भएका विवरणहरू समावेश भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूबाट सञ्चालन भएका क्रियाकलापहरू, तिनको कार्यान्वयन अवस्था, प्रगति तथा उपलब्धिको अवस्था, २०७४ सालमा गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापना भए पश्चात् प्रादेशिक तहबाट हालसम्म भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा हासिल भएका विषय-क्षेत्रगत कुल उपलब्धिको झलक सहित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा देखिएका समस्या र चुनौतीहरू तथा तिनको निराकरणका लागि गरिएको प्रयास लगायतका विषयमा आम नागरिक र सरोकारवालाहरूलाई सुसूचित गर्न तथा वार्षिक प्रगतिको अभिलेखीकरण समेत गर्नको लागि प्रस्तुत वार्षिक प्रगति पुस्तिका प्रकाशन गरिएको छ।

विषयसूची

१. परिचय	६
१.१ मन्त्रालयको पृष्ठभूमि र कार्यक्षेत्र	६
१.२ मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारी	७
२. विद्यमान अवस्था	११
२.१ ऊर्जा	११
२.२ सिंचाइ तथा नदी व्यवस्थापन	१२
२.३ खानेपानी तथा सरसफाइ	१४
३. बजेट विनियोजन र खर्चको विवरण	१७
३.१ आर्थिक वर्ष २०८२।८३ मा मन्त्रालयको स्रोतगत बजेट विनियोजन र खर्चको विवरण	१७
३.२ बजेटको लक्ष्य र खर्चको वार्षिक प्रवृत्ति तुलनात्मक विवरण:	१८
३.३ आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को त्रैमासिक रूपमा कुल खर्चको प्रवृत्ति:	१९
३.४ आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को बजेट उपशीर्षकगत वित्तीय प्रगति:	२१
३.५ आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को क्षेत्रगत वित्तीय प्रगति:	२३
३.६ यस मन्त्रालयको आ.व. २०८२/८३ मा प्राप्त विनियोजित बजेट र खर्चको स्रोतगत रूपमा कुल खर्चको प्रगति विवरण तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।	
(रु. हजारमा)	२४
४. आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक कार्यक्रमको प्रगति/उपलब्धी विवरण	२७
४.१ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनबाट हासिल भएका मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू:	२७
४.२ आ.व. २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा समावेश भएका कार्यक्रमको प्रगति विवरण	२९
४.३ आ.व. २०८२/८३ सम्मको लिफ्टिङ खानेपानी र सिंचाइ आयोजनाहरूमा विद्युत महशुल भुक्तानी अनुदान (रु. हजारमा)	३१
४.४ आ.व. २०८२/८३ मा कार्यान्वयन भएका ऊर्जा, सिंचाइ, नदी व्यवस्थापन र खानेपानी योजनाहरूबाट सिर्जना भएको रोजगारी व्यक्तिदिन	३१
४.५ दोस्रो पञ्च वर्षीय योजना लक्ष्य र उपलब्धी	३२
४.६ दिगो विकास लक्ष्य र उपलब्धी	३३
५. राजस्व संकलन र बेरुजुको विवरण	३४
५.१ राजस्व संकलनको विवरण	३४
५.२ बेरुजुको संक्षिप्त विवरण (रु.) :-	३४

६. बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका मुख्य समस्या, चुनौती तथा समाधानका उपायहरू	३५
६.१ मुख्य समस्या र समाधानका लागि मन्त्रालयले गरेका प्रयासहरू	३५
६.२ बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा देखिएका अन्य समस्या तथा चुनौतीहरू ..	३६
६.३ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ऐन/नियम तर्जुमाको विवरण	३९

७. आ.व. २०८२/८३ मा यस मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूबाट गरिएका कार्यक्रमका प्रतिनिधिमुलक जलकहरू: ४०

८. अनुसूचीहरू ६३

८.१ घरेलू सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान	६३
८.२ संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान	६३
८.३ लघु जलविद्युत मर्मत गरिएका आयोजनाहरू	६५
८.४ गण्डकी प्रदेश सरकारको लगानीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय, पोखराबाट कार्यान्वयन भएको विद्युत विस्तार कार्यको उपलब्धि विवरण :	६५
८.५ ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरूबाट आ.व. २०७५/७६ देखि आ.व. २०८२/८३ सम्म सम्पन्न भएका ऊर्जा सम्बन्धी अन्य कार्यक्रमको जिल्लागत उपलब्धीहरू:	६६
८.६ प्रदेश सरकारबाट सिंचाइ क्षेत्रमा आ.व. २०७५/७६ देखि २०८२/८३ सम्म भएको जिल्लागत उपलब्धी विवरण	६७
८.७ प्रदेश सरकारबाट नदी व्यवस्थापन क्षेत्रमा आ.व. २०७५/७६ देखि २०८२/८३ सम्म भएको जिल्लागत उपलब्धी विवरण	६९

९. सन्दर्भ सामग्री ७१

१. परिचय

१.१ मन्त्रालयको पृष्ठभूमि र कार्यक्षेत्र

गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७४/११/०४ को निर्णयानुसार प्रदेश सरकार, प्रदेश नं. ४ (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ स्वीकृत गरि ऊर्जा, सिंचाइ , नदी नियन्त्रण र खानेपानी तथा सरसफाई कार्य क्षेत्र समेत हेर्ने गरि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको स्थापना भएको थियो। गण्डकी प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८/०२/०५ को निर्णयानुसार गण्डकी प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को अनुसूचीमा हेरफेर भै ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको स्थापना भएको हो। तत्पश्चात गण्डकी प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७९/१०/०९ को निर्णयानुसार गण्डकी प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को अनुसूचीमा हेरफेर भै कृषि, ऊर्जा, सिंचाइ र खानेपानी क्षेत्र एक आपसमा गाभेर कृषि, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयको स्थापना भएको थियो। गण्डकी प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०/०१/२८ को निर्णयानुसार गण्डकी प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को अनुसूचीमा हेरफेर भै साविक बमोजिम नै मन्त्रालय छुट्टयाई पुनः ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको स्थापना भएको थियो।

प्रदेशस्तरको ऊर्जा, विद्युत, सिंचाइ , खानेपानी, जल उत्पन्न प्रकोप (नदी तथा पहिरो) व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान, नीति कानून, मापदण्ड, गुरुयोजना, योजना तथा आयोजना निर्माण, कार्यान्वयन सञ्चालन, मर्मत संभार गरी प्रदेशभित्र जलस्रोत (ऊर्जा, सिंचाइ र खानेपानी) को समुचित व्यवस्थापन गर्नु यस मन्त्रालयको मुख्य कार्य जिम्मेवारी रहेको छ।

आ.व. २०८२/८३ मा गण्डकी प्रदेशका ११ वटा जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको यस मन्त्रालय अन्तर्गत निम्नानुसारका १५ वटा कार्यालयहरू रहेका थिए:

क्र.सं.	कार्यालय	कार्यक्षेत्र	मुख्य कार्यहरू
१	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, स्याङ्जा	कास्की, स्याङ्जा	खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता
२	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, बागलुङ	बागलुङ, पर्वत	खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता
३	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, तनहुँ	तनहुँ, नवलपुर	खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता
४	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, गोरखा	गोरखा, लमजुङ	खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता
५	जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, बागलुङ	बागलुङ	ऊर्जा, सिंचाइ तथा नदी व्यवस्थापन
६	जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन	पर्वत	ऊर्जा, सिंचाइ तथा नदी व्यवस्थापन

क्र.सं.	कार्यालय	कार्यक्षेत्र	मुख्य कार्यहरू
	कार्यालय, पर्वत		
७	जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, कास्की	कास्की	ऊर्जा, सिंचाइ तथा नदी व्यवस्थापन
८	जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, तनहुँ	तनहुँ	ऊर्जा, सिंचाइ तथा नदी व्यवस्थापन
९	जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, स्याङ्गजा	स्याङ्गजा	ऊर्जा, सिंचाइ तथा नदी व्यवस्थापन
१०	जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, लमजुङ	लमजुङ	ऊर्जा, सिंचाइ तथा नदी व्यवस्थापन
११	जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, गोरखा	गोरखा	ऊर्जा, सिंचाइ तथा नदी व्यवस्थापन
१२	जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, नवलपुर	नवलपरासी (ब.सु.पू.)	ऊर्जा, सिंचाइ तथा नदी व्यवस्थापन
१३	खानेपानी, जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, म्याग्दी	म्याग्दी	ऊर्जा, सिंचाइ, नदी व्यवस्थापन, खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता
१४	खानेपानी, जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, मुस्ताङ्ग	मुस्ताङ्ग	ऊर्जा, सिंचाइ, नदी व्यवस्थापन, खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता
१५	खानेपानी, जलश्रोत तथा सिंचाई विकास सब-डिभिजन कार्यालय, मनाङ्ग	मनाङ्ग	ऊर्जा, सिंचाइ, नदी व्यवस्थापन, खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता

१.२ मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारी

गण्डकी प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ अनुसार यस मन्त्रालयको लागि तोकिएको कार्य जिम्मेवारी निम्न अनुसार रहेका छन्:-


१. प्रदेशस्तरको ऊर्जा विद्युत, सिंचाइ, खानेपानी, जल उत्पन्न प्रकोप (नदी तथा पहिरो) व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान, नीति कानून, मापदण्ड गुरुयोजना योजना तथा आयोजना निर्माण, कार्यान्वयन सञ्चालन, मर्मत संभार समन्वय र नियमन
२. प्रदेशस्तरमा ऊर्जा, विद्युत, सिंचाइ तथा खानेपानी सम्बन्धी सेवाको गुणस्तर र सेवा शुल्कको आधार निर्धारण र नियमन
३. ऊर्जा, विद्युत सिंचाइ सेवा विस्तारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र लगानी प्रवर्द्धन सम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड निर्धारण र नियमन
४. राष्ट्रिय जलश्रोत नीति र संघीय योजना वमोजिम प्रदेशका नदी तथा सीमा नदीका जलउपयोग सम्बन्धी आयोजनाको पहिचान, निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन

५. प्रदेशभित्रको जलश्रोत उपयोग तथा नदी संरक्षण सम्बन्धी योजना तथा गुरुयोजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मुल्याङ्कन
६. प्रदेशभित्रको जलश्रोत उपयोग हुने आयोजनाहरुको अध्ययन, सर्वेक्षण, तयारी, कार्यान्वयन, अनुगमन र सञ्चालनमा समन्वय
७. प्रदेशस्तरमा जलाधार संरक्षण तथा जलउपयोग नीतिको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, प्रविधि विकास र व्यवस्थापन
८. मौसम र जलमापन सञ्चार सञ्जाल व्यवस्थापन
९. जलगुण तथा वायुगुण सम्बन्धी प्रयोगशाला व्यवस्थापन
१०. प्रदेशस्तरको खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धी प्रदेशिक नीति कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा र कार्यान्वयन, सेवाको शुल्क निर्धारण, योजना, आयोजना कार्यान्वयन तथा सञ्चालन, संभार र नियमन
११. खानेपानी तथा सरसफाई सेवा विस्तारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड तर्जुमा कार्यान्वयन र नियमन
१२. सर्वसाधारणलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्धता र खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छतामा पिछडिएको वर्गको पहुँच सुनिश्चितता
१३. खानेपानी गुणस्तर अनुगमन तथा लेखाजोखाको ढाँचा निर्माण एवं गुणस्तरको मापदण्ड निर्धारण र कार्यान्वयन

अनसूची २.१

गण्डकी प्रदेश सरकार

ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको संगठन संरचना

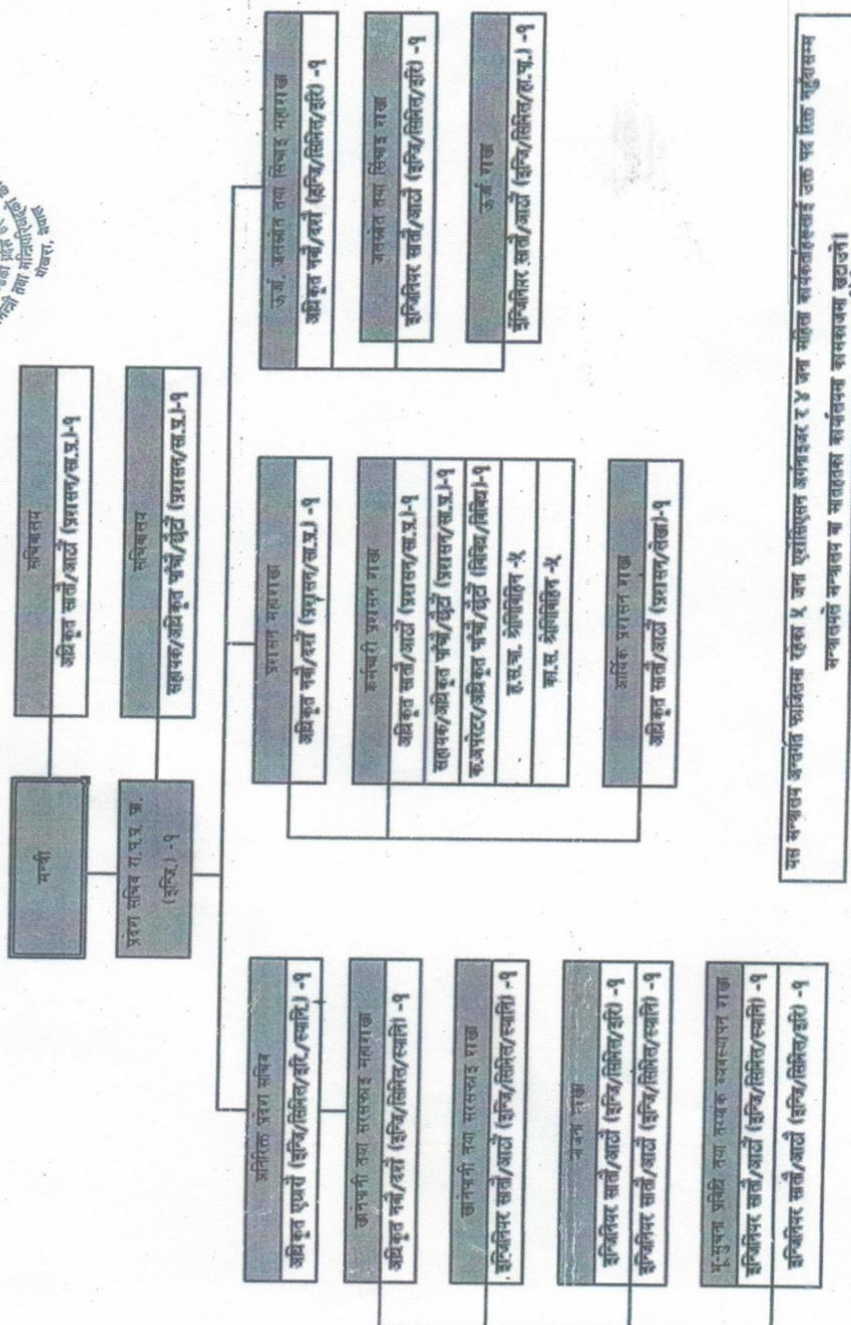

मन्त्रालयसंस्थानम् वा मातृशाला न्यायपालिका कामकाजमा खण्डने।

96

[illegible]

मन्त्रालयको दरबन्दी तेरिजः

क्र.स.	पद	सेवा	समूह	उप समूह	श्रेणी/तह	प्रस्तावित दरबन्दी	कैफियत
१	सचिव	इन्जिनियरिङ्ग			रा.प.प्र. प्रा.	१	
२	अतिरिक्त प्रदेश सचिव	इन्जिनियरिङ्ग	सिभिल	इरि./स्यानि.	एघारौं	१	
३	उप-सचिव	प्रशासन	सामान्य प्रशासन		नवौं/दशौं	१	
४	सि.डि.ई.	इन्जिनियरिङ्ग	सिभिल	इरिगेशन	नवौं/दशौं	१	
५	सि.डि.ई.	इन्जिनियरिङ्ग	सिभिल	स्यानिटरी	नवौं/दशौं	१	
६	अधिकृत	प्रशासन	प्रशासन		सातौं/आठौं	१	
७	लेखा अधिकृत	प्रशासन (लेखा)	प्रशासन (लेखा)		सातौं/आठौं	१	
८	इन्जिनियर	इन्जिनियरिङ्ग	सिभिल	इरिगेशन	सातौं/आठौं	३	
९	इन्जिनियर	इन्जिनियरिङ्ग	सिभिल	स्यानिटरी	सातौं/आठौं	३	
१०	इन्जिनियर	इन्जिनियरिङ्ग	सिभिल	हाइड्रोपावर	सातौं/आठौं	१	
११	सहायक/अधिकृत	प्रशासन	सामान्य प्रशासन	-	पाँचौं/छैटौं	२	
१२	कम्प्युटर अपरेटर/अधिकृत	विविध	विविध		पाँचौं/छैटौं	१	
१३	ह.स.चा.			-	श्रेणीविहिन	५	
१४	का.स.	प्रशासन	सामान्य प्रशासन	-	श्रेणीविहिन	५	
	जम्मा					२७	

२.विद्यमान अवस्था

२.१ ऊर्जा

प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको उज्यालो गण्डकी प्रदेश अभियान सम्पन्न गर्नका लागि तीनवटा नीतिगत व्यवस्थाका आधारमा ऊर्जा सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू संचालित छन्।

१. दुई वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रसारण लाईन पुर्‍याउन सकिने तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नियमित कार्यक्रमले समेट्न नसकेका सबै स्थानमा गण्डकी प्रदेश सरकारको थप लगानीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मार्फत् कार्यान्वयन हुने गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाईन विस्तार गर्ने;
२. दुई वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रसारण पुर्‍याउन नसकिने दुर्गम स्थानमा साविकका लघु जलविद्युत् आयोजनाको मर्मत-सम्भार गरी विद्युत नियमित गर्ने,
३. तत्काल विद्युत् सुविधाको पहुँचमा ल्याउन नसकिने देखिएका मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी, बागलुङ र गोरखा जिल्लाका अति दुर्गम भेगमा रहेका करिब १६०० घरधुरीमा सहूलियतपूर्ण अनुदानमा घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान गर्ने।

गण्डकी प्रदेशमा राष्ट्रिय स्तरमा संचालित संघीय सरकार र निजी क्षेत्रका गरी ६५ वटा जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन्। उल्लिखित जलविद्युत आयोजनाबाट कूल ११७४.२४२ मेगावाट विद्युत उत्पादन भैरहेको छ। (स्रोत: विद्युत विकास विभाग, March, 29, 2026)। प्रदेशमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन, लघु जलविद्युत र घरेलु सौर्य ऊर्जाबाट कुल ९९.८० प्रतिशत घरधुरीमा बत्ती बाल्नको लागि विद्युतको पहुँच पुगेको छ। (स्रोत: NEA, 2082, March, 29, 2026)।

आ.व. २०७५/७६ देखि २०७८/७९ सम्म सञ्चालित स्थानीय तहको साझेदारीमा जीर्ण काठेपोलहरू प्रतिस्थापन कार्यक्रमबाट प्रदेश सरकारको लगानीमा ३०,४८१ वटा स्टील ट्युबुलर पोल्ले प्रतिस्थापन गरिएको छ। हालसम्ममा ९७ वटा लघु जलविद्युत आयोजनाहरूको मर्मत सम्भार गरि ३,५४५ किलोवाट विद्युत नियमित गरिएको छ। हालसम्ममा दुईवटा लघु जलविद्युत आयोजना (पुतपुते खोला दोस्रो लघु जलविद्युत् आयोजना, स्याङ्जा- ९८ किलोवाट र युम्ले खोला लघु जलविद्युत् आयोजना, मनाङ्ग- ६० किलोवाट) लाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान गरिएको छ। संस्थागत सौर्य प्रणालीबाट विभिन्न सरकारी कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सामुदायिक विद्यालय तथा अध्ययन संस्थामा गरि २० संस्थामा हालसम्म २६७ किलोवाटपिक सोलार जडान गरिएको छ भने, गोरखा जिल्लाको पालुङटार न. पा.-५, गोरखा न.पा.-१०, छेवेटार, नवलपरासी ब.शु.पू., देवचुली-०१ र देवचुली न.पा. १४ मा गरि २६९ थान स्मार्ट सडकबत्ती जडान गरिएको छ।

२.२ सिंचाइ तथा नदी व्यवस्थापन

जलस्रोतको दिगो उपयोग गर्दै कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न एवम् सिंचाइ प्रणालीको निर्माण तथा जल नदी तथा उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन गर्न गण्डकी प्रदेश सिंचाइ ऐन, २०७८ तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा रहेको छ। सिंचाइ गुरुयोजना, २०१९ अनुसार गण्डकी प्रदेशको खेति योग्य जमिन, सिंचाइ योग्य जमिन तथा सिंचित क्षेत्रफल निम्न रहेको छ।

क्र.सं.	विवरण	इकाई	परिमाण	कैफियत
१	खेति योग्य जमिन	हेक्टर	३,५१,५९७	
२	सिंचाइ योग्य जमिन	हेक्टर	२,७२,६३०	खेति योग्य जमिनको जम्मा ७७.५४ प्रतिशत
३	सिंचाइ योग्य जमिन मध्ये सतह सिंचाइ को सम्भावना रहेको २५ डिग्रीसम्म भिरालो जमिन	हेक्टर	७४,१९४	
४	२५ डिग्री देखि ६० डिग्रीसम्म भिरालो रहेको जमिन	हेक्टर	१,६०,७९१	
५	पम्प सिंचाइ को सम्भावना रहेको जमिन	हेक्टर	३७,६४५	

आ.व. २०८२/८३ मा विस्तार भएको जम्मा १९६ हेक्टर समेत गरी प्रदेश सरकारबाट हालसम्म आधुनिक सिंचाइ को पूर्वाधार विस्तार भएको जमिन ७,८४८ हेक्टर पुगेको छ। प्रदेश सरकारको पहलमा यस प्रदेशमा आ.व. २०८२/८३ मा थप भएको जम्मा १७.९९ कि.मि. समेत गरी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०८२/८३ सम्ममा कुल १५५.९६ किलोमिटर तटबन्धन निर्माण र ३,४५८.५३ हेक्टर क्षेत्र संरक्षण एवम् जग्गा उकासको कार्य भएको छ।

नमूना कृषि गणना, २०७८ ले दिएको तथ्यांक अनुसार प्रदेशभित्र बाह्रै महिना सिंचाइ हुने जमिन ३१,८४१ (११.६७ %) हेक्टर रहेको छ। जसमध्ये प्रायजसो सतह सिंचाइमा आधारित परम्परागत कृषक कुलोको स्तरोन्नति तथा भूमिगत, लिफ्ट र नवीनतम प्रविधिमा आधारित नयाँ सिंचाइ आयोजनाहरू रहेका छन्। बाढी, नदी कटान, डुबान र पहिरोबाट जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका बस्ती, खेतीयोग्य जमिन, भौतिक संरचना, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणको लागि तटबन्ध निर्माण, नदी तथा पहिरो व्यावस्थापन कार्यहरू सञ्चालन भैरहेको छ।

प्रदेशको कूल क्षेत्रफल, सिंचाइ योग्य जमिन र आधुनिक सिंचाइ पूर्वाधार पुगेको जिल्लागत विवरण
(हेक्टरमा)

नमूना कृषि गणना २०७८ को नतिजा								
जिल्ला	खेती भईरहेको क्षेत्रफल	सतह र जलाशय	पम्पिंग	ट्यूबेल	अन्य	मिश्रित	जम्मा	बाह्रै सहिना सिंचित
गोरखा	२६,०९४.४	३,८९४.६७	१,१८२.६	५५.८	१,८३६.४	१६३.६	७,१३३.१	३,४५५.७
मनाङ	४८८.८	८१.३८	९.१	-	०.३	०.०	९०.९	७१.५
मुस्ताङ	१,१८२.५	७२९.०४	१३९.९	-	१६.६	-	८८५.५	८३८.६
म्याग्दी	८,९५३.३	१,८२२.८२	११३.६	-	३००.०	१७.०	२,२५३.३	१,१३२.१
कास्की	१९,१६३.८	६,३३२.१९	४५७.०	१७.१	३,११०.३	३९९.८	१०,३१६.४	४,३१२.८
लमजुङ	११,०८३.२	४,०५८.९४	४४३.०	१४.८	८९३.८	११२.९	५,५२३.५	२,८८०.०
तनहुँ	२६,०९९.६	६,६००.४५	२९३.४	३५.६	४७१.६	२९१.६	७,६९२.७	३,६२९.३
नवलपुर	२१,०८९.६	७,९०९.९४	१,८४३.६	२,४२४.५	१,०८७.७	४६५.१	१३,७३०.८	७,३९५.९
स्याङ्जा	२४,४५६.६	५,२३४.३८	५९४.३	६८.६	७४६.८	७२.९	६,७१७.०	३,८९८.५
पर्वत	९,५५१.८	३,५८८.५१	३२५.५	७५.७	४८३.४	७५.७	४,५४८.८	१,९८१.९
बागलुङ	२५,६०९.२	२,६८४.६७	५७३.२	८.३	२२२.९	२०.१	३,५०९.२	२,२४५.२
जम्मा	१७३,७७२.९७	४२,९३६.९९	५,९७५.२	२,७००.४	९,१६९.९	१,६१८.७	६२,४०१.२	३१,८४१.५

कुल क्षेत्रफल, खेति योग्य जमिन र प्रदेश सरकारबाट भएको सिंचाइ पूर्वाधार विस्तार विवरण:

क्र.सं.	जिल्ला	कुल क्षेत्रफल (हेक्टर)	खेति योग्य जमीन (हेक्टर)	प्रदेश सरकारबाट आधुनिक सिंचाइ पूर्वाधार विस्तार भएको क्षेत्रफल (हेक्टर)	कैफियत
१	मनाङ	३२,०६१.००	२,१५३.००	६०५	
२	मुस्ताङ	३५६,३२१.००	३,६४०.००	५६५	
३	म्याग्दी	२२८,४७८.००	३०,८५६.००	२५२	
४	बागलुङ	१८३,५७४.००	४६,१४८.००	३९१.७४	
५	पर्वत	५४,१५५.००	२८,५९२.००	४५४	
६	कास्की	२०८,४३८.००	६८,९६७.००	२२८	
७	स्याङ्जा	१०३,७४८.००	७२,७३१.००	२०३	
८	नवलपुर	१४२,५८२.००	५१,९१५.००	१५३२.२५	
९	तनहुँ	१५७,१८४.००	६५,०६१.००	३४९.७५	
१०	लमजुङ	१६६,२४०.००	६१,८१९.००	३१९	
११	गोरखा	३६४,५८७.००	५५,६९६.००	७३३	

१२	भूमिगत			२२१५	
	जम्मा	२,१९७,३६८.००	४८७,५७८.००	७,८४७.७४	


२.३ खानेपानी तथा सरसफाइ

प्रदेशभर स्वच्छ खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउन र ढल तथा फोहोरपानीको व्यवस्थापन गरी वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्न एवम् सोको प्रभावकारी निगरानी गर्न प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाई ऐन, तत्सम्बन्धी नियमावली, कार्यविधि तथा मापदण्ड जारी भई कार्यान्वयनमा रहेका छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा संचालित राष्ट्रिय खानेपानी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (N-WASH-MIS) को तथ्यांक बमोजिम प्रदेशमा खानेपानी सुविधा उपलब्ध जनसंख्या ९३.२० प्रतिशत रहेको देखिन्छ। प्रदेश सरकारबाट आ.व. २०८२/८३ मा थप १४,०५७ निजी धारा जडान सहित हालसम्म प्रदेश सरकार आफैले जडान भएका निजी धारा संख्या १,७७,३२७ रहेको छ। यस बाहेक स्थानीय पालिका र संघीय सरकारबाट समेत निजी धारा जडानका कार्यहरू भईरहेका छन्।

खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको एकीकृत र अध्यावधिक तथ्यांक

- यस प्रदेशको विद्यमान खानेपानी सुविधाको अवस्था र यसको क्षेत्रगत तथ्याङ्कको विषयमा सार्वजनिक चासो र सरोकार रहदै आएको छ। खानेपानी क्षेत्र संविधानको अनुसूचि बमोजिम तीनै तहको कार्यक्षेत्रमा पर्ने साझा अधिकारको विषय भएको र यस क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै वटै सरकारले आआफ्नै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आइरहेका छन्। तसर्थ, गण्डकी प्रदेश भित्र तीनै तहका सरकारका उपलब्धीलाई समावेश गरेर एउटा एकीकृत तथ्याङ्क आवश्यक पर्ने देखिएको हुनाले गण्डकी प्रदेश सरकारले संघ सरकारबाट संचालनमा ल्याएको राष्ट्रिय खानेपानी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (N-WASH-MIS) मा तीनै तहका सरकारको समन्वय, सहकार्य र साझेदारीमा तथ्याङ्क व्यवस्थापनको कार्य गरिरहेको छ। स्थानीय तहहरू मार्फत तथ्याङ्क संकलन गरेर बास प्लान तयारीको कार्य गण्डकीकै मैलिक मोडेलमा भैरहेको छ। यसको उद्देश्य संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा आयोजनाको स्थलगत अवस्था र आवश्यकता पत्ता लगाउने, जरूरी आयोजनाको पहिचान गरी प्रारम्भिक लागत अनुमान तयार गर्ने, कार्यान्वयनको प्राथमिकता निर्धारण स्थानीय कार्यपालिकाको बैठकबाट गर्ने र तहगत लागत साझेदारीमा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य रहेको छ।
- आ.व. २०८२/८३ मा प्रदेशका ४,६४३ वटा खानेपानी प्रणालीको विवरण आयोजना-आयोजनाका प्रत्येक संरचना तथा १५,६४,३२८ जनसङ्ख्याको विवरण घर-घरमा गएर संकलन गरी त्यसलाई भू-सूचना सहितको नक्सा लगायतका विवरण डिजिटल प्रणालीमा प्रविष्ट भैसकेको छ।
- राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार प्रदेशको जम्मा घरधुरी संख्या ६,६२,४८० र जनसंख्या २४,६६,४२७ रहेको छ।


- NWASH-MIS मा सूचीकृत आ.व. २०८२/८३ को अन्त्यसम्मको गण्डकी प्रदेशको WASH DATA STATUS :

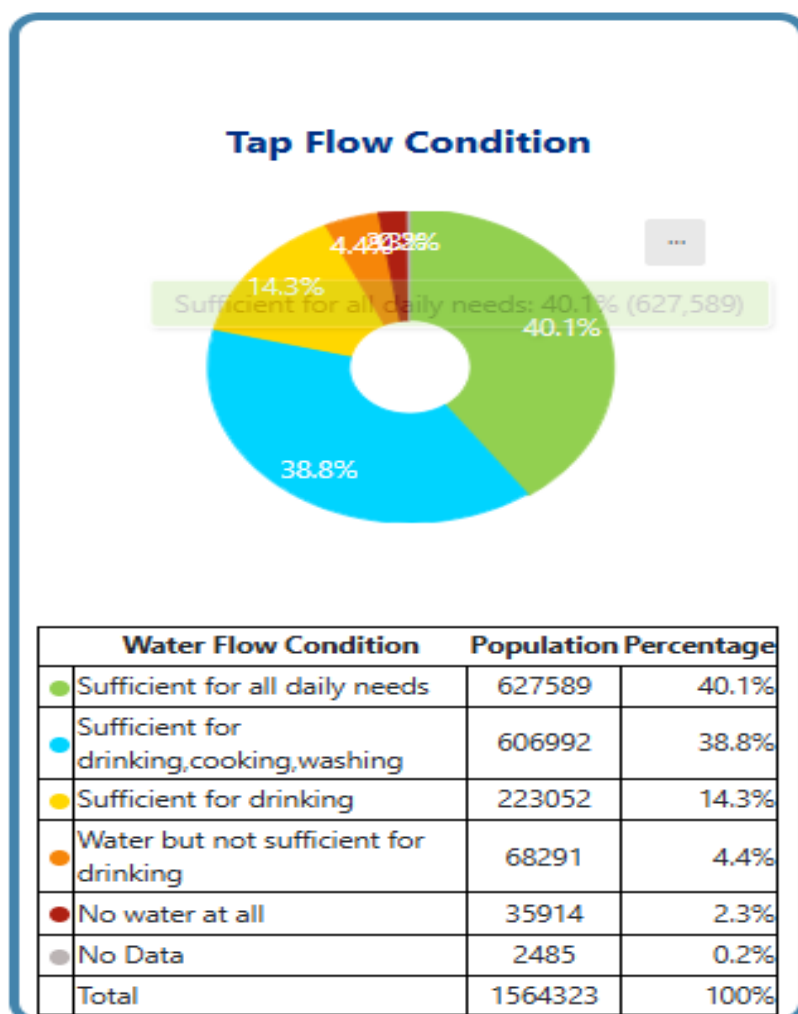


Water Supply Project



WASH Data



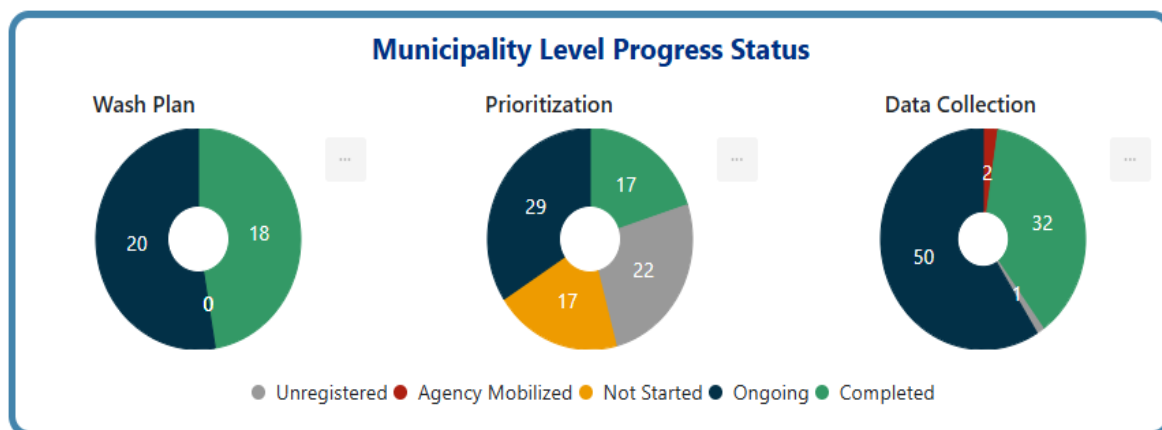

गण्डकी प्रदेश सरकारबाट आ.व. २०७५/७६ देखि आ.व. २०८१/८२ सम्ममा जडान भएका निजी धारा जडान सम्बन्धी विवरण

क्र. सं.	जिल्ला/ आ.व.	२०७५/०७६	२०७६/७७	२०७७/७८	२०७८/७९	२०७९/८०	२०८०/८१	२०८१/८२	२०८२/८३	जम्मा
१	गोरखा	२८७९	९१२१	१००१५	३७०३	४७३६	२७६१	१६५८	३१९१	३८०६४
२	लमजुङ	२०२	१४३९	२९४५	१२७८५	१२०२	५४७	६७८	१३७	१९९३५
३	मनाङ	०	२६०	२४२	३८९	९६	१५४	६०	६३	१२६४
४	बागलुङ	८३२	१९०९	४७१७	४२०१	१२९४	१६८८	२१८६	१६२५	१८४५२
५	पर्वत	४६५१	१७३९	४५६८	३२९९	५५८	१४८९	१८९२	८८६	१९०८२
६	म्याग्दी	८७६	४३०	२४८४	१८४०	१३६	७२७	१२८३	५२८	८३०४
७	मुस्ताङ	२३२	१०८	३८२	१०७३		१२५	३८	८७	२०४५
८	स्याङ्गजा	३०७०	२४६०	२२३०	२७०	४६०७	२३१७	१५८६	२२२८	१८७६८
९	कास्की	१३५६	१७९२	२१६५	४१२९	२०९७	२००४	१६७५	१२११	१६४२९
१०	तनहुँ	१९०४	२३५४	४३१७	२२९७	२१२८	२०००	२५५७	२७२८	२०२८५
११	नवलपुर	१०७५	१०६२	३७१३	२८८५	२०१७	९४२	१६३२	१३७३	१४६९९
	जम्मा	१७०७७	२२६७४	३७७७८	३६८७१	१८८७१	१४७५४	१५२४५	१४०५७	१७७३२७

३. बजेट विनियोजन र खर्चको विवरण

३.१ आर्थिक वर्ष २०८२।८३ मा मन्त्रालयको स्रोतगत बजेट विनियोजन र खर्चको विवरण

यस मन्त्रालयलाई आ.व. २०८२/८३ मा कुल रु. ४ अरब ३२ करोड ५५ लाख १९ हजार (संशोधन सहित) को बजेट विनियोजन भएको थियो। चालु तर्फ रु. ३३ करोड ३५ लाख ७१ हजार प्राप्त भएकोमा त्यसको ७६% हुन आउने रु. २५ करोड ५० लाख ३१ हजार खर्च भएको छ। त्यसैगरी, पुँजीगत तर्फ रु. ३ अरब ९८ करोड ९९ लाख ४८ हजार प्राप्त भएकोमा त्यसको ८६.४५ % हुन आउने रु. ३ अर्ब ४४ करोड ९१ लाख १३.५८ हजार खर्च भएको छ। जसमध्ये प्रदेश सरकारको ३ अरब ९१ करोड ५९ लाख ८९ हजार, संघ सशर्त अनुदान ११ करोड ९० लाख र संघ विशेष अनुदान तर्फ २९ करोड ६ लाख बजेट प्राप्त भएको थियो। चालु र पुँजीगत गरि कूल विनियोजनको ८५.६३% वित्तीय प्रगति हासिल भई रु. ३ अरब ७० करोड ४१ लाख ४५ हजार खर्च भएको छ, जुन प्रदेश मन्त्रालयगत खर्च प्रतिशतमा सबैभन्दा बढी रहेको छ। आ.व. २०८२/८३ मा यस मन्त्रालयलाई प्राप्त बजेट र खर्चको विस्तृत विवरण तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।

(रु.हजारमा)

विवरण	चालु तर्फ				पुँजीगत तर्फ					कुल जम्मा
	प्रदेश सरकार	विशेष अनुदान	संघ सशर्त अनुदान	जम्मा	प्रदेश सरकार	संघ सशर्त अनुदान	संघ विशेष अनुदान	संघ समपूरक अनुदान	जम्मा	
सुरु विनियोजन	३३३५००			३३३५००	३१४४५००	११९०००	२९०६००		३५५४१००	३८८७६००
थप(+) घट(-)	२०७१			२०७१	४३५८४८				४३५८४८	४३७९१९
खुद बजेट	३३५५७१			३३५५७१	३५८०३४८	११९०००	२९०६००		३९८९९४८	४३२५५१९
खर्च	२५५०३१			२५५०३१	३२४१६२२.४८	७४८०३.४४	१३२६८७.६६		३४४९११३.५८	३७०४१४५
खुद बजेटका आधारमा खर्च (%)	७६.००%			७६.००%	९०.५४%	६२.८६%	४५.६६%		८६.४५%	८५.६३%


३.२ बजेटको लक्ष्य र खर्चको वार्षिक प्रवृत्ति तुलनात्मक विवरण:

यस मन्त्रालयलाई आ.व. २०७५/७६ देखि आ.व. २०८२/८३ सम्ममा प्राप्त विनियोजित बजेट र खर्चको वार्षिक प्रवृत्ति विवरण तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ (रु.हजारमा)

आर्थिक वर्ष	आर्थिक वर्ष २०७५/७६			आर्थिक वर्ष २०७६/७७			आर्थिक वर्ष २०७७/७८		
खर्चको प्रकार	विनियोजन	खर्च	खर्च प्रतिशत	विनियोजन	खर्च	खर्च प्रतिशत	विनियोजन	खर्च	खर्च प्रतिशत
चालु				१४५०३४	१२१४९१	८३.७६	२६५२१५	१८४६९३	६९.६४
पूँजीगत	४८९१९३१	३९५४१४६	८०.८३	६३८४३६७	५२१८४५४	८१.७३	७७५३९१४	६००४२९६	७७.४४
जम्मा	४८९१९३१	३९५४१४६	८०.८३	६५२९४०१	५३३९९४५	८१.७८	८०१९१२९	६१८८९८९	७७.१८

आर्थिक वर्ष	आर्थिक वर्ष २०७८/७९			आर्थिक वर्ष २०७९/८०			आर्थिक वर्ष २०८०/८१		
खर्चको प्रकार	विनियोजन	खर्च	खर्च प्रतिशत	विनियोजन	खर्च	खर्च प्रतिशत	विनियोजन	खर्च	खर्च प्रतिशत
चालु	२६९०२२	२०१८८६	७५.०४	३०४५०३	२३४३२९	७६.९५	३५१८५५	२४५६३४	६९.८१
पूँजीगत	५३८८९०९	४८७०४९६	९०.३८	५६५२६५५	४८२७००५	८५.३९	४६६५२००	४२१७५८३	९०.४१
जम्मा	५६५७९३१	५०७२३८२	८९.६५	५९५७९५८	५०६१३३४	८४.९६	५०१७०५५	४४६३२१७	८८.९६

आर्थिक वर्ष	आर्थिक वर्ष २०८१/८२			आर्थिक वर्ष २०८२/८३		
खर्चको प्रकार	विनियोजन	खर्च	खर्च प्रतिशत	विनियोजन	खर्च	खर्च प्रतिशत
चालु	३४७६८९.००	२६३२७१.००	७५.७२	३३५५७१	२५५०३१	७६.००
पूँजीगत	३९५३८००.००	३६०४८४१.००	९१.१७	३९८९९४८	३४४९११४	८६.४५
जम्मा	४३०१४८९.००	३८६८११२.००	८९.९२	४३२५५१९	३७०४१४५	८५.६३

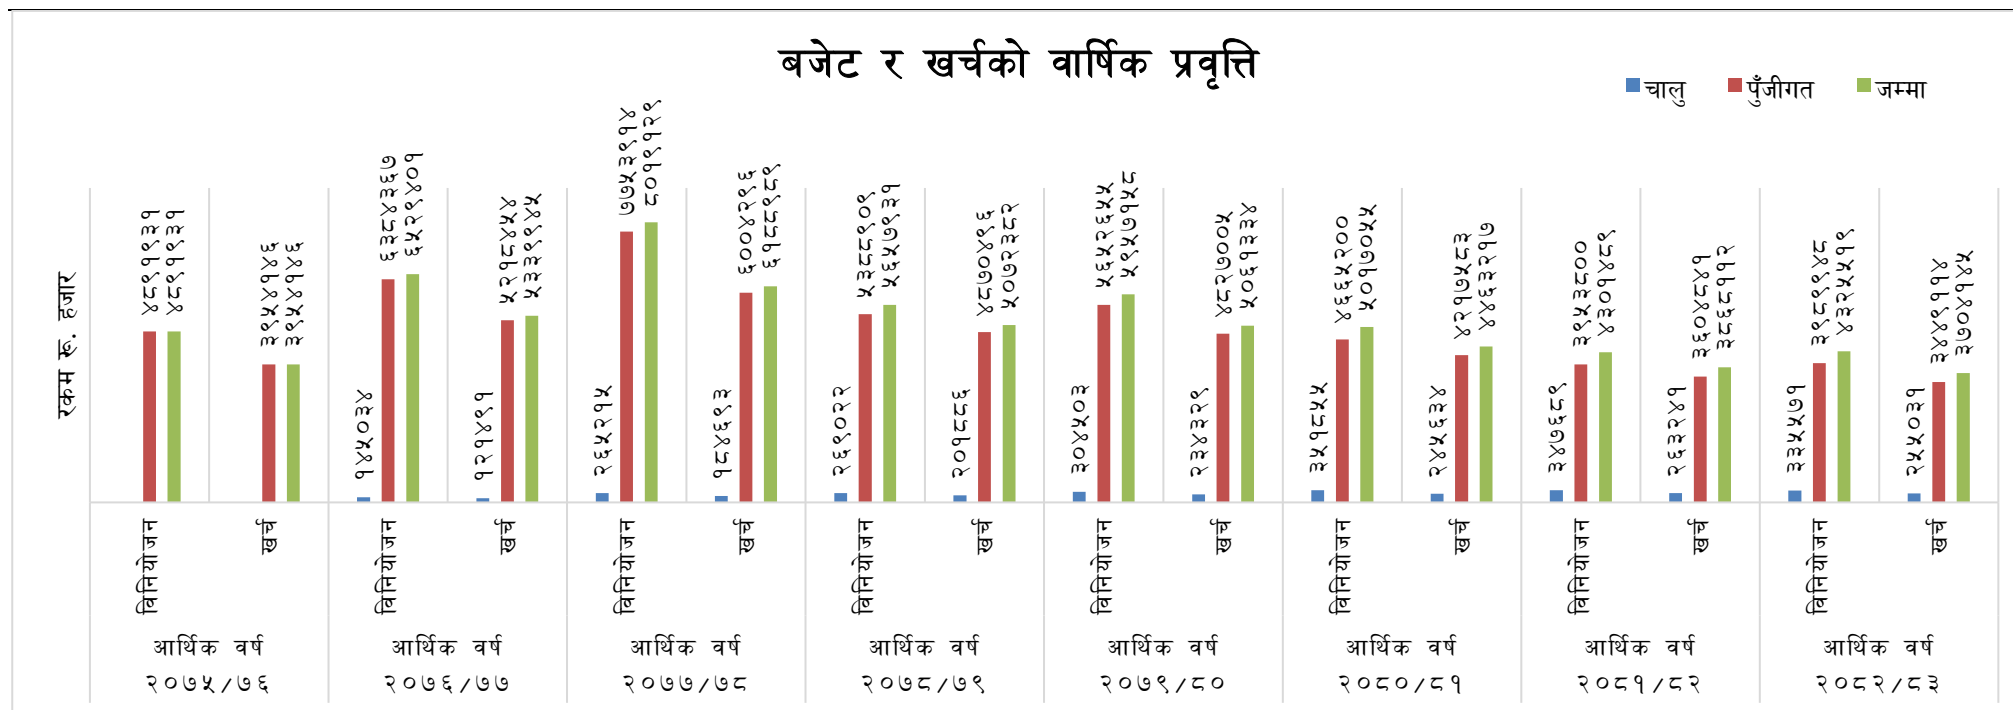


३.३ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को त्रैमासिक रूपमा कुल खर्चको प्रवृत्ति:

यस मन्त्रालयको आ.व. २०८२/८३ मा प्राप्त विनियोजित बजेट र खर्चको त्रैमासिक रूपमा कुल खर्चको प्रवृत्ति विवरण तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।

(रु. हजारमा)

खर्चको प्रकार	वार्षिक विनियोजन	वार्षिक खर्च	पहिलो त्रैमासिक				दोस्रो त्रैमासिक			
			त्रैमासिक विनियोजन	त्रैमासिक खर्च	त्रै. खर्च प्रतिशत	वार्षिकको तुलनामा खर्च प्रतिशत	त्रैमासिक विनियोजन	त्रैमासिक खर्च	त्रै. खर्च प्रतिशत	वार्षिकको तुलनामा खर्च प्रतिशत
चालु	३३५,५७९	२५५,०३९	७९,३५५.	५६७,९३.८४	७९.४७%	९६.९०%	८४०४३.	४५०६४.०८	५३.६२%	९३.४३%
पुँजीगत	३९८,९९४.८	३४४,९९९.४	७७,७४२.५	४७०,२४६.७५	६०.४९%	९९.७९%	७५३,००२.५	२९७,०७९.४४	३९.४५%	७४.५५%
जम्मा	४३२,५५९.९	३७०,४९४.५	८५,६७८.०	५२६,९६९	६९.५०%	९२.९८%	८३७,०४५.५	३४२,९४३.५२	४०.८८%	७९.९९%

खर्चको प्रकार	वार्षिक विनियोजन	वार्षिक खर्च	तेस्रो त्रैमासिक				चौथो त्रैमासिक			
			त्रैमासिक विनियोजन	त्रैमासिक खर्च	त्रै. खर्च प्रतिशत	वार्षिकको तुलनामा खर्च प्रतिशत	त्रैमासिक विनियोजन	त्रैमासिक खर्च	त्रै. खर्च प्रतिशत	वार्षिकको तुलनामा खर्च प्रतिशत
चालु	३३५५७१	२५५०३१	६७००३.	५८६३२.०५	८७.५१%	१७.४७%	१०५१७०.	९४६२१.०३	८९.९७%	२८.२०%
पूँजीगत	३९८९९४८	३४४९११४	८९८९८७.	४७१९४६.५४	५२.५०%	११.८३%	१५६०५३४.	२२०९८४०.८५	१४१.६१%	५५.३९%
जम्मा	४३२५५१९	३७०४१४५	९६५९९०.	५३०५७८.५९	५४.९३%	१२.२७%	१६६५७०४.	२३०४४६१.८८	१३८.३५%	५३.२८%

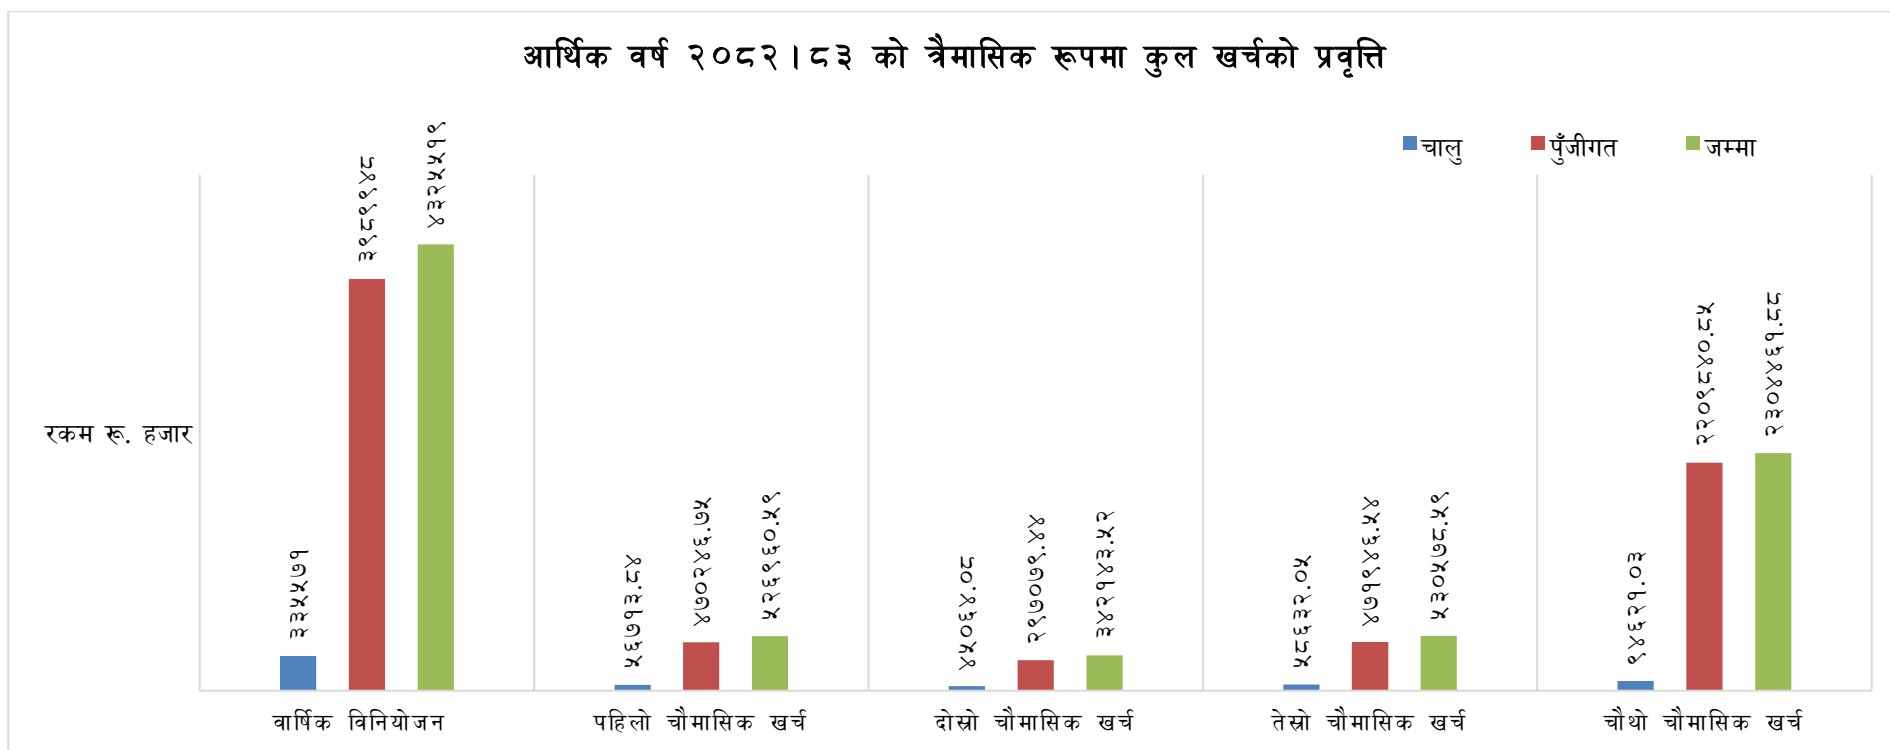

३.४ आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को बजेट उपशीर्षकगत वित्तीय प्रगति:

यस मन्त्रालयको आ.व. २०८२/८३ मा प्राप्त विनियोजित बजेट र खर्चको बजेट उपशीर्षकगत रूपमा कुल खर्चको प्रगति विवरण तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ। (रु. हजारमा)

क्र.स.	बजेट कोड	बजेट उपशीर्षक	बजेट			खर्च			खर्च प्रतिशत		
			चालु	पूँजीगत	जम्मा	चालु	पूँजीगत	जम्मा	चालु	पूँजीगत	जम्मा
१	३४००१००१	उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय	५५६००	१५६२३९.१४	२११८३९.१४	३१००३	१५१०५३	१८२०५६	५५.७६	९६.६८	८५.९४
२	३४००१००२	संघ विशेष अनुदानका आयोजनाहरू	०	२९०६००	२९०६००	०	१३२६८८	१३२६८८		४५.६६	४५.६६
३	३४००३००१	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालयहरू	१०७७२१	३३५४१९.६	४४३१४०.६	९२३५८	२९७७९३	३९०१५१	८५.७४	८८.७८	८८.०४
४	३४००३००२	जलस्रोत, सिंचाई तथा खानेपानी कार्यालयहरू	३८३००	१३५३३०	१७३६३०	३१३२५	११७०६२	१४८३८७	८१.७९	८६.५	८५.४६
५	३४००३००३	भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाइ कार्यालयहरू	१४८००	९२६३१.२६	१०७४३१.२६	२४१९	७७८७०	८०२८९	१६.३४	८४.०६	७४.७४
६	३४००३००४	बहुवर्षीय/स्रोत सुनिश्चित आयोजना-सिंचाई/तटबन्ध क्षेत्र	०	३६९१५८	३६९१५८	०	३०९११८	३०९११८		८३.७४	८३.७४
७	३४००३००६	मर्मत सम्भार तथा प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना	०	६४३१५०	६४३१५०	०	५०७७४१	५०७७४१		७८.९५	७८.९५
८	३४००४००१	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयहरू	११९१५०	१२५३७७०	१३७२९२०	९७९२६	१२१४८७७	१३१२८०३	८२.१९	९६.९	९५.६२
९	३४००४०११	बहुवर्षीय/स्रोत सुनिश्चित आयोजना-खानेपानी क्षेत्र	०	५९४६५०	५९४६५०	०	५६६१०९	५६६१०९		९५.२	९५.२
१०	३४०९१०११	राष्ट्रिय सूचना व्यवस्थापन तथा अनुगमन आयोजना (संघ सशर्त)	०	१०००	१०००	०	२४१	२४१		२४.११	२४.११

क्र.स.	बजेट कोड	बजेट उपशीर्षक	बजेट			खर्च			खर्च प्रतिशत		
			चालु	पूँजीगत	जम्मा	चालु	पूँजीगत	जम्मा	चालु	पूँजीगत	जम्मा
११	३४०९१०१२	केन्द्रिय खानेपानी आयोजना (संघ शसर्त)	०	१००००	१००००	०	८२२७	८२२७		८२.२७	८२.२७
१२	३४०९११२२	नदी नियन्त्रण(संघ शसर्त अनुदान)	०	१००००	१००००	०	५९३७	५९३७		५९.३७	५९.३७
१३	३४०९११२३	मर्मत संभार आयोजनाहरु(संघ शसर्त अनुदान)	०	६५५००	६५५००	०	३१६३९	३१६३९		४८.३	४८.३
१४	३४०९११२८	जलवायु अनुकूलित वृहत खानेपानी आयोजना(संघ शसर्त अनुदान)	०	२५०००	२५०००	०	२२९७२	२२९७२		९१.८९	९१.८९
१५	३४०९११३२	खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम(संघ शसर्त अनुदान)	०	७५००	७५००	०	५७८७	५७८७		७७.१६	७७.१६
कुल जम्मा			३३५५७१	३९८९९४८	४३२५५१९	२५५०३१	३४४९११४	३७०४१४५	७६	८६.४५	८५.६३

३.५ आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को क्षेत्रगत वित्तीय प्रगति:

यस मन्त्रालयको आ.व. २०८२/८३ मा प्राप्त विनियोजित बजेट र खर्चको क्षेत्रगत रूपमा कुल खर्चको प्रगति विवरण तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ। (रु. हजारमा)

क्र.स.	क्षेत्र	खर्च शीर्षक	संसोधित बजेट	खर्च	खर्च %
१	विद्युत संरचना निर्माण	३११५३	१५०६७७.००	१३९७६२.२५	९२.७६
२	तटबन्ध तथा बाँध निर्माण	३११५४	४१७३००.००	२८७५४९.९९	६८.९१
३	सिंचाइ संरचना निर्माण	३११५५	१०७६०९३.८६	८१२९५४.५६	७५.५५
४	खानेपानी संरचना निर्माण	३११५६	२२५६२२०.००	२१३३५५५.२०	९४.५६
५	अन्य पुँजीगत		८९६५७.५४	७५२९१.५८	८३.९८
	जम्मा		३९८९९४८.४०	३४४९११३.५८	८६.४५

३.६ यस मन्त्रालयको आ.व. २०८२/८३ मा प्राप्त विनियोजित बजेट र खर्चको स्रोतगत रूपमा कुल खर्चको प्रगति विवरण तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।

(रु. हजारमा)

क्र.स.	कार्यालय	विनियोजित बजेट र खर्चको विवरण										
		चालु तर्फ		प्रदेश पुँजीगत		संघ सशर्त अनुदान		संघ विशेष अनुदान		जम्मा		
		विनियोजन	खर्च	विनियोजन	खर्च	विनियोजन	खर्च	विनियोजन	खर्च	जम्मा विनियोजन	जम्मा खर्च	%
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११=३+५+७+९	१२=४+६+८+१०	१३=१२/११ %
१	ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय	५५६००.००	३१००३.१६	१५६२३९.१४	१५१०५२.५७	१०००	२४१.१०	०	०.००	२१२८३९	१८२२९६.८३	८५.६५%
२	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, गोरखा	१२९५०.००	११०००.०६	१२४२५८	८०१५४.०३	०	०.००	७००००	९७९७.९९	२०७२०८	१००९५२.०८	४८.७२%
३	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, लमजुङ	१२२००.००	८८६१.०९	८४०५०	६९२५१.००	२००००	१०२२५.०४	३५०००	९५४३.३६	१५१२५०	९७८८०.४९	६४.७१%
४	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, तनहुँ	१३२००.००	१०९३५.८२	१६०९५०	१४७०२३.६४	०	०.००	०	०.००	१७४१५०	१५७९५९.४६	९०.७०%
५	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, कास्की	१७६००.००	१६०७८.४३	१६५८००	१२२७७५.०५	४५५००	२०२९२.१४	०	०.००	२२८९००	१५९१४५.६२	६९.५३%
६	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, पर्वत	११६५०	१०५१२.१५	९३२००	८००९२.५६	०	०.००	०	०.००	१०४८५०	९०६०४.७१	८६.४१%

क्र.स.	कार्यालय	विनियोजित बजेट र खर्चको विवरण										
		चालु तर्फ		प्रदेश पुँजीगत		संघ सशर्त अनुदान		संघ विशेष अनुदान		जम्मा		
		विनियोजन	खर्च	विनियोजन	खर्च	विनियोजन	खर्च	विनियोजन	खर्च	जम्मा विनियोजन	जम्मा खर्च	%
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११= ३+५+७+९	१२=४+६+८+१०	१३=१२/११ %
७	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, स्याङ्गजा	१२७५०	१०५९७.६०	१६१८५०	१३९७८७.८९	१००००	७०५८.६०	२०६००	१०२७४.०६	२०५२००	१६७७८.१५	८१.७३%
८	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, बागलुङ	१२३००	१०१२७.९२	१०३८८८	८९५८७.४१	०	०.००	३५०००	९१९०.८७	१५११८८	१०८९०६.२०	७२.०३%
९	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, नवलपुर	२९८७१	१६६६३.४६	२६१२३८	२१७९७५.३७	०	०.००	३००००	११४७९.४७	३२११०९	२४६११८.३०	७६.६५%
१०	खानेपानी, जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास सब-डिभिजन कार्यालय, मनाङ	११४००	८७६४.५४	५४०२०	४२९३५.३७	०	०.००	०	०.००	६५४२०	५१६९९.९१	७९.०३%
११	खानेपानी, जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, मुस्ताङ	१२८००	९९३०.२०	५७८००	५०६१५.००	५०००	४७५२.२३	०	०.००	७५६००	६५२९७.४३	८६.३७%
१२	खानेपानी, जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, म्याग्दी	१४१००	१२६३०.३०	९२९८५	७७४६७.१०	०	०.००	३५००	२६१८.२४	११०५८५	९२७१५.६४	८३.८४%

क्र.स.	कार्यालय	विनियोजित बजेट र खर्चको विवरण										
		चालु तर्फ		प्रदेश पुँजीगत		संघ सशर्त अनुदान		संघ विशेष अनुदान		जम्मा		
		विनियोजन	खर्च	विनियोजन	खर्च	विनियोजन	खर्च	विनियोजन	खर्च	जम्मा विनियोजन	जम्मा खर्च	%
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११= ३+५+७+९	१२=४+६+८+१०	१३=१२/११ %
१३	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, गोरखा	३३६००	२७७००.८५	९२०१००	९१५४७२.३६	०	०.००	४०८००	४०७००.४९	९९४५००	९८३८७३.७०	९८.९३%
१४	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, तनहुँ	३४२००	२८३८०.६९	३५७७००	३१७७००.८०	४९००	४९००.००	३०१००	२१२७२.९३	४२६९००	३७२२५४.४२	८७.२०%
१५	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, स्याङ्गजा	२९३५०	२५६३२.४१	३८२४७०	३५४७०६.६३	१७५००	१२६१६.१२	१५५००	८७६१.२३	४४४८२०	४०१७६.३९	९०.३१%
१६	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, बागलुङ	२२०००	१६२१२.३३	४०३८००	३८५०२५.७०	१५१००	१४७१८.२१	१०१००	९०४९.०२	४५१०००	४२५००५.२६	९४.२४%
जम्मा		३३५५७१	२५५०३१.०२	३५८०३४८	३२४१६२२.४८	११९०००	७४८०३.४४	२९०६००	१३२६८७.६६	४३२५५१९	३७०४१४४.६०	८५.६३%

४. आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक कार्यक्रमको प्रगति/उपलब्धी विवरण

४.१ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनबाट हासिल भएका मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू:

यस मन्त्रालयको आ.व. २०८२/८३ मा प्राप्त विनियोजित बजेट र खर्चबाट तथा प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित कार्यक्रमबाट हासिल भएका विषय क्षेत्रगत उपलब्धि सम्बन्धी विवरण तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।

क्र. सं.	मुख्य विषय क्षेत्र	सहायक विषय क्षेत्र	एकाई	परिमाणात्मक लक्ष्य	प्रगति	विषय क्षेत्रगत उपलब्धि (वार्षिक र प्रदेश सरकारको स्थापना भएपछिको जम्मा)
४.१.१	ऊर्जा विकास	विद्युतमा पहुँच घरधुरी	प्रतिशत	१००	९९.८०	- आ.व. २०८२/८३ सम्म विद्युत विस्तार, लघु जलविद्युत मर्मत तथा घरेलु सोलार मार्फत विद्युतमा पहुँच घरधुरी ९९.८० प्रतिशत पुगेको। - आ.व. २०८२/८३ मा थप ३ वटा लघु जलविद्युत आयोजना (सिम बराह ग्रामिण विद्युतीकरण परियोजना, अन्नपूर्ण गा.पा.-११, कास्की, गौडाखोला लघु जलविद्युत आयोजना, मालिका गा.पा.-५, म्याग्दी र भुसुने खोला लघु जलविद्युत आयोजना, बडिगाड गा.पा.-४, बागलुङ गरि ३९ किलोवाट) मर्मत गरि हालसम्म ९७ वटा लघु जलविद्युत आयोजना मर्मत मार्फत ३,५४५ किलोवाट विद्युत नियमित भएको छ। - आ.व. २०८२/८३ मा थप ५ वटा ६/६ किलोवाट पिक क्षमताको संस्थागत सोलार (मुना स्वास्थ्य चौकी, धौलागिरी गा. पा.-३, मुना, म्याग्दी, रूम स्वास्थ्य चौकी, मालिका गा. पा.-२, रूम, म्याग्दी, कागबेनी स्वास्थ्य चौकी, बारागुड मुक्तिक्षेत्र गा. पा.-४, मुस्ताङ, पिसाङ स्वास्थ्य चौकी, मनाङ डिस्याङ गा. पा.-१, मनाङ, विही स्वास्थ्य चौकी, चमनुब्री गा.पा.-५, गोरखा) जडान गरि हालसम्म २६७ किलोवाट पिक क्षमताको संस्थागत सोलार जडान सम्पन्न गरिएको छ। - ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको ५ किलोवाट पोक क्षमताको सोलार प्रणाली मर्मत गरि संचालन गरिएको छ। - गण्डकी प्रदेश भित्रका सम्पूर्ण घरहरूमा विद्युत सुविधा पुर्याउन गण्डकी प्रदेशको थप लगानीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय, पोखरासँग सम्झौता गरि सञ्चालनमा रहेको विद्युत विस्तार कार्यको यस मन्त्रालयबाट भुक्तानी फरफारक गरि सकिएको।
४.१.२	सिंचाइ संरचना	सिंचित क्षेत्र	हेक्टर	२५००	२३०६	आ.व. २०८२/८३ मा सतह, लिफ्ट र नयाँ प्रविधि, भूमिगत सिंचाइ गरी १९६ हेक्टर नयाँ

क्र. सं.	मुख्य विषय क्षेत्र	सहायक विषय क्षेत्र	एकाई	परिमाणात्मक लक्ष्य	प्रगति	विषय क्षेत्रगत उपलब्धि (वार्षिक र प्रदेश सरकारको स्थापना भएपछिको जम्मा)
	निर्माण	विस्तार, कृषक कुलो सुधार, पुनर्स्थापना, मर्मत				सिंचाइ सुविधा थप भइ प्रदेश सरकारबाट जम्मा ७,८४८ हेक्टर कमाण्ड क्षेत्रमा सिंचित क्षेत्रफल विस्तार भएको छ। कृषक कुलो सुधारबाट थप १७५९ हे. गरि जम्मा १३,२५६ हेक्टर तथा पुनर्स्थापना र सुधारबाट थप ३५१ हेक्टर गरी जम्मा १८,७११ हेक्टर जमिनमा भरपर्दो सिंचाइ सुविधा पुगेको छ।
४.१.३	तटबन्धन निर्माण	नदी किनार बस्ती संरक्षण, जग्गा उकास	किलो मिटर	२०	१७.९९	आ.व. २०८२/८३ मा १७.९९ कि.मि. तटबन्ध निर्माण भै ५४.७८ हेक्टर जमिन संरक्षण एवम् जग्गा उकास भएको छ। हालसम्म प्रदेश सरकारबाट तटबन्ध निर्माण १५५.९६ किलोमिटर र जमिन संरक्षण एवम् जग्गा उकास ३,४५९ हेक्टर पुगेको छ।
४.१.४	खानेपानी संरचना निर्माण	आधारभूत स्तरको खानेपानी सुविधामा पहुँच	वटा	१५,०००	१४,०५७	- आ.व. २०८२/८३ मा १४,०५७ नयाँ निजी धारा जडान भएको छ। प्रदेश सरकारबाट आ.व. २०८२/८३ सम्ममा जडान भएका निजी धारा संख्या: १ लाख ७७ हजार ३ सय २७ पुगेको छ। (NWASH-MIS) को तथ्यांक बमोजिम आधारभूतस्तरको खानेपानी सुविधाबाट लाभान्वित जनासंख्या: ९३.२० % पुगेको। आ.व. २०८२/८३ सम्म प्रदेश सरकार र अन्य निकायबाट गरी करिब ६५ % घरघुरीमा निजी धारा जडान भएको अनुमान गरिएको। - NWASH-MIS मा आ.व. २०८२/८३ मा प्रदेशका ४,६४३ वटा खानेपानी प्रणालीको विवरण आयोजना-आयोजनाका प्रत्येक संरचना तथा १५,६४,३२८ जनसङ्ख्याको विवरण घर-घरमा गएर संकलन गरी त्यसलाई भू-सूचना सहितको नक्सा लगायतका विवरण डिजिटल प्रणालीमा प्रविष्ट भैसकेको छ।
४.१.५	अध्ययन					- मनाङ्ग, मुस्ताङ्ग, म्याग्दी र गोरखा जिल्लामा अवस्थित पशुचरणका खर्कहरुमा पानीको व्यवस्थापनको लागि सम्भाव्यता अध्ययन कार्य गरिएको छ। - सम्बत् २०८२ भदौ २३ र २४ गते जेन्जी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएको यस मन्त्रालयको मन्त्री निवास भवनको Detail Damage Assessment of Fire Damaged building कार्य सम्पन्न गरिएको छ।
४.१.६	प्रशासनिक सुधार					- मन्त्रालयमा एकिकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (GIOMS) पूर्ण रूपमा संचालनमा ल्याइएको छ भने अन्तर्गतका १४ वटा कार्यालयमा विद्युतीय हाजिरी पूर्ण रूपमा लागू भैसकेको छ। - स्वतः प्रकाशन तथा वार्षिक प्रगति पुस्तिका प्रकाशन निरन्तर गरिएको छ।

क्र. सं.	मुख्य विषय क्षेत्र	सहायक विषय क्षेत्र	एकाई	परिमाणात्मक लक्ष्य	प्रगति	विषय क्षेत्रगत उपलब्धि (वार्षिक र प्रदेश सरकारको स्थापना भएपछिको जम्मा)
						- वार्षिक तथा त्रैमासिक प्रगति समीक्षा तथा वेरुजु गोष्ठी नियमित रूपमा संचालन गरिएको छ। - सम्बत् २०८२ भदौ २३ र २४ गते जेन्जी आन्दोलनका क्रममा क्रममा जलेका सवारी साधनको लिलाम तथा मिनाहाको प्रकृया सम्पन्न गरी विमा कम्पनी मार्फत करिब १५४ लाख रकम प्राप्त भएको छ। - मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका कार्यालयका कर्मचारीहरूमा क्षमता विकास कार्यक्रमहरू जस्तै एआई (AI) तथा खरिद व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरू संचालन गरिएको छ।
४.१.७	अन्य कार्य					२०८२ भदौ २३ र २४ गते जेन्जी आन्दोलनका क्रममा आगलागीबाट क्षति भएको मन्त्रालय, मन्त्रालयको कर्मचारी आवस र मन्त्री निवास भवनको मर्मत सम्भार गरिएको छ।

४.२ आ.व. २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा समावेश भएका कार्यक्रमको प्रगति विवरण

क्र. सं.	बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको व्यहोरा	कार्यक्रमको नाम	विनियोजन (रु. हजारमा)	खर्च (रु. हजारमा)	वित्तीय प्रगति %	भौतिक प्रगति/ परिमाणात्मक उपलब्धि
१	९९/११०	९९. सबै नगरिकमा आधारभूत विद्युत सुविधाको पहुँच सुनिश्चितताका लागि सञ्चालित उज्यालो गण्डकी प्रदेश अभियान सम्पन्न गर्न रु. १५ करोड विनियोजन गरेको छ। ११०. राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेको स्थानमा सामुदायिक लघु जलविद्युत आयोजनाको निर्माण र मर्मत संभारका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छ।	विद्युत विस्तार/सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान/लघु तथा साना जलविद्युत आयोजना मर्मत	१५०६७७	१३९७६२.२५३	९२.७६	माथि उल्लेखित क्रम संख्या ४.१.१ बमोजिम

क्र. सं.	बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको व्यहोरा	कार्यक्रमको नाम	विनियोजन (रु. हजारमा)	खर्च (रु. हजारमा)	वित्तीय प्रगति %	भौतिक प्रगति/ परिमाणात्मक उपलब्धि
२	१०७/१०८	१०७. आ.व. २०८२/८३ मा सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापन आयोजनामा बहुवर्षीय र स्रोत सुनिश्चित गरिएका क्रमागत, आयोजना सम्पन्न गर्नको लागि बजेट विनियोजन गरेको छु। १०८. भूमिगत सिँचाइ र मर्मत संभार तथा प्रणाली सुदृढीकरण, र संघीय सरकारको सशर्त अनुदान तर्फ समेत गरी सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि जम्मा रु १ अर्ब १५ करोड ६४ लाख रकम विनियोजन गरेको छु।	सिँचाइ योजना निर्माण कार्यक्रम	१०७६०९३.८६	८१२९५४.५६	७५.५५	माथि उल्लेखित क्रम संख्या ४.१.२ बमोजिम
३	१०५	स्याङ्जा जिल्लाको आँधिखोला स्थित व्यवस्थित तटबन्ध निर्माण, कास्की जिल्लाको काहुँखोला नदि नियन्त्रण र सिलायान घट्टेखोला संरक्षण कार्य आ.व. २०८२/८३ मा सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।	नदी नियन्त्रण कार्यक्रम	४१७३००	२८७५४९.९९	६८.९१	माथि उल्लेखित क्रम संख्या ४.१.३ बमोजिम
४	१०१	एक घर एक धारा कार्यक्रम अन्तर्गत बहुवर्षीय तथा स्रोत सुनिश्चित गरिएका, क्रमागत र मर्मत सम्भार तथा प्रणाली सुदृढीकरणतर्फ प्राथमिकतामा राखिएका खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रयोजनार्थ रु ६० करोड ६१ लाख विनियोजन गरेको छु। आगामी आ.व.मा २०० वटा भन्दा बढी खानेपानी आयोजना सम्पन्न गरी थप १५ हजार घरमा निजी धारा जडान कार्य सम्पन्न गरिनेछ।	खानेपानी संरचना निर्माण	२२५६२२०	२१३३५५५.२०	९४.५६	माथि उल्लेखित क्रम संख्या ४.१.४ बमोजिम


४.३ आ.व. २०८२/८३ सम्मको लिफ्टिङ खानेपानी र सिंचाइ आयोजनाहरूमा विद्युत महशुल भुक्तानी अनुदान (रु. हजारमा)

क्र.सं.	आ.व.	खानेपानी तर्फ		सिंचाइ तर्फ		कुल जम्मा	
		अनुदान रकम	आयोजना संख्या	अनुदान रकम	आयोजना संख्या	अनुदान रकम	आयोजना संख्या
१	२०८२/८३	४२३७०.०८	५२९	१२०२.०४	१४	४३५७२.११	५४३
२	२०८१/८२	४०७६६.८३	४०७	७८१.५७	४७	४१५४८.४	४५४
३	२०८०/८१	४०९४६.८९	३४६	२२००		४३१४६.८९	३४६
४	२०७९/८०	१८९३४.३८	२७०			१८९३४.३८	२७०
	जम्मा	१४३०१८.१८	१५५२	४१८३.६१	६१	१४७२०१.७९	१६१३

४.४ आ.व. २०८२/८३ मा कार्यान्वयन भएका ऊर्जा, सिंचाइ, नदी व्यवस्थापन र खानेपानी योजनाहरूबाट सिर्जना भएको रोजगारी व्यक्तिदिन

क्र.सं.	क्षेत्र	रोजगारी व्यक्तिदिन (Man-Days)
१	सिंचाइ	३२०७३३
२	नदी नियन्त्रण	१७२१७८
३	खानेपानी	३८२१८३
४	ऊर्जा	८३२
	जम्मा	८७५९२६

रोजगारी व्यक्तिदिन (Man-Days)

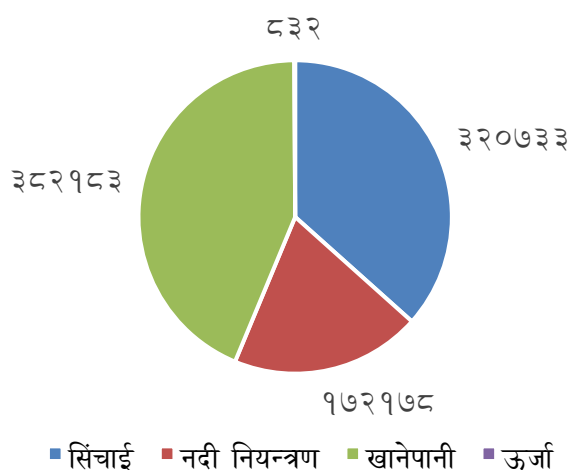

४.५ दोस्रो पञ्च वर्षीय योजना लक्ष्य र उपलब्धी

क्र.सं.	सूचक	इकाई	गण्डकी प्रदेश दोस्रो पञ्च वर्षीय योजनाको लक्ष्य/प्रगति		
			आ.व. २०८२/८३ सम्मको उपलब्धि	आ.व. २०८३/८४ सम्मको लक्ष्य	आ.व. २०८५/८६ सम्मको लक्ष्य
१	जलस्रोत तथा ऊर्जा				
१.१	विद्युत उत्पादन (जडित क्षमता)	मेगावाट	११७४.२४२ *	१६००	२५००
१.२	विद्युतमा पहुँच पुगेको जनसंख्या	प्रतिशत	९९.८० *	१००	१००
१.३	प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत	किलोवाट घण्टा	३०० *	३००	५००
१.४	संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रणालीबाट विद्युत उत्पादन	किलोवाट घण्टा	२६७	२५०	३००
२	खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता				
२.१	आधारभूतस्तरको खानेपानी सुविधा प्राप्त जनसंख्या	प्रतिशत	९३.२० #	९८	१००
२.२	मध्यम र उच्चस्तरको खानेपानी सुविधा प्राप्त जनसंख्या	प्रतिशत	२०#	६५	९०
२.३	निजी धारा जडान भएका घरधुरी	प्रतिशत	७०#	८४	९५
२.४	फलस भएको चर्पी सुविधा उपलब्ध घरधुरी	प्रतिशत	८०	९३	१००
३	सिँचाई तथा तटबन्धन				
३.१	आधुनिक सिँचाई पूर्वाधारबाट सिंचित क्षेत्रफल	हेक्टर	६९,७०६ @	६९,०००	७०,०००
३.२	बाह्रैमहिना सिँचाई सुविधा पुगेको क्षेत्र	प्रतिशत/हेक्टर	३४,४३४@	३९,०००	४९,०००
३.३	निर्माण भएको तटबन्धनको लम्बाई (प्रदेशबाट)	किलोमिटर	१५५.९६@	१५०	२००
३.४	जग्गा उकास कार्य सञ्चालन भएको क्षेत्रफल (प्रदेशबाट)	हेक्टर	३,४५८.५३@	४,०००	४,५००

स्रोत: * (नेपाल सरकार, विद्युत विकास विभाग/ नेपाल विद्युत प्राधिकरण)

(NWASH-MIS)/ प्रदेश सरकार स्थापना पश्चात सम्पन्न भएका आयोजनाबाट तथ्यांक थप गरि अध्यावधिक गरिएको

@ (प्रदेश सरकार स्थापना हुनुपूर्व आधुनिक सिँचाई पूर्वाधार विस्तार भएको क्षेत्रफल (६९,८५९ हे.) र प्रदेश सरकारबाट मात्र आ.व. २०७५/७६ देखि २०८२/८३ सम्म आधुनिक सिँचाई पूर्वाधार विस्तार भएको क्षेत्रफल (७,८४८ हे.)) / प्रदेश सरकार बाट सम्पन्न आयोजना

४.६ दिगो विकास लक्ष्य र उपलब्धी

क्र.सं.	सूचक	इकाई	राष्ट्रिय				दर/द३ सम्म	गण्डकी प्रदेश			
			२०१५	२०२२	२०२५	२०३०		२०१५	२०२२	२०२५	२०३०
१	ऊर्जा										
१	विद्युतमा पहुँच भएका जनसंख्याको अनुपात	प्रतिशत	७४	८५.७	९०.७	९९	९९.८ *	८२.५	९६	१००	१००
२	प्रतिव्यक्ति ऊर्जा (अन्तिम) उपभोग	किलोवाट घण्टा	८०		१०२७	१५००	३०० *	१९०.		७५०	१७००
३	जलविद्युतको जडित क्षमता	मेगावाट	९९०	५४१७	१०२६०	१५०००	११७४.२४२ §	४४८	८६९	३०००	६०००
२	खानेपानी तथा सरसफाई										
१	सुरक्षित खानेपानीको सुविधा उपलब्ध जनसंख्या	प्रतिशत	१५	५०	६५	९०	२०	५०.४	६५.०	८५	९०
२	आधारभूत खानेपानी सुविधा कभरेज	प्रतिशत	८७	९२.६	९५	९९	९३.२० #	९१.१	९५	१००	१००
३	उन्नत/सुधारिएको सरसफाइ सम्बन्धी सुविधा प्रयोग गर्ने परिवार	प्रतिशत	६४.६	७८.७	८५.७	९५	८०	७३.६	८०	८५	९९
४	शौचालय प्रयोग गर्ने जनसंख्याको अनुपात	प्रतिशत	६७.६	८३.८	९०	९८	९३	८१.४	९०	९२	९९
३	जलस्रोत तथा सिंचाइ										
१	१२ है महिना सिंचाइ उपलब्ध कृषि भूमि	प्रतिशत					९.७९&	४६	४८	५५	६५

स्रोत: * (नेपाल विद्युत प्राधिकरण)

§ (विद्युत विकास विभाग)

(NWASH-MIS)

& गण्डकी प्रदेशको खेतीयोग्य जमिनको तुलनामा (खेतीयोग्य जमिन ३,५१,५९७ हेक्टर- सिंचाइ गुरुयोजना, २०१९)

५. राजस्व संकलन र बेरूजुको विवरण

५.१ राजस्व संकलनको विवरण

क्र. सं.	राजस्व शीर्षक	राजस्व संकलन रु.
१	१४२१३- अन्य विक्रीबाट प्राप्त रकम	६५२५००
२	१४२२९- अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	३१०५५६६
३	१४३१२- प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	३९८२०४२
४	१४३१३- धरौटी सदरस्याहा	१४०३७६७
५	१४५११- बिमा दावी प्राप्ति	१०९६००००
६	१५१११- बेरूजु असुल उपर/दाखिला	१८९४२११८.०३
७	सरकारी सम्पत्ति विक्रीबाट प्राप्त रकम	२१५२०
जम्मा		३,९०,६७,५१३.०३

५.२ बेरूजुको संक्षिप्त विवरण (रु.) :-

प्रकार		आ.व. २०७५/७६ देखि आ.व. २०८१/८२ सम्मको बेरूजु	आ.व. २०८१/८२ सम्मको कुल फछ्यौट	आ.व. २०८२/८३ मा अ.ल्या. गरिएको बाँकि बेरूजु	कैफियत
लगती बेरूजु	असुल उपर गर्नुपर्ने	२,९०,९१,३५५.००	८२,४९,१२७.००	२,०८,४२,२२८.००	
	नियमित गर्नुपर्ने	३०,८३,६८,९९५.००	९,०२,६९,२४४.००	२१,८०,९९,७५१.००	
	पेशकी	५१,५३,७३,५९३.००	४६,७७,०४,४००.००	४,७६,६९,१९३.००	
जम्मा		८५,२८,३३,९४३.००	५६,६२,२२,७७१.००	२८,६६,११,१७२.००	

६. बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका मुख्य समस्या, चुनौती तथा समाधानका उपायहरू

६.१ मुख्य समस्या र समाधानका लागि मन्त्रालयले गरेका प्रयासहरू

क्र. सं.	कार्यक्रम/विषयको विवरण	समस्या तथा चुनौती	समाधानका लागि मन्त्रालयले गरेका प्रयासहरू
१	सिंचाइ /नदी नियन्त्रण/खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्र	- योजना संख्या निरन्तर बढ्दै जानु तर सो अनुरूप बजेट व्यवस्थापन नहुनु। योजना कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरामा अन्यौलता देखिनु। - प्रमुख हस्तक्षेपकारी/रूपान्तरणकारी आयोजना प्राथमिकतामा नपर्नु। - संघबाट हस्तान्तरित आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्नका पर्याप्त बजेटको व्यवस्था नभएकोले झन्डै २०० खानेपानी आयोजनाको सम्पन्न हुने कुरामा अन्यौलता रहेको। - स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार तथा क्षमता भित्रका स-साना आयोजना समेत प्रदेश सरकार मातहत कार्यान्वयन हुनु। - संघीयता लागु हुनु भन्दा पहिला वैदेशिक विकास साझेदार संस्थाहरू	- मर्म-सम्भार गर्नुपर्ने खालका र नयाँ सुरु गर्नुपर्ने खालका आयोजनालाई छुट्टाछुट्टै बजेट उप शीर्षक दिएर वार्षिक विकास कार्यक्रममा आयोजना वर्गीकरण गरिएको। - मर्मत-सम्भार तथा प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाका लागि छुट्टै मापदण्ड बनाइ जति बजेट विनियोजन भएको छ, त्यत्तिको मात्र काम गरिने। - नयाँ आयोजना सञ्चालन गर्न भन्दा क्रमागत सिंचाइ/खानेपानी आयोजनालाई सम्पन्न गर्न र पुराना सिंचाइ/खानेपानी प्रणालीको मर्मत, सुधार तथा प्रणाली सुदृढीकरण कार्यका लागि प्राथमिकता दिने गरी बजेट निर्माण गरिएको। - वित्तीय स्रोतको अभाव रहेकोले संघका विषयगत मन्त्रालयसँग छलफल र समन्वयको प्रयास गरिएको। - आर्थिक मामिला मन्त्रालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग निरन्तर समन्वय र सम्पर्कमा रहेर समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिएको।

क्र. सं.	कार्यक्रम/ विषयको विवरण	समस्या तथा चुनौती	समाधानका लागि मन्त्रालयले गरेका प्रयासहरू
		(Asian Dev. Bank, World Bank) ले प्रदेश स्तरको सिंचाइ र खानेपानी क्षेत्रमा गर्दै आएको सहयोग हाल रोकिएकोले त्यसको निरन्तरताको लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने।	लिफ्टिङ खानेपानी र सिंचाइ आयोजनाहरूमा विद्युत महशुल भुक्तानी अनुदान वितरणमा निरन्तरता दिइएको।
२	ऊर्जा क्षेत्र	प्रदेशको विद्युत विकास ऐन जारी भैसकेको, संघीय विद्युत ऐन जारी नभएकोले ऊर्जा क्षेत्रको कार्यक्षेत्र स्पष्ट नभएको।	संघीय विद्युत ऐन छिटो जारी गर्न राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पठाउनु पर्ने विषय राखी अनुरोध गरिएको।

६.२ बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा देखिएका अन्य समस्या तथा चुनौतीहरू

क. नीतिगत र कानुनी समस्या तथा चुनौतिहरू

- प्रदेश स्तरको जलविद्युत आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालनको अधिकार प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेकोमा संघीय विद्युत ऐन जारी नहुँदा प्रदेश स्तरको जलविद्युत आयोजनाको कार्यक्षेत्र स्पष्ट नहुँदा विद्युत सम्बन्धी कार्यक्रम प्रदेशबाट सुरु गर्न नसकिनु।
- “संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको वर्गीकरण तथा बाँडफाँट सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६” लाई खारेज गरी संघीय सरकारले जारी गरेको “आयोजना वर्गीकरणको आधार र मापदण्ड, २०८०” को व्यवस्था बमोजिम प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने सिंचाइ (पहाडमा ५० देखि १०० हेक्टर तथा हिमालमा २५ देखि ५० हेक्टर र तराईमा ५०० देखि ५००० हेक्टर तथा भूमिगत सिंचाइ २५ देखि १०० हेक्टर) मात्र रहेकोमा हाल पहाडी जिल्लाहरूमा कार्यान्वयन भैरहेका अधिकांस सिंचाइ आयोजनाहरू प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र बाहिर परेका छन्।
- संघीय सरकारले हालै जारी गरेको खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली, २०८१ अनुसार खानेपानीको हकमा (पहाडमा २,००० देखि ५,००० सम्म, हिमालमा ५०० देखि १,००० सम्म र तराईमा ८,००० देखि १५,००० सम्मको जनसंख्यालाई प्रशोधित खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने) रहेकोमा प्रदेश सरकारले हाल कार्यान्वयन गरिरहेका अधिकांश (करिब ६६%) आयोजनाहरू प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर परेको देखिन्छ। त्यसैले, यो नियमावलीलाई पुनरावलोकन र परिमार्जन गरी प्रदेशमैत्री, व्यावहारिक र यथार्थपरक बनाउन जरुरि देखिन्छ।

- नेपालको वर्तमान संविधान बमोजिम साझा अधिकारको सुचिमा रहेका विषयहरू कार्यान्वयन गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायहरूका आयोजनाहरू दोहोरो पर्ने गरेका छन्। संघीयता लागु भएपछी सिंचाइ र खानेपानी क्षेत्रमा खोलिएका संघीय विषयगत कार्यालयहरूबाट कार्यान्वयन भएका स-साना आकारका योजनाहरूबाट एकातिर संघीयतामा अधिकार हस्तान्तरणमा केन्द्र सरकार अझै उदासिन रहेको देखिन्छ भने अर्कोतिर आयोजना दोहोरो पर्न जाने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ।

ख. स्रोतगत समस्या तथा चुनौतिहरू


- कार्यान्वयन गर्नुपर्ने योजना संख्या वर्षे पिच्छे बढ्दै गैरहेको तर सो अनुरूप बजेट विनियोजन बढ्न नसकेकोले गर्दा औसत योजनागत वार्षिक बजेट घट्दै जानु
- ससर्त सहित संघबाट हस्तान्तरित सिंचाइ र खानेपानी तर्फका छुट/अधुरा र समयमा सम्पन्न हुन नसकेका विशेष अनुदानका खानेपानीका योजनामा पनि प्रदेश सरकारको स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आयोजना अधुरो रहनु
- संघीयता लागु हुनु भन्दा पहिला वैदेशिक विकास साझेदार संस्थाहरू (Asian Development Bank, World Bank आदि) ले प्रदेश स्तरको सिंचाइ /खानेपानी क्षेत्रमा गर्दै आएको सहयोग हाल रोकिन जानु
- प्रदेश सरकारबाट खानेपानीको गुणस्तर सुधारको क्षेत्रमा पर्याप्त स्रोत विनियोजन गर्न नसकिएको हुनाले खानेपानीको गुणस्तरको सूचक बढ्न नसक्दा यसको कारण स्वास्थ्य क्षेत्रको सूचकमा पनि सुधार आउन नसकेको पाईनु
- दीगो विकास लक्ष्य २०३० ले निर्धारण गरेको ९०% जनतालाई गुणस्तरीय खानेपानीको सुबिधा पुर्याउने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्नमा स्रोत साधानको निक्कै ठूलो चुनौती रहनु


ग. प्रकृयागत समस्या तथा चुनौतिहरू

- प्रदेशको विद्युत् विकास ऐनमा ऊर्जा सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कार्यालय स्थापना गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित भएकाले उक्त कार्यालयको स्थापना तथा सञ्चालनका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन (O&M) सर्वेक्षण नहुनु।
- न्यून बजेट विनियोजनले सानो सानो आयोजना पनि सम्पन्न हुनमा धेरै वर्ष लाग्ने गरेकोले आयोजना कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरामा धेरै अन्योल रहेको हुनाले समयमै आयोजना सम्पन्न गर्नमा चुनौती रहेको।
- प्रदेश सरकार स्थापना भएपछिका ८ वर्षमा ऊर्जा/खानेपानी/सिंचाइ क्षेत्रमा कूल विनियोजित बजेट, खर्च, कुल आयोजना संख्या र प्रति आयोजन औसत वार्षिक विनियोजनलाई तलको तालिका र चार्टमा प्रस्तुत गरिएको छ।
 - प्रदेश सरकार स्थापना पश्चात ऊर्जा, सिंचाइ र खानेपानी क्षेत्रमा विनियोजित पुँजीगत बजेट आ.व. २०७५/७६ देखि २०७७/७८ सम्म बढेको देखिन्छ।

- आ.व. २०७८/७९ देखि २०८१/८२ सम्म ऊर्जा, सिंचाइ र खानेपानी क्षेत्रमा विनियोजित पुँजीगत बजेट घट्दो क्रममा रहेको छ।
- ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको पुँजीगत तर्फ विगत ८ वर्षमा हरेक वर्ष ८० प्रतिशत भन्दा बढी वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ भने आ.व. २०८२/८३ मा ८६.४५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ।

क्र.सं.	आर्थिक वर्ष	बजेट विनियोजन	खर्च	खर्च %
१	२०७५/७६	४८९१९३१	३९५४१४६	८०.८३%
२	२०७६/७७	६३८४३६७	५२१८४५४	८१.७४%
३	२०७७/७८	६७५३९१४	६००४२९६	८८.९०%
४	२०७८/७९	५३८८९०९	४८७०४९६	९०.३८%
५	२०७९/८०	५६५२६५५	४८२७००४	८५.३९%
६	२०८०/८१	४६६५२००	४२१७५८३	९०.४१%
७	२०८१/८२	३९५३८००	३६०४८४०	९१.१७%
८	२०८२/८३	३९८९९४८	३४४९११३	८६.४५%
		८ वर्षको औसत		८६.७२%

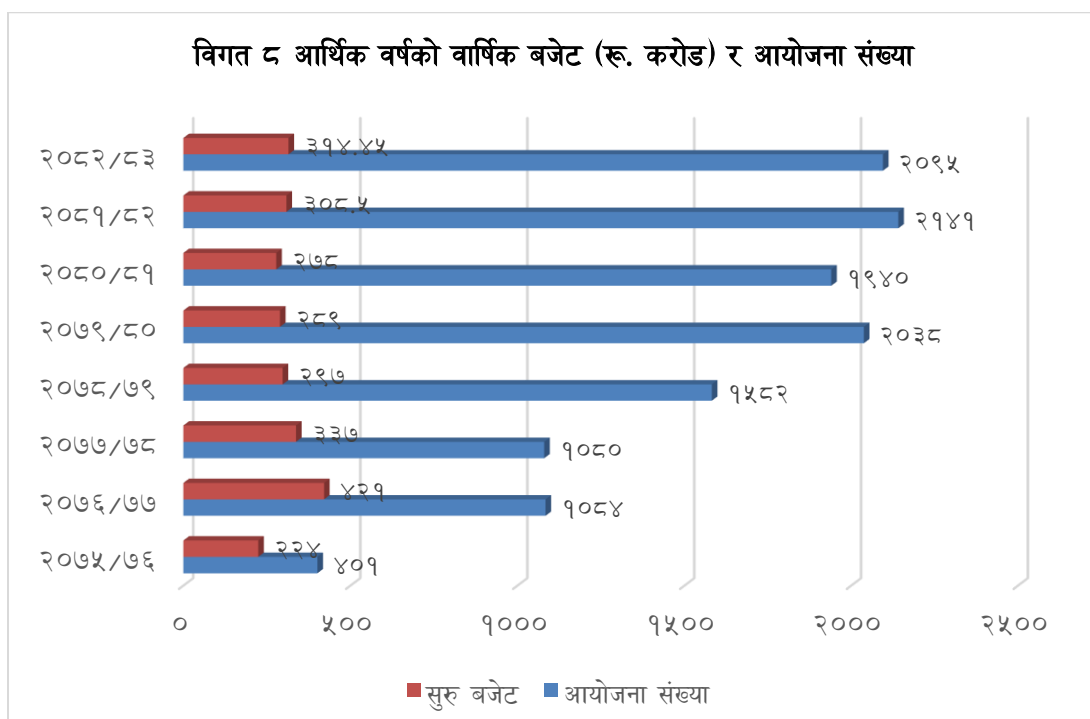

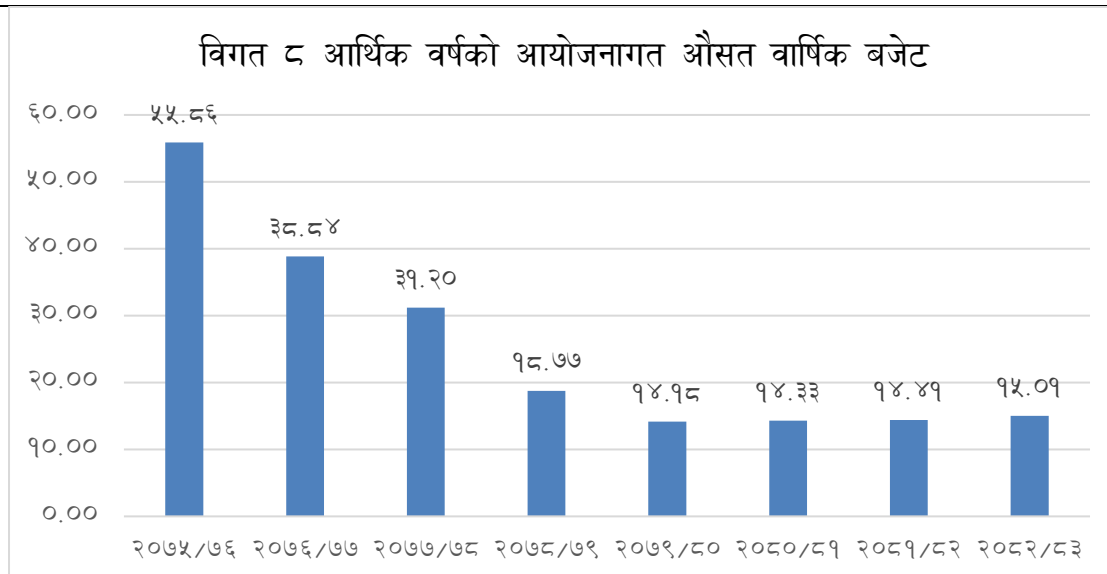

६.३ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ऐन/नियम तर्जुमाको विवरण

क) तर्जुमा भएका ऐन/नियम/कार्यविधि/मापदण्ड/निर्देशिका/मार्गदर्शन आदि

१. गण्डकी प्रदेश सिंचाइ ऐन, २०७८
२. गण्डकी प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ (प्रथम संसोधन २०८१)
३. गण्डकी प्रदेश विद्युत विकास ऐन, २०८२
४. गण्डकी प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली, २०८२
५. घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
६. लिफ्टिङ आयोजनामा विद्युत महशुल अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२
७. मर्मत संभार तथा प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना कार्यान्वयन मापदण्ड, २०८२

७. आ.व. २०८२/८३ मा यस मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूबाट गरिएका
कार्यक्रमका प्रतिनिधिमुलक जलकहरूः
वर्थिङ सेन्टरमा सोलार प्रणाली जडान



Fire Damage Assessment



मन्त्री आवास मर्मत सम्भार



जनमुखि कुलो सिँचाई आयोजना, हुप्सेकोट-३, नवलपरासी (ब.सु.पू)

निर्माण पूर्व



जनश्रमदान गर्दै



निर्माण पश्चात



गडार खोला तटबन्ध, मध्यविन्दु-१५, नवलपरासी (ब.सु.पू)
निर्माण पुर्व निर्माणाधीन



निर्माण पश्चात



अमर भूमिगत डिप टयुवेल सिचाइ आयोजना, गैडाकोट-१७, नवलपरासी (ब.सु.पू)

निर्माणाधीन



निर्माण पश्चात



माननिय मन्त्रीज्युको कार्यालय र जिल्ला अनुगमन क्रममा



नारेखोर ताल जलाशय लिफ्ट सिंचाइ योजना, व्यास-६, तनहुँ



क्याङ्दी खोला तटबन्धन (बाह्रबिसे गुमी), भिमाद-०८, तनहुँ



खगी सिंचाई आयोजना, सहिद लखन गा.पा.-०६, गोरखा



कुनाखेत अम्बोटे सिंचाइ आयोजना, पा.न.पा.-१ र ९, गोरखा



राइनासटार सिंचाई आयोजना, राइनास न.पा.

निर्माण पूर्व



निर्माणाधीन



निर्माण पश्चात



८५० हेक्टर कमाण्ड एरिया/३२०० घरधुरी

आपतकालीन मर्मत सम्भारबाट १ लाख १० हजार खर्च गरी पानी संचालन गरिएको

बाँसबोटे खोल्सीको Aqueduct, Span 22 m

मिलनबस्ति, नयाँबस्ति पहिरो संरक्षण, सुन्दरबजार, लमजुङ



वेगनास सिचाई प्रणाली मर्मत सम्भार तथा नहर संचालन



अर्मला क्षेत्र संरक्षण तथा कालीखोलना तटबन्ध, पोखरा- १६,२०, कास्की



फेदीखोला बृहत सिंचाइ योजना, फेदीखोला गा पा-१ र २ स्याङ्गजा



उदियाचौर सिंचाइ योजना वालिङ्ग-१३, स्याङ्गजा



वालिङ/भिरकोट न.पा. खण्ड



नयाँ कुलो सिंचाइ योजना, कुश्मा-१, पर्वत



अगुवा खोला सिंचाइ योजना, पैयुँ-०६, पर्वत



छेल्दर रातामाटा सिंचाइ आयोजना, ताराखोला ४, ५, बागलुङ



ठुलचौर, ढांडखर्क चिच्चौर ठुलवेशी सिंचाइ आयोजना, बडिगाड गा.पा- ६, बागलुङ



गौराखोला सिंचाइ आयोजना, मालिका ५, म्याग्दी



सिजा लु सिंचाइ आयोजना, लोमान्थाङ गा.पा. -०२, मुस्ताङ



सेन स्यागु सिंचाइ योजना, बारागाउँ मुक्तिक्षेत्र गा.पा. ४,



भिमताड लघु जलविधुत योजना निर्माण नासौ गा.पा ६, मनाङ



तोडा देखि फ्रासरसम्म सिंचाइ आयोजना मनाङ-डिस्याङ गा.पा. ७, मनाङ



कुडौली खानेपानी, कावासोती ११



४५० घ.मी. ओवरहेड आर सि सि टंकी निर्माण

बरटाँडी सुधार विस्तार खा.पा.आ,देबचुली - १७



फिल्टर टंकी निर्माण तथा पानी संचालन हुदै

शिखरडाँडा स्याउली खानेपानी आयोजना गोरखा न पा ११



मान्द्रे रुतका दुम्सीका खानेपानी आयोजना, बारपाक सुलिकोट गा.पा, गोरखा



लौरुखोला लिफ्टिङ्ग खानेपानी आयोजना, पोखरा-२४, कास्की



माननिय मन्त्रिज्यू सहितको टिमबाट चापाकोटमा आयोजना अनुगमन तथा छलफल



कुशमा खानेपानी आयोजनामा कुशमा पर्वतमा क्लोरिनेसन जडान



HDPE पाइपको गुणस्तर परिक्षणको क्रममा लिइएको तस्बिरहरु



द. अनुसूचीहरू

द.१ घरेलू सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान

क्र.स.	जिल्ला	गाउँपालिकाको नाम	वडा नं.	जडान पिक क्षमता/ घरधुरी संख्या		आ.व.
				२० वाट	५० वाट	
१	गोरखा	धार्चे गा.पा.	३,४,५,६,७		१९०	२०७६/७७
२	गोरखा	चुम्नुब्री गा.पा.	३,६,७		२७०	२०७६/७७
३	म्याग्दी	धवलागिरी गा.पा.	४,६		१२०	२०७६/७७
४	मनाङ्ग	नार्पाभूमि गा.पा.	१,२,३,४,५	७५	५०	२०७६/७७
५	मुस्ताङ्ग	वारागुङ्गमुक्तिक्षेत्र गा.पा.	२,४,५	२५	६०	२०७६/७७
६	मुस्ताङ्ग	लोमन्थाङ्ग गा.पा.	१,२,३,४		२३०	२०७६/७७
७	मुस्ताङ्ग	लो-घेकर दामोदरकुण्ड गा.पा.	४,५		१००	२०७६/७७
		जम्मा		१००	१०२०	
१	म्याग्दी	धवलागिरी गा.पा.	४,६		१००	२०७८/७९
१	बागलुङ	ढोरपाटन न.पा.	६		३८४	२०८०/८१
		कूल जम्मा		१००	१५०४	१६०४

द.२ संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान

क्र.स.	जिल्ला	कार्यालयको नाम	क्षमता (कि.वा.)	आ.व.
१	कास्की	मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश	४१.००	२०७६/७७
२	कास्की	भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश	२९.००	२०७६/७७
		जम्मा	७०	
१	गोरखा	फिलिम स्वास्थ्य चौकी, चुम्नुब्री	६	२०७८/७९
२	गोरखा	श्री ज्ञानमार्ग माध्यमिक विद्यालय, गण्डकी गा. पा.-७	२	२०७८/७९

क्र.स.	जिल्ला	कार्यालयको नाम	क्षमता (कि.वा.)	आ.व.
३	गोरखा	अमरज्योति जनता माध्यमिक विद्यालय, पालुंगटार न. पा-४	२	२०७८/७९
४	गोरखा	मनकामना बहिरा आवासीय माध्यमिक विद्यालय, गोरखा न. पा-९	२	२०७८/७९
५	नवलपुर	श्री कालिका मा.वि., गैडाकोट	२	२०७८/७९
६	कास्की	यातातात व्यवस्था कार्यालय, पोखरा	१६	२०७८/७९
७	कास्की	पश्चिमांचल क्याम्पस, लामाचौर	२०	२०७८/७९
८	कास्की	ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय	५	२०७८/७९
९	मुस्ताङ	लेते स्वास्थ्य चौकी, लेते	१०	२०७८/७९
१०	मुस्ताङ	खानेपानी जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास सब-डिभिजन कार्यालय, जोमसोम	१०	२०७८/७९
११	मुस्ताङ	पुर्बाधार विकास कार्यालय, जोमसोम	१०	२०७८/७९
१२	मुस्ताङ	चरांग स्वास्थ्य चौकी, चरांग	६	२०७८/७९
१३	मनाङ	खानेपानी जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास सब-डिभिजन कार्यालय, चामे, मनाङ	१०	२०७८/७९
१४	मनाङ	लोकप्रिय मा. बि चामे मनाङ	६	२०७८/७९
		जम्मा	१०७	
१	कास्की	ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय	३०	२०७९/८०
		जम्मा	३०	
१	कास्की	ग्रहौ प्राथमिक अस्पताल, वालिङ न.पा.-९	१५	२०८०/८१
२	गोरखा	आहाल भन्ज्याङ मा.वि.	३	२०८०/८१
		जम्मा	१८	
१	मनाङ	प्रकाश ज्योती मा.वि., नासो-५, थोचे	१२	२०८१/८२
		जम्मा	१२	
१	म्याग्दी, मुस्ताङ, मनाङ, गोरखा	मुना स्वास्थ्य चौकी, धौलागिरी गा. पा.-३, मुना, म्याग्दी, रूम स्वास्थ्य चौकी, मालिका गा. पा.-२, रूम, म्याग्दी, कागबेनी स्वास्थ्य चौकी, बारागुड मुक्तिक्षेत्र गा. पा.-४, मुस्ताङ, पिसाङ स्वास्थ्य चौकी, मनाङ डिस्पाङ गा. पा.-१, मनाङ, विही स्वास्थ्य चौकी, चमनुब्री गा.पा.-५, गोरखा	३०	२०८२/८३
		कूल जम्मा	२६७	

८.३ लघु जलविद्युत मर्मत गरिएका आयोजनाहरू

क्र.सं.	जिल्ला	आयोजना संख्या	क्षमता किलोवाट	कैफियत
१	गोरखा	५	१४५	
२	नवलपुर	२	१४	
३	लम्जुङ्ग	१३	२१५	
४	तनहुँ	०	०	
५	स्याङ्गजा	२	८६	
६	कास्की	१	५	
७	बागलुङ्ग	५६	२५८४	
८	पर्वत	२	४२	
९	म्याग्दी	३	८२	
१०	मुस्ताङ्ग	७	१७५	
११	मनाङ्ग	६	१९७	
	जम्मा	९७	३५४५	

८.४ गण्डकी प्रदेश सरकारको लगानीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय, पोखराबाट कार्यान्वयन भएको विद्युत विस्तार कार्यको उपलब्धि विवरण :

वितरण केन्द्र	H.T. लाइन विस्तार कि.मि.	L.T. लाइन विस्तार कि.मि.	Transformer जडान संख्या	लाभान्वित घरधुरी संख्या
गोरखा	४२	३५.८	८	५१६
आरुघाट	१०.३०	१०	-	-
कावासोती	१४०	२१३.८	१४	१९९५
लम्जुङ्ग	७.०६	१४	३	३९५
पोखरा/लेखनाथ	३	२		३९१
बागलुङ्ग	२४.२३	८०.९	२३	१६९१
म्याग्दी	९१	१६०	६	७५१
तातोपानी	२५.४३	१०.०७	१४	३०२
मनाङ्ग	५.१७	०	२	४५०

वितरण केन्द्र	H.T. लाइन विस्तार कि.मि.	L.T. लाइन विस्तार कि.मि.	Transformer जडान संख्या	लाभान्वित घरधुरी संख्या
जम्मा	३४८.२१	५२६.६०	७०	६४९१

८.५ ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरूबाट आ.व. २०७५/७६ देखि आ.व. २०८२/८३ सम्म सम्पन्न भएका ऊर्जा सम्बन्धी अन्य कार्यक्रमको जिल्लागत उपलब्धीहरू:

जिल्ला	काठेपोल प्रतिस्थापन	सौर्य सडक बत्ती	स्मार्ट सडक बत्ती	लघु जलविद्युत ग्रिड कनेक्शन		विद्युतीय चुल्हो
	स्टिल पोल (वटा)	वटा	थान	वटा	कि.वा.	वटा
गोरखा	७२२०	६	१९५			५३
नवलपुर	२००		७४			
लम्जुङ्ग	३५०४					
तनहुँ	३६००					
स्याङ्गजा	५४८७	१८		१	९८	
कास्की	९००	२				
बागलुङ्ग	३०२५					
पर्वत	४२२७					
म्याग्दी	१८३३					
मुस्ताङ्ग	२४५					
मनाङ्ग	२५०			१	६०	
जम्मा	३०४८१	२६	२६९	२	१५८	५३

८.६ प्रदेश सरकारबाट सिंचाइ क्षेत्रमा आ.व. २०७५/७६ देखि २०८२/८३ सम्म भएको जिल्लागत उपलब्धी विवरण

जिल्ला	२०७५/७६ को उपलब्धी (हेक्टरमा)				२०७६/७७ को उपलब्धी (हेक्टरमा)				२०७७/७८ को उपलब्धी (हेक्टरमा)				२०७८/७९ को उपलब्धी (हेक्टरमा)			
	नयाँ	कृषक कुलो सुधार	पुनर्स्थापना र सुधार	जम्मा	नयाँ	कृषक कुलो सुधार	पुनर्स्थापना र सुधार	जम्मा	नयाँ	कृषक कुलो सुधार	पुनर्स्थापना र सुधार	जम्मा	नयाँ	कृषक कुलो सुधार	पुनर्स्थापना र सुधार	जम्मा
मनाङ्ग	१०२			१०२	१०४		५८	१६२	१००		७	१०७	५०		१००	१५०
मुस्ताङ्ग	५०		१८९	२३९	७४		७४	१४८					२९२		४९	३४१
म्याग्दी					३२	३२	५०	११४	४६	३२	३४	११२	४८	५	८०	१३३
बागलुङ्ग					६५	४०	२८	१३३	१५	७०	१६५	२५०		१३७	२	१३९
पर्वत	५५	६५६	६६५	१३७६	३०	२५६	२२०	५०६	२४९	४६३	९७७	१६८९		३५५		३५५
कास्की			१०३	१०३	६६	५	६०	१३१	३५		२३८	२७३	४५	५१०	६५	६२०
स्याङ्गजा						२२३		२२३	४९	२४५	१८०५	२०९९	६५	३४४	२९३	७०२
नवलपुर	२२४		१५	२३९	२३९		१३६८	१६०७	४५१		७७८	१२२९	३४६		८९२	१२३८
तनहुँ	२२			२२	६	१९१		१९७	१२६	२७	३७६	५२९	५५	१४३	१४२	३४०
लमजुङ्ग			२२०	२२०	२८			२८	९४	१२१	६४	२७९	६५	१०६	४३	२१४
गोरखा	३२			३२	८९		८४	१७३	३७७	०	६५३	१०३०	८७	७१	१३१	२८९
जम्मा	४८५	६५६	११९२	२३३३	७३३	७४७	१९४२	३४२२	१५४२	९५८	५०९७	७५९७	१०५३	१६७१	१७९७	४५२१
भूमिगत	१३६			१३६	२३९		५	२४४	४५१		२८	४७९	३४६		२०	३६६
कूल जम्मा	६२२	६५६	११९२	२४७०	९७२	७४७	१९४७	३६६६	१९९३	९५८	५१२५	८०७६	१३९९	१६७१	१८१७	४८८७

जिल्ला	२०७९/८० को उपलब्धी (हेक्टरमा)				२०८०/८१ को उपलब्धी (हेक्टरमा)				२०८१/८२ को वार्षिक उपलब्धी (हेक्टरमा)				२०८२/८३ को वार्षिक उपलब्धी (हेक्टरमा)				२०८२/८३ सम्मको उपलब्धी (हेक्टरमा)			
	नयाँ	कृषक कुलो सुधार	पुनर्स्थापना र सुधार	जम्मा	नयाँ	कृषक कुलो सुधार	पुनर्स्थापना र सुधार	जम्मा	नयाँ	कृषक कुलो सुधार	पुनर्स्थापना र सुधार	जम्मा	नयाँ	कृषक कुलो सुधार	पुनर्स्थापना र सुधार	जम्मा	नयाँ	कृषक कुलो सुधार	पुनर्स्थापना र सुधार	जम्मा
मनाङ्ग	११४			११४	५४	३५	३०	११९	७५			७५	६			६	६०५	३५	१९५	८२९
मुस्ताङ्ग	१२७	२७	२५	१७९	७	१२५	१	१३३		४७		४७	१५	१३५	२६	१७६	५६५	३३४	३६४	१०८७
म्याग्दी	५४	५	२९	८८	१४	७५		८९	१०	४०		५०	४८	५३		१०१	२५२	२४२	१९३	५८६
बागलुङ्ग	४३	१०३	१३३	२७९	१८९	१२८	३३	३५०	३२	३४	१५	८१	४८	४९	१३८	२३५	३९२	५६१	५१३	१२३१
पर्वत	१७	२५७	३०	३०४	४५	९६	१२८	२६९	५३	९९१		१०४४	५	१०२२		१०२७	४५४	४०९६	२०२०	५५४३
कास्की	४५	४८	१८०	२७३	३५	१८६३		१८९८		४००	१९१०	२३१०	२	२२	३५	५९	२२८	२८४८	२५९१	५६०८
स्याङ्गजा	८९	८६१	१४१०	२३६०			३४०	३४०		१९४	८१	२७५		९५		९५	२०३	१९६२	३९२९	५९९९
नवलपुर	१६८		१३०१	१४६९	२३	५१	९८३	१०५७	४१	४१४	८१७	१२७२	४०	१२४	१३	१७७	१५३२	५८८	६१६७	८१११
तनहुँ	९५	५८	१०४	२५७	२७	५०	१५०	२२७	४			४	१५		११०	१२५	३५०	४६९	८८२	१५७६
लमजुङ्ग	१०५	९०	७०	२६५	२५	५०	२०	९५		१३८	३३४	४७२	२	१३९	२०	१६१	३१९	६४४	७७१	१५७३
गोरखा	३८	६७२	५०	७६०	५०	५००		५५०	४५	११४	२४	१८३	१५	१२१	९	१४५	७३३	१४७८	९५१	३०१७
जम्मा	८९५	२१२१	३३३२	६३४८	४६९	२९७३	१६८५	५१२७	२६०	२३७२	३१८१	५८१३	१९६	१७५९	३५१	२३०६	५६३३	१३२५६	१८५७६	३७४६५
भूमिगत	२११		६७	२७८	२७५		१५	२९०	५५७			५५७					२२१५		१३५	२३५०
कूल जम्मा	११०६	२१२१	३३९९	६६२६	७४४	२९७३	१७००	५४१७	१००२	२३७२	३१८१	६३७०		१७५९	३५१	२३०६	७८४८	१३२५६	१८७११	३९८१५

८.७ प्रदेश सरकारबाट नदी व्यवस्थापन क्षेत्रमा आ.व. २०७५/७६ देखि २०८२/८३ सम्म भएको जिल्लागत उपलब्धी विवरण

जिल्ला	२०७५/७६ को उपलब्धी			२०७६/७७ को उपलब्धी			२०७७/७८ को उपलब्धी			२०७८/७९ को उपलब्धी		
	तटबन्ध निर्माण (कि.मि.)	जग्गा उकास (हे.)	संरचना निर्माण (वटा)	तटबन्ध निर्माण (कि.मि.)	जग्गा उकास (हे.)	संरचना निर्माण (वटा)	तटबन्ध निर्माण (कि.मि.)	जग्गा उकास (हे.)	संरचना निर्माण (वटा)	तटबन्ध निर्माण (कि.मि.)	जग्गा उकास (हे.)	संरचना निर्माण (वटा)
मनाङ्ग	१.३२	०	०	२.६८	३५	८	२.८६	२४	०	१.४०	२०	०
मुस्ताङ्ग	१.५५	५	१८	२.१४	११	०	०.७८	३५	०	०.३४	६८	०
म्याग्दी	०.९२	०	०	१.५१	२	०	०.३२	१	०	०.७८	०	०
बागलुङ्ग	१.५७	०	०	२.६६	५	०	१.५३	२	४	१.२३	३	०
पर्वत	३.३३	२४	६१	१.२३	२७	७५	०.९८	१५	३	१.०९	२२	४
कास्की	०.००	०	०	२.५६	११६	११	१.८१	१७	३२	१.११	४२	२३
स्याङ्गजा	०.००	०	०	६.१०	०	०	३.३४	५४	४	१.९०	०	०
नवलपुर	३.५४	८	१२९	१.६१	२७	२६	१.४८	३२	४	२.००	०	९
तनहुँ	२.७९	५५	३४	४.१६	३४	१६०	१.०३	१०	१४	१.५९	३०५	३१
लमजुङ्ग	०.७१	१०५	४५	०.८०	४	४१	०.६०	१५	२८	०.८५	४१	२६
गोरखा	३.८७	०	२८	०.९६	४४०	१४	९.०४	१२१६	१६४	२.५८	२००	१३
जम्मा	१९.६०	१९७	३१५	२६.४०	७००	३३५	२३.७६	१४२०	२५३	१४.८६	७०१	१०६

जिल्ला	२०७९/८० को उपलब्धी			२०८०/८१ को उपलब्धी			२०८१/८२ को उपलब्धी			२०८२/८३ को उपलब्धी			हालसम्मको उपलब्धी			
	तटबन्ध निर्माण (कि.मि.)	जग्गा उकास (हे.)	संरचना निर्माण (बटा)	तटबन्ध निर्माण (कि.मि.)	जग्गा उकास (हे.)	संरचना निर्माण (बटा)	तटबन्ध निर्माण (कि.मि.)	जग्गा उकास (हे.)	संरचना निर्माण (बटा)	तटबन्ध निर्माण (कि.मि.)	जग्गा उकास (हे.)	पक्की कुलो निर्माण (कि.मि.)	तटबन्ध निर्माण (कि.मि.)	जग्गा उकास (हे.)	संरचना निर्माण (बटा)	पक्की कुलो निर्माण (कि.मि.)
मनाङ्ग	०.५५	३०		१	२५	०	०.२८	०.००	०.००	०.५४			१०.१८	१३३.५०	८.००	०.००
मुस्ताङ्ग	०.९६	३	१	२	६	०	२.५९	१२.८०	०.००	०.५०	१२.००	४.२०	१०.४५	१५२.८०	१९.००	४.२०
म्याग्दी	०.६९			१	७	०	१.५५	३.००	०.००	०.०३		६.५८	६.६६	१२.००	०.००	६.५८
बागलुङ्ग	२.८३	११	५	१	०	०	०.५९	०.००	०.००	०.७७	१.५०	११.७०	१२.४८	२२.५०	९.००	११.७०
पर्वत	१.८८		३०	०	०	०	०.५२	०.००	०.००	०.५८		११.२४	९.६१	८७.५०	१७३.००	११.२४
कास्की	३.७०	२	२०	२	०	०	१.६२	४.८०	०.००	३.३०	१२.५०	५.५४	१५.८९	१९३.४०	८६.००	५.५४
स्याङ्गजा	३.६०	३७		१	०	०	०.४८		०.००	०.३७		२४.२०	१६.५८	९०.९०	४.००	२४.२०
नवलपरा	३.९८		७	४	७६	०	२.४७	२.५०	०.००	१.०९	१७.००	११.४५	१९.९९	१६२.८०	१७५.००	११.४५
तनहुँ	३.४१	२५	८	१	३४	०	१.९८	२७.००	०.००	९.५७	४.००	१२.६१	२५.६८	४९४.२५	२४७.००	१२.६१
लमजुङ्ग	०.७१	२३	१५	१	१०	०	०.७४	०.००	०.००	०.५५		४.३६	५.५८	१९८.३०	१५५.००	४.३६
गोरखा	२.३०	२०	१४	२	१९	०	१.४०	७.८०	०.००	०.६९	७.७८		२२.८८	१९१०.५८	२३३.००	०.००
जम्मा	२४.६२	१५०	१००	१५	१७८	०	१४.२२	५७.९०	०.००	१७.९९	५४.७८	९१.८८	१५५.९६	३४५८.५३	११०९	९१.८८

९. सन्दर्भ सामग्री

- मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४
- प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, गण्डकी प्रदेश, प्रदेशको स्थिति पत्र, २०७५
- प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, गण्डकी प्रदेश, प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (२०७६/७७-२०८०/८१)
- प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, गण्डकी प्रदेश, दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (२०८१/८२-२०८५/८६)
- सिंचाइ गुरुयोजना, २०१९ (अद्यावधिक, २०२४)
- नमूना कृषि गणना, २०७८
- नेपाल विद्युत प्राधिकरण, वार्षिक पुस्तिका, २०८२/८३
